

**RAPORTUL FINAL A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI**

*Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui*  
(titlul proiectului)

 **Agenția de Dezvoltare Regională Sud** 

(agenția)

**1. INFORMAȚIE GENERALĂ**

Localizarea proiectului	Raionul Leova, orașul Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui și Sărata Nouă
Denumirea proiectului	Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL)
Componenta finanțată	Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova
Domeniul de intervenție	Aprovizionare cu apă și canalizare
Obiectivele proiectului	<p><b>Obiective generale:</b></p> <p>- Accesul cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare în raionul Leova</p> <p><b>Obiective specifice:</b></p> <p>- Asigurarea populației localităților Filipeni, Romanovca, Cupcui și Iargara din raionul Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă în perioada 2020 – 2021</p>
Aplicant	Primăriile localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui
Partenerii	MIDR, ADR Sud, GIZ Moldova, Consiliul raional Leova.
Grupuri-țintă	Locuitorii din Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui cu acces la sistemul îmbunătățit de aprovizionare cu apă;
Beneficiari finali	- 12096 populație din Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui și Sărata Nouă
<b>Etapa elaborării documentației de proiect</b>	
Durata totală a proiectului	8 luni
Bugetul estimat al proiectului	7.268.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Perioada efectivă de implementare	10 luni
Valoarea bugetară totală executată	7.164.624,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Sursele de finanțare și bugetele valorificate:	<p>1. UE prin intermediul GIZ Moldova – 6.664.624,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p> <p>2. APL II Leova – 250.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p> <p>3. APL I Iargara – 250.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p>
Costurile transmise către beneficiar:	Act nr. 13 din 04.12.2019 în valoare 7.164.981,71 MDL cu TVA la cota 0 „zero”;
<b>Etapa execuției fizice a infrastructurii</b>	
Durata totală a proiectului	10 luni
Bugetul estimat al proiectului	91.725.880,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
	<i>Iargara</i> 42.773.080,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
	<i>Filipeni</i> 25.203.300,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
	<i>Cupcui</i> 13.364.059,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
	<i>Magistrala Cupcui – Sărata Nouă</i> 4.942.871,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
	<i>Romanovca</i> 5.442.570,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
Perioada efectivă de implementare	10 luni din momentul primirii ordinului de începere a execuției și predării șantierului pentru lucrări.
Valoarea bugetară totală executată	93.391.066,77 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
	<i>Iargara</i> 42.823.806,14 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
	<i>Filipeni</i> 26.729.180,36 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
	<i>Cupcui</i> 13.373.787,05 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
	<i>Magistrala Cupcui – Sărata Nouă</i> 4.984.825,34 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
	<i>Romanovca</i> 5.479.467,88 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
Sursele de finanțare și bugetele valorificate:	<p>1. UE prin intermediul GIZ Moldova – 86.620.944,77 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p> <p>2. APL I Iargara – 3.000.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p> <p>3. APL I Filipeni – 1.514.340,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p> <p>4. APL I Cupcui – 808.488,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p> <p>5. APL II Leova – 1.133.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p> <p>6. APL I Romanovca – 312.344,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</p>
Costuri transmise către beneficiari:	93.379.669,77 MDL cu TVA la cota 0 „zero”
	<i>APL I Iargara</i> Act nr. 29 din 25.10.2022 în valoare 42.821.298,14 MDL cu TVA la cota 0 „zero”;
	<i>APL I Filipeni</i> Act nr. 28 din 25.10.2022 în valoare 26.726.672,36 MDL cu TVA la cota 0 „zero”;
	<i>APL I Cupcui</i> Act nr. 26 din 25.10.2022 în valoare 13.371.279,04 MDL cu TVA la cota 0 „zero”;
	<i>APL II Leova</i> Act nr. 34 din 25.10.2022 în valoare 4.983.460,35 MDL cu TVA la cota 0 „zero”;
	<i>APL I Romanovca</i> Act nr. 27 din 25.10.2022 în valoare 5.476.959,88 MDL cu TVA la cota 0 „zero”;

## 2. FINANȚAREA PROIECTULUI

Proiectul „**Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova**” în rezultatul procesului de planificare regională sectorială (PRS), conceptul de proiect viabil (CPV) a fost inclus în Programul Operațional Regional (POR) Sud pentru anii 2017- 2020. Reieșind din resursele financiare necesare implementării proiectelor, Ministrului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) actual Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a identificat o altă sursă de finanțare, și anume, proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Prin urmare, implementarea proiectului menționat, s-a efectuat conform procedurilor prevăzute în Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiunea adaptată la dispozițiile PRAG UE) elaborat în baza prevederilor ghidului practic al Uniunii Europene „PRAG” (versiunea din ianuarie 2016) cu privire la contracte de servicii și lucrări executate prin gestionare indirectă și verificarea rezultatelor executării acestora, Manualul de proceduri privind achizițiile publice, managementul financiar și al contractelor, transferul de proprietate în cadrul proiectelor cu finanțare GIZ Moldova cu ajustările și modificările ulterioare, Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) cu nr. 15/16 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea listei proiectelor de dezvoltare regională selectate în cadrul Programelor Regionale Sectoriale (PRS) pentru elaborarea documentației tehnice de proiect a componentei „**Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova**”, Acordul de finanțare nr. 81120033 din 04.12.2017, nr. proiectului 2014.2267.4 - 009 cu privire la Elaborarea proiectelor tehnice și a documentație de licitație pentru lucrările de construcție a proiectelor selectate de alimentare cu apă și canalizare și eficiență energetică a clădirilor publice în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova, Acordurile speciale cu amendamentele ulterioare din cadrul proiectului "MSPL în RM", Memorandumului de Înțelegere semnat la data de 15 februarie 2018 pentru implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Leova din cadrul proiectului „MSPL în RM” cu finanțare din Fondurile Uniunii Europene încheiat între Ministrului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului actual Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, Consiliul raional Leova, Primăriile localităților Leova, largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui, Acordul de Finanțare cu nr. 81246250 din 23 septembrie 2019, nr. proiectului 2014.2267.4-013.00 cu privire la contribuția financiară pentru implementarea lucrărilor de construcție a unor proiecte selectate de alimentare cu apă și canalizare (AAC) și de eficiență energetică (EE) a clădirilor publice în RD Sud din RM, Acordului Special cu amendamentele ulterioare din cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană, Decizia CNCDR nr. 11/20 din 13 februarie 2020 cu privire la prioritizarea alocării resurselor financiare pentru implementarea proiectelor finanțate din sursele Uniunii Europene și a Contractului de Finanțare nr. 03 din 07 mai 2020 a proiectului „**Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova**” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și proiectul „MSPL în RM ”.

## 3. ACHIZIȚII PUBLICE

<b>Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova</b>	
<b>Contract</b>	<b>Servicii de proiectare</b>
<u>08/S/18 din 19.04.2018</u>	În urma desfășurării licitației publice nr. MSPL/GIZ/S/SA/001 și în temeiul Deciziei GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 01/18 din 03.04.2018 a fost desemnat câștigător, S.R.L. „FLUXPROIECT” pentru executarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru: <b>Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova (LOT SA 2)</b> , în valoare de <b>5.050.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> cu perioada de realizare a lucrărilor de <b>8 luni calendaristice</b> .
<u>AA nr. 1 din 22.08.2018</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – pe parcursul implementării proiectului a fost constatată necesitatea includerii volumelor suplimentare de proiectare menționate în raportul inițial, Faza 1, prezentat de compania SRL ”FLUXPROIECT” la data de 25.05.2018 în valoare de <b>695 000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> , ajustări în localitățile Filipeni, Romanovca și Cupcui potrivit recomandărilor GIZ Moldova transpuse prin scrisoarea nr. 181 din 26.07.2018 punctele 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. Astfel prin procesul verbal nr. 10/18 din 15 august 2018 GLAP a aprobat volumele adiționale de proiectare, iar prin scrisoarea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova în calitatea sa de finanțator al proiectului, a aprobat costurile pentru volumele adiționale respective în valoare de <b>695 000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> și a solicitat încheierea acordului adițional. Prin urmare, valoarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>5.745.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .
<u>AA nr. 2 din 07.11.2018</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – pe parcursul implementării proiectului a fost constatată necesitatea includerii volumelor suplimentare de proiectare menționate în raportul inițial, Faza 1, prezentat de compania SRL ”FLUXPROIECT” la data de 25.05.2018 în valoare de <b>1 028 000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> , ajustări în localitățile Băiuș, Cociulia-Nouă, Borogani, Meșeni, Tigheci, Cuporani și a Fabricii de Vinuri potrivit recomandărilor GIZ Moldova transpuse prin scrisoarea nr. 181 din 26.07.2018, fără limitarea calcului hidraulic, în conformitate cu devizul prezentat de compania SRL „FLUXPROIECT” la 04.10.2018. Astfel prin procesul verbal nr. 10/18 din 15 august 2018 GLAP a aprobat volumele adiționale de proiectare, iar prin scrisoarea nr. 294 din 30.10.2018 Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova în calitatea sa de finanțator al proiectului, a aprobat costurile pentru volumele adiționale respective în valoare

	<p>de 1 028 000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) și a solicitat încheierea acordului adițional, din care va fi acoperită: 250 000,00 MDL din partea Primăriei or. Iargara conform scrisorii din 20.09.2018 și a Deciziei 5/3 din 20.09.2018 a Consiliului local Iargara și 250 000,00 MDL de către Consiliul raional Leova conform scrisorii 342-02/4-71 din 08.10.2018 iar diferența din fondurile UE.</p> <p>Prin urmare, valoarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>6.773.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<u>AA nr. 3 din 04.04.2019</u>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – pe parcursul implementării proiectului a fost constatată necesitatea includerii volumelor suplimentare de proiectare în valoarea de 145 226,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) pentru lucrările de proiectare a "Stației hidrofor" în localitatea Iargara și a "Stației de dezinfecție" în localitatea Sărata Nouă, volume parvenite ca urmare a aprobării de către DC al GIZ a FAZEI 2 a Proiectului tehnic preliminar și conform recomandărilor DC al GIZ și 38 648,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) volume adiționale pentru lucrările de proiectare propuse și argumentate de către SRL " FLUXPROIECT" ce ar evita săparea și traversarea drumului național de 98 ori, unde a fost menționat despre necesitate proiectării suplimentare a 2670 m.l. de rețea de alimentare cu apă. Astfel prin procesul verbal nr. 06/19 din 01 martie 2019 GLAP a aprobat volume adiționale de proiectare a "Stației hidrofor" în localitatea Iargara și a "Stației de dezinfecție" în localitatea Sărata Nouă, prezentate de compania SRL " FLUXPROIECT" la data de 14 februarie 2019 cât și a proiectării suplimentare a 2670 m.l. de rețea de alimentare cu apă în or. Iargara, prezentate de compania SRL " FLUXPROIECT" la data de 27 februarie 2019, iar prin scrisoarea 063-GIZ din data de 04 martie 2019 a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova în calitate s-a de finanțator al proiectului, a informat ADR Sud despre aprobarea costurilor propuse de SRL „FLUXPROIECT” pentru volumele adiționale respective în valoare de 183 874,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) și a solicitat încheierea acordului adițional în acest sens.</p> <p>Prin urmare, valoarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>6.956.874,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<u>AA nr. 4 din 07.11.2018</u>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – pe parcursul unde pe parcursul implementării acestuia, s-a constatat necesitatea includerii volumelor suplimentare pentru servicii de proiectare și anume proiectarea a 803 conectări, volume parvenite ca urmare a aprobării de către grupul de lucru a extinderii proiectării rețelelor de alimentare cu apa din or. Iargara cu o lungimea de 16 918 m.l. Valoarea totală a volumelor suplimentare constituie 207 750,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).</p> <p>Prin urmare, valoarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>7.164.624,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<u>AA nr. 5 din 07.08.2019</u>	<p><u>Modificarea conținutului contractului</u> - unde pe parcursul implementării acestuia, s-a constatat necesitatea operării unor modificări în conținutul contractului respectiv.</p> <p>În adresa ADR Sud, a parvenit solicitarea SRL „FLUXPROIECT” din 02.08.2019, prin care se consemnează, cu referire la proiect, de a fi prezentate Proiectul Tehnic Funcțional – Faza 3, numai pe suport electronic (CD): în limba română și engleză sau, într-un singur exemplar pe suport de hârtie și pe suport electronic (CD): în limba română și engleză. Deoarece în componența actuală, proiectele nu pot fi folosite pentru lucrările de construcție-montaj, și nu e necesar prezentarea proiectelor menționate în numărul de exemplare indicat în contractul 08/S/18 din „19” aprilie 2018, iar în termenii proxim posibili ( în decurs de o lună) se va prezenta Faza 4 (Raportul final, inclusiv Proiectul tehnic de execuție detaliat verificat) în număr de 4 copii verificate, 2 exemplare în limba engleză și pe suport electronic (CD).</p> <p>Prin urmare, a fost aprobat și s-a stabilit prezentarea de către prestator - Proiectul Tehnic Funcțional – Faza 3 - într-un singur exemplar pe suport de hârtie și pe suport electronic (CD): în limba română și engleză.</p>
<b>Contract</b>	<b>Lucrări construcție - montaj (LCM)</b>
<u>05/L/20/GIZ din 08.09.2020</u>	<p>În urma desfășurării procedurii de licitație internațională nr. MSPL/GIZ/L/SA/001 din 22.05.2020 pentru achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” ulterior având la bază Raportul privind deschiderea ofertelor, Raportul de evaluare pentru contractarea lucrărilor de construcție, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 26/20 din 08 iulie 2020 de atribuire a contractului, Scrisoarea nr. 165-GIZ Moldova din 12 august 2020, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 34/20 din 21 august 2020 de negociere a contractului, Scrisoarea nr. 307-GIZ Moldova din 23 septembrie 2020 și Scrisoarea nr. 312-GIZ Moldova din 24 septembrie 2020 de către GLAP a fost desemnat câștigător SRL „Polimer Gaz Conducte”, cu valoarea ofertei de <b>90.989.087,86 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>, cu perioada de realizare a lucrărilor de <b>10 luni calendaristice</b></p>
<u>AA nr. 1 din 02.02.2021</u>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – În urma modificărilor legislative, și anume art. XIII, pct.9 din Legea nr.257 din 16.12.2020 prin care se modifică Anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.60 din 23.04.2020 prin care este exclus pct.1 din Anexa nr.1 la Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărirea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 01.01.2021, la bugetarea și contabilizarea lucrărilor executate de către antreprenori din sectorul privat, se aplică un tarif de 24% al contribuțiilor de stat obligatorii la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, astfel valoarea acestora constituie suma de</p>

	<p>74.455,17 MDL cu TVA la cota 0 (zero).</p> <p>Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>91.063.543,03 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b></p>
<p><u>AA nr. 2 din 19.05.2021</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – în procesul de execuție a lucrărilor s-a constatat neconformități în documentația de proiect pentru localitatea Cupcui și necesitatea includerii unor lucrări și volume suplimentare pentru finisarea și asigurarea funcționalității obiectivului, întrucât prin actul nr. 1 din 11.12.2020 s-a constatat necesitatea conectării la apeduct a Casei de copii orfani și a blocurilor locative în două nivele cu 12 apartamente (DN63, L = 200 m.l.), obiective ce nu erau cuprinse de documentația de proiect pentru localitatea Cupcui. Astfel, valoarea acestora constituie suma de 47.553,37 MDL cu TVA la cota 0 „zero”, conform soluției prezentate de către autorul de proiect și respectiv oferta antreprenorului.</p> <p>Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>91.111.096,40 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<p><u>AA nr. 3 din 09.06.2021</u></p>	<p><u>Micșorarea și majorarea valorii contractului</u> – în procesul de execuție a lucrărilor s-a constatat neconformități în documentația de proiect pentru localitatea Filipeni din r-l. Leova și necesitatea excluderii și includerii unor lucrări și volume suplimentare pentru finisarea și asigurarea funcționalității obiectivului, întrucât, la montarea rețelelor de apă în s. Filipeni, s-a constatat că un sector de drum cu o lungime de 1250 m.l. este acoperit cu asfalt bituminos, iar conform desenelor tehnice (coala 9; 14; 17; 23: căminele F56, F55, F47, F46, F42, F41, F40, F30, F29 – F27) acesta este acoperit cu pietriș. Astfel, valoarea lucrărilor adiționale pentru localitatea Filipeni, urmează să se excludă lucrări în valoare de 80.602,73 MDL cu TVA la cota 0 „zero” și să se includă lucrări adiționale în valoare de 1.641.998,73 MDL cu TVA la cota 0 „zero”, conform soluției prezentate de către autorul de proiect și respectiv oferta antreprenorului.</p> <p>Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>92.672.492,40 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<p><u>AA nr. 4 din 06.08.2021</u></p>	<p><u>Modificarea perioadei de execuție</u> – în procesul de execuție a lucrărilor din cauza condițiilor climatice nefavorabile perioada de execuție a lucrărilor pentru localitatea largara și Filipeni necesită a fi extinsă cu un termen estimativ de 49 de zile pentru finisarea și asigurarea funcționalității obiectivului. Astfel perioada de execuție a lucrărilor pentru localitatea Filipeni și largara, conform recomandărilor finanțatorului GIZ se extinde până la data de 31 august 2021.</p> <p>Prin urmare, durata de execuție a lucrărilor contractate, <b>în urma extinderii va fi de 11 luni și 6 zile</b> din momentul primirii ordinului de începere a execuției și a predării șantierului pentru începerea lucrărilor.</p>
<p><u>AA nr. 5 din 29.10.2021</u></p>	<p><u>Micșorarea valorii contractului</u> – în procesul de execuție a lucrărilor, ca urmare a constatării situației actuale a numărului redus de case locuibile în or. largara, necesită de a fi excluse lucrări de montare a 162 de bransamente. Astfel valoarea lucrărilor adiționale pentru localitatea largara urmează să se excludă lucrări în valoare de 33.931,12 MDL cu TVA la cota 0 „zero”, conform soluției prezentate de către autorul de proiect și respectiv oferta antreprenorului.</p> <p>Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>92.638.561,28 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>

Contract	Servicii de supraveghere tehnică (RT)
<p>06/S/20/GIZ din 08.09.2020</p>	<p>În urma desfășurării procedurii de licitație internațională nr. MSPL/GIZ/L/SRT/002 din 22.05.2020 pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție la obiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” ulterior având la bază Raportul privind deschiderea ofertelor, Raportul de evaluare pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 21/20 din 10 iunie 2020 de atribuire a contractului, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 29/20 din 28 iulie 2020 de negociere a contractului, Scrisoarea nr. 176-GIZ Moldova din 14 august 2020 de către GLAP a fost desemnat câștigător SC „PREANT” SRL, Scrisoarea nr. 310-GIZ Moldova din 23 septembrie 2020 de către GLAP a fost aprobat contractul cu valoarea ofertei de <b>454.945,44 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>, ceea ce constituie 0,5 % din valoarea lucrărilor contractate.</p>
<p><u>AA nr. 1 din 02.02.2021</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08.09.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 372,28 MDL cu TVA la cota 0 (zero).</p> <p>Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>455.317,72 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<p><u>AA nr. 2 din 19.05.2021</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08.09.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 237,77 MDL cu TVA la cota 0 (zero).</p> <p>Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>455.555,49 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<p><u>AA nr. 3 din 09.06.2021</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08.09.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 7 806,98 MDL cu TVA la cota 0 (zero).</p> <p>Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>463.362,47 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<p><u>AA nr. 4 din</u></p>	<p><u>Micșorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ</p>

<u>29.10.2021</u>	din 08.09.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>169,66 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>463.192,81 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .
<b>Contract</b>	<b>Servicii de autor (SA)</b>
23/S/20/GIZ din 08.09.2020	În urma semnării Contractului 05/L/20/GIZ din 08.09.2020 privind lucrări de construcție-montaj și Contractul 06/S/20/GIZ din 08.09.2020 privind serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a fost semnat Contractul de autor cu SRL „FLUXPROIECT”, în valoare de <b>272.967,26 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> , ceea ce constituie 0,3 % din valoarea lucrărilor contractate.
<u>AA nr. 1 din 02.02.2021</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08.09.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>223,37 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>273.190,63 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .
<u>AA nr. 2 din 19.05.2021</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08.09.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>142,66 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>273.333,29 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .
<u>AA nr. 3 din 09.06.2021</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08.09.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>4 684,19 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>278.017,48 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .
<u>AA nr. 4 din 29.10.2021</u>	<u>Micșorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08.09.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>101,79 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>277.915,68 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .

<b>Contract</b>	<b>Panou informativ</b>												
25/B/21 din 16.08.2021	Pentru promovarea zonei și informarea beneficiarilor privind realizarea obiectivului proiectului a fost achiziționate panouri informative, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>20.340,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> . Prin urmare, valoarea panourilor informative ce reprezintă obiectul dat va fi de <b>11.397,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> . <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">APL I Iargara</td> <td>2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</td> </tr> <tr> <td>APL I Filipeni</td> <td>2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</td> </tr> <tr> <td>APL I Cupcui</td> <td>2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</td> </tr> <tr> <td>APL I Romanovca</td> <td>2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</td> </tr> <tr> <td>APL II Leova</td> <td>975,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);</td> </tr> <tr> <td>S.A. „Apă Canal Leova”</td> <td>1 950,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).</td> </tr> </table>	APL I Iargara	2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);	APL I Filipeni	2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);	APL I Cupcui	2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);	APL I Romanovca	2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);	APL II Leova	975,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);	S.A. „Apă Canal Leova”	1 950,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
APL I Iargara	2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);												
APL I Filipeni	2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);												
APL I Cupcui	2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);												
APL I Romanovca	2 118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);												
APL II Leova	975,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);												
S.A. „Apă Canal Leova”	1 950,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).												

#### 4. INDICATORII ATINȘI

Descrierea indicatorului		Unitatea de măsură	Valoarea inițială	Ținta finală	Progres atins	Abateri	Comentarii
Cod	Denumirea						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Indicatori de rezultat:</b>						
<b>203</b>	Proiect tehnic de execuție elaborat	Nr	0	4	4		
<b>204</b>	Rețele de apeduct construite	Km	0	101,5	101,6	+ 0,1	
	<i>Iargara</i>	km	0	35,5	35,5		
	<i>Filipeni</i>			36,5	36,6	+ 0,1	
	<i>Cupcui</i>			16,9	16,9		
	<i>Magistrala Cupcui – Sărata Nouă</i>			7,3	7,3		
	<i>Romanovca</i>			5,3	5,3		
<b>206a</b>	Instalații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu	Nr	0	5	5		
	<i>Iargara</i>	Nr	0	1	1		
	<i>Filipeni</i>			1	1		
	<i>Cupcui</i>			1	1		
	<i>Sărata Nouă</i>			1	1		
	<i>Romanovca</i>			1	1		
<b>207</b>	Stații de pompare a apei potabile date în exploatare	Nr	0	1	1		
	<i>Iargara</i>	Nr	0	1	1		
<b>209</b>	Rezervoare de apă potabilă date în exploatare	Nr	0	2	2		
	<i>Cupcui (V = 50m<sup>3</sup>)</i>	Nr	0	2	2		
<b>213</b>	Conectări la apeduct îmbunătățit	Nr	0	3409	3409	0	
	<i>Iargara</i>	Nr	0	1834	1832	- 2	
	<i>Filipeni</i>			965	961	- 4	
	<i>Cupcui</i>			442	457	+ 15	
	<i>Romanovca</i>			168	159	- 9	

Descrierea indicatorului		Unitatea de măsură	Valoarea inițială	Ținta finală	Progres atins	Abateri	Comentarii
Cod	Denumirea						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Indicatori de produs:</b>						
<b>217</b>	Localități ce au acces la servicii îmbunătățite de AAC	Nr	2	5	5		
	<i>largara</i>	Nr	1	1	1		
	<i>Filipeni</i>		0	1	1		
	<i>Cupcui</i>		0	1	1		
	<i>Sărata Nouă</i>		1	1	1		
	<i>Romanovca</i>		0	1	1		
<b>218</b>	Populație cu acces la sistemul îmbunătățit de aprovizionare cu apă*	Nr	2122	12096	12096		
	<i>largara</i>	Nr	646	4936	4936		
	<i>Filipeni</i>		0	3558	3558		
	<i>Cupcui</i>		0	1556	1556		
	<i>Sărata Nouă</i>		1476	1476	1476		
	<i>Romanovca</i>		0	570	570		

\* - conform datelor BNS.

## 5. ACTIVITĂȚILE REALIZATE

Nr.	Activitățile		Responsabil	Anul A-2018 de implementare												Abateri / Comentarii	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice	planificat realizat	ADR Sud														La data de 12.01.2018 a fost publicat anunțul
2	Organizarea licitației pentru achiziționarea serviciilor de proiectare	planificat realizat	ADR Sud														Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 09.03.2018.
3	Pregătirea și Semnarea Contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare	planificat realizat	ADR Sud / Proiectant / APL I														Semnat la data de 19 aprilie 2018; Pregătirea actelor necesare privind inițierea serviciilor de proiectare.
4	Faza 1. RAPORT INIȚIAL - elaborare	planificat realizat	Proiectant														Inițierea Faza 1. Raport inițial la data de 24.05.2018; Transmis spre aprobare la data de 25.05.2018.
	Faza 1. RAPORT INIȚIAL – coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I														Aprobat Faza 1. Raport inițial la data de 26.07.2018.
	Faza 1. RAPORT INIȚIAL – volum adițional Filipeni, Cupcui, Romanovca	realizat	GIZ Moldova / APL I														Aprobat Faza 1. Raport inițial volum adițional la data de 17.08.2018.
5	Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR - elaborare	planificat	Proiectant														2 luni de la data semnării contractului
		de facto													Inițierea Faza 2. Proiect Tehnic Preliminar la data de 08.11.2018.		
		neplanificat	APL I														Solicitare prezentare plan geometric cu schema de execuție
		realizat														Transmise către proiectant la data de 06.12.2018.	
realizat	Proiectant															Transmis spre aprobare la data de 21.12.2018.	
6	Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL	planificat	Proiectant														4 luni de la data semnării contractului
7	Faza 4. RAPORT FINAL, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat	planificat	Proiectant														8 luni de la data semnării contractului
	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	planificat	ADR Sud / APL														-
Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2019 de implementare												Abateri / Comentarii	
1	2	3	4	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		17
5	Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR - coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I														Aprobat Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR la data de 26.02.2019.
		neplanificat	APL I														Solicitare prezentare de către beneficiar Avize și Condiții tehnice
		realizat														Transmise către proiectant la data de 04.07.2019.	
6	Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL - elaborare	de facto	Proiectant														Inițierea Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL la data de 26.02.2019.
		realizat	Proiectant														Transmis spre aprobare la data de 04.07.2019.
	Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL - coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I														Aprobat Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL la data de 09.08.2019.
7	Faza 4. RAPORT FINAL, inclusiv	de facto	Proiectant														Inițierea Faza 4. RAPORT FINAL

	proiectul de execuție detaliat verificat - elaborare	realizat	Proiectant														la data de 09.08.2019.
	Faza 4. RAPORT FINAL, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat - coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I														Transmis spre aprobare la data de 19.08.2019.
	Verificarea și expertizare proiectului	realizat	Proiectant / APLI														Aprobat Faza 4. RAPORT FINAL la data de 05.09.2019.
8	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant/beneficiar	realizat	ADR Sud / APL														Transmis proiectul tehnic verificat și expertizat la data de 22.10.2019.
																	Semnat Act de predare-primire nr. 13 din data de 04.12.2019
Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2020 de implementare												Abateri	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Elaborarea și Publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice	planificat realizat	ADR Sud														La data de 06.04.2020 a fost publicat anunțul
10	Organizarea licitației pentru achiziționarea execuția lucrărilor de construcție	planificat realizat	ADR Sud														La data de 22.05.2020 au fost depuse ofertele
11	Evaluarea ofertelor depuse și atribuirea contractului	planificat realizat	ADR Sud														La data de 08.07.2020 a fost ședința GLAP
12	Negocierea ofertei desemnate câștigătoare	realizat	ADR Sud														La data de 21.08.2020 a fost ședința GLAP
13	Semnarea contractelor de lucrări și servicii	planificat realizat	Antreprenor / ADR Sud / Beneficiar / RT														Semnate contracte la data de 08.09.2020
14	Executarea lucrărilor de construcție conform cu proiectului și a contractului	planificat realizat	Antreprenor / Beneficiar / RT														10 luni + 1 lună și 5 zile calendaristice
Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2021 de implementare												Abateri	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	Executarea lucrărilor de construcție conform cu proiectului și a contractului	planificat realizat	Antreprenor / Beneficiar / RT														10 luni + 1 lună și 5 zile calendaristice
15	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	planificat realizat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT														Semnate 4 Procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor: - nr. 1 din data de 12.10.2021 (Filipeni, Romanovca, Cupcui); - nr. 1 din data de 29.10.2021 (Iargara).
15.1	Efectuarea controlului volumelor și costul lucrărilor executate	realizat	AST/APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT														Proces-verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor de construcție executate cu nr. 3-1408/21 din 08.11.2021
16	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	planificat realizat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT														Semnate Procese-verbale de recepție finală - nr. 2 din data de 09.12.2021 (Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui);
17	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	planificat realizat	ADR Sud / APL														Elaborat: - Act de predare-primire nr. 29 din 25.10.2022 (APL I Iargara); - Act de predare-primire nr. 28 din 25.10.2022 (APL I Filipeni); - Act de predare-primire nr. 26 din 25.10.2022 (APL I Cupcui); - Act de predare-primire nr. 34 din 25.10.2022 (APL II Leova); - Act de predare-primire nr. 27 din 25.10.2022 (APL I Romanovca).

## 6. BUGETUL PROIECTULUI

### 6.1. Bugetul după activități.

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

#	Activități	Valoarea totală bugetară	Valoarea executată a bugetului			Buget debursat		Abateri
			UE	APL II Leova	APL I largara	În anul A-2018	În anul A-2019	
						VIII <sup>1</sup>	III <sup>2</sup> ; VIII <sup>3</sup> ; X <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B<sup>S</sup>. Servicii de proiectare</b>		<b>7.164.624,00</b>	<b>6.664.624,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.364.624,00</b>	
1	Raport inițial	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00 <sup>1</sup>	-	
1.1	<i>Volume adiționale – Raport inițial</i>	<i>2.114.624,00</i>	<i>1.614.624,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	-	<i>2.114.624,00<sup>3</sup></i>	
2	Proiect tehnic preliminar	900.000,00	900.000,00	-	-	-	900.000,00 <sup>2</sup>	
3	Proiect tehnic funcțional	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	-	2.450.000,00 <sup>3</sup>	
4	Raport final, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat	900.000,00	900.000,00	-	-	-	900.000,00 <sup>4</sup>	
<b>C<sup>S</sup>. Cheltuieli administrative</b>		<b>357,71</b>	<b>357,71</b>			<b>332,46</b>	<b>25,25</b>	
1	Plata pentru publicarea anunțului în BAP și comisionul bancar	357,71	357,71			332,46	25,25	
<b>Total costuri ale proiectului (B<sup>S</sup>+C<sup>S</sup>)</b>		<b>7.164.981,71</b>	<b>6.664.981,71</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.332,46</b>	<b>6.364.649,25</b>	
#	Activități	Valoarea totală bugetară	Valoarea executată a bugetului		Buget debursat		Abateri	
			UE	APL II Leova și APL I largara/Filipeni/Cupcui/Romanovca	În anul A-2020	În anul A-2021		
					X	I - VII		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>A<sup>LCM</sup>. Lucrări de construcție</b>		<b>92.638.561,28</b>	<b>85.870.389,28</b>	<b>6.768.172,00</b>	<b>4.517.215,65</b>	<b>88.121.345,63</b>		
1	<i>Scheme de execuție, pichetaj, organizare șantier</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	-	-	<i>21.500,00</i>		
2	<i>Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A1</i>	<i>19.892.701,78</i>	<i>19.892.701,78</i>	-	-	<i>19.892.701,78</i>		
3	<i>Rețele exterioare de alimentare cu apa. Branșamente.</i>	<i>19.195.689,98</i>	<i>16.195.689,98</i>	<i>3.000.000,00</i>	-	<i>19.195.689,98</i>		
4	<i>Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. LCM.</i>	<i>33.990,07</i>	<i>33.990,07</i>	-	-	<i>33.990,07</i>		
5	<i>Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH.</i>	<i>2.144.324,32</i>	<i>2.144.324,32</i>	-	-	<i>2.144.324,32</i>		
6	<i>Stația de repompare a apei SP-1. LCM.</i>	<i>16.064,60</i>	<i>16.064,60</i>	-	-	<i>16.064,60</i>		
7	<i>Stația de repompare a apei SP-1.TH.</i>	<i>674.006,29</i>	<i>674.006,29</i>	-	-	<i>674.006,29</i>		
8	<i>Alimentarea cu energie electrică Platforma A</i>	<i>95.689,87</i>	<i>95.689,87</i>	-	-	<i>95.689,87</i>		
9	<i>Alimentarea cu energie electrică Platforma B</i>	<i>87.663,43</i>	<i>87.663,43</i>	-	-	<i>87.663,43</i>		
10	<i>Amenajarea teritoriului. Platforma A.</i>	<i>248.950,09</i>	<i>248.950,09</i>	-	-	<i>248.950,09</i>		
11	<i>Amenajarea teritoriului. Platforma B.</i>	<i>70.866,14</i>	<i>70.866,14</i>	-	-	<i>70.866,14</i>		
<b>TOTAL APL I largara</b>		<b>42.481.446,57</b>	<b>39.481.446,57</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>42.481.446,57</b>		
1	<i>Scheme de execuție, pichetaj, organizare șantier</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	-	-	<i>21.500,00</i>		
2	<i>Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A1</i>	<i>13.493.888,02</i>	<i>13.493.888,02</i>	-	<i>474.888,49</i>	<i>13.018.999,53</i>		
3	<i>Rețele exterioare de alimentare cu apa. Branșamente</i>	<i>10.658.768,64</i>	<i>9.144.428,64</i>	<i>1.514.340,00</i>	-	<i>10.658.768,64</i>		
4	<i>Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. LCM</i>	<i>26.610,85</i>	<i>26.610,85</i>	-	-	<i>26.610,85</i>		
5	<i>Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH.</i>	<i>1.615.711,49</i>	<i>1.615.711,49</i>	-	-	<i>1.615.711,49</i>		
6	<i>Alimentarea cu energie electrică Platforma A</i>	<i>63.362,26</i>	<i>63.362,26</i>	-	-	<i>63.362,26</i>		
7	<i>Amenajarea teritoriului. Platforma A.</i>	<i>634.714,65</i>	<i>634.714,65</i>	-	-	<i>634.714,65</i>		
<b>TOTAL APL I Filipeni</b>		<b>26.514.555,91</b>	<b>25.000.215,91</b>	<b>1.514.340,00</b>	<b>474.888,49</b>	<b>26.039.667,42</b>		
1	<i>Scheme de execuție, pichetaj, organizare șantier</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	-	-	<i>21.500,00</i>		
2	<i>Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A1</i>	<i>4.866.248,62</i>	<i>4.866.248,62</i>	-	<i>1.911.523,71</i>	<i>2.954.724,91</i>		
3	<i>Rețele exterioare de alimentare cu apa. Branșamente</i>	<i>4.562.906,06</i>	<i>3.754.418,06</i>	<i>808.488,00</i>	-	<i>4.562.906,06</i>		
4	<i>Rezervor metalic cu membrana din EPDM V=50m3. LCM</i>	<i>157.852,36</i>	<i>157.852,36</i>	-	<i>48.475,36</i>	<i>109.377,00</i>		
5	<i>Rezervor metalic cu membrana din EPDM V=50m3.Utilaj.</i>	<i>1.319.988,03</i>	<i>1.319.988,03</i>	-	-	<i>1.319.988,03</i>		
6	<i>Rezervor metalic cu membrana din EPDM V=50m3. TH.</i>	<i>70.435,64</i>	<i>70.435,64</i>	-	-	<i>70.435,64</i>		
7	<i>Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. LCM.</i>	<i>30.471,64</i>	<i>30.471,64</i>	-	-	<i>30.471,64</i>		
8	<i>Stația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH.</i>	<i>1.593.494,69</i>	<i>1.593.494,69</i>	-	-	<i>1.593.494,69</i>		
9	<i>Alimentarea cu energie electrică Platforma A</i>	<i>338.556,89</i>	<i>338.556,89</i>	-	-	<i>338.556,89</i>		
10	<i>Amenajarea teritoriului. Platforma A.</i>	<i>303.703,86</i>	<i>303.703,86</i>	-	-	<i>303.703,86</i>		
<b>TOTAL APL I Cupcui</b>		<b>13.265.157,79</b>	<b>12.456.669,79</b>	<b>808.488,00</b>	<b>1.959.999,07</b>	<b>11.305.158,72</b>		
1	<i>Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A9.</i>	<i>2.916.808,11</i>	<i>1.783.808,11</i>	<i>1.133.000,00</i>	<i>1.399.212,09</i>	<i>1.517.596,02</i>		
2	<i>Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. LCM.</i>	<i>21.001,66</i>	<i>21.001,66</i>	-	-	<i>21.001,66</i>		
3	<i>Stația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH.</i>	<i>1.540.871,68</i>	<i>1.540.871,68</i>	-	-	<i>1.540.871,68</i>		
4	<i>Alimentarea cu energie electrică Platforma B</i>	<i>147.893,84</i>	<i>147.893,84</i>	-	-	<i>147.893,84</i>		
5	<i>Amenajarea teritoriului. Platforma B.</i>	<i>317.333,78</i>	<i>317.333,78</i>	-	-	<i>317.333,78</i>		
<b>TOTAL APL II Cupcui – Sărata Nouă</b>		<b>4.943.909,07</b>	<b>3.810.909,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.399.212,09</b>	<b>3.544.696,98</b>		



#	Activități	Valoarea totală bugetară	Valoarea executată a bugetului		Buget debursat		Abateri
			UE	APL II Leova și APL I Iargara/Filipeni/Cupcui/Romanovca	În anul A-2020	În anul A-2021	
					X	I - VII	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare șantier	21.500,00	21.500,00	-	-	21.500,00	
2	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sistemul A1	1.675.558,47	1.675.558,47	-	683.116,00	992.442,47	
3	Rețele exterioare de alimentare cu apa. Branșamente.	1.789.862,09	1.477.518,09	312.344,00	-	1.789.862,09	
4	Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. LCM.	23.355,75	23.355,75	-	-	23.355,75	
5	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH.	1.546.569,57	1.546.569,57	-	-	1.546.569,57	
6	Alimentarea cu energie electrică Platforma A	329.150,81	329.150,81	-	-	329.150,81	
7	Amenajarea teritoriului. Platforma A.	47.495,25	47.495,25	-	-	47.495,25	
<b>TOTAL APL I Romanovca</b>		<b>5.433.491,94</b>	<b>5.121.147,94</b>	<b>312.344,00</b>	<b>683.116,00</b>	<b>4.750.375,94</b>	
<b>B<sup>LCM</sup>. Servicii</b>		<b>741.108,49</b>	<b>741.108,49</b>	<b>-</b>	<b>22.586,07</b>	<b>718.522,42</b>	
1	Supraveghere tehnică (0,5 %)	463.192,81	463.192,81	-	22.586,07	440.606,74	
2	Supraveghere de autor (0,3 %)	277.915,68	277.915,68	-	-	277.915,68	
<b>C<sup>LCM</sup>. Cheltuieli administrative</b>		<b>11.397,00</b>	<b>11.397,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.397,00</b>	
1	Panou informativ (2 buc) – APL I Iargara	2.118,00	2.118,00		-		
2	Panou informativ (2 buc) – APL I Filipeni	2.118,00	2.118,00		-		
3	Panou informativ (2 buc) – APL I Cupcui	2.118,00	2.118,00		-		
4	Panou informativ (2 buc) – APL I Romanovca	2.118,00	2.118,00		-		
5	Panou informativ (1 buc) – APL II Leova	975,00	975,00		-		
6	Panou informativ (2 buc) – S.A. „Apă Canal Leova”	1.950,00	1.950,00		-		
<b>Total costuri ale proiectului (A<sup>LCM</sup>+ B<sup>LCM</sup>+ C<sup>LCM</sup>)</b>		<b>93.391.066,77</b>	<b>86.622.894,77</b>	<b>6.768.172,00</b>	<b>4.539.801,72</b>	<b>88.851.265,05</b>	
<b>TOTAL GENERAL<sup>S</sup> + LCM</b>		<b>100.556.048,48</b>	<b>93.285.926,48</b>	<b>7.268.172,00</b>			

6.2 Bugetul după categorii și surse.

ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	Mijloace financiare					Total	Cheltuieli efectuate				Sold la sfârșitul A - 2019
	aprobat	contractat	facturat, A - 2018	facturat, A - 2019	deburat la ADR		Anul - 2018	Anul - 2019			
							Trimestrul III	Trimestrul I	Trimestrul III	Trimestrul IV	
							Iulie	Martie	Iulie	Octombrie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5
<b>Servicii</b>	<b>7.265.242,60</b>	<b>7.164.624,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.364.624,00</b>	<b>7.164.624,00</b>	<b>7.164.624,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.564.624,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
Elaborarea documentației de proiect	7.265.242,60	7.164.624,00	800.000,00	6.364.624,00	7.164.624,00	7.164.624,00	800.000,00	900.000,00	4.564.624,00	900.000,00	0,00
<b>Cheltuieli administrative</b>	<b>2.757,40</b>	<b>357,71</b>	<b>332,46</b>	<b>25,25</b>	<b>357,71</b>	<b>357,71</b>	<b>332,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>
Plata pentru publicarea anunțului în BAP și comisioane	2.757,4	357,71	332,46	25,25	357,71	357,71	332,46	-	-	25,25	0,00
<b>Total cheltuieli ale proiectului</b>	<b>7.268.000,00</b>	<b>7.164.981,71</b>	<b>800.332,46</b>	<b>6.364.649,25</b>	<b>7.164.981,71</b>	<b>7.164.981,71</b>	<b>800.332,46</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.564.624,00</b>	<b>900.025,25</b>	<b>0,00</b>
UE prin intermediul GIZ	6.768.000,00		800.332,46	6.364.649,25	6.664.981,71	6.664.981,71	800.332,46	900.000,00	4.064.624,00	900.000,00	0,00
APL II Leova	250.000,00	7.164.981,71	-	-	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	-	0,00
APL I largara	250.000,00		-	-	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	-	0,00

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	TOTAL - mijloace financiare				Total	Cheltuieli efectuate, Anul - 2020			Sold la sfârșitul A - 2020
	aprobat	contractat**	facturat, A - 2020	deburat la ADR, A - 2020		Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	
						Iunie	Iulie	Octombrie	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-3
<b>Lucrări construcții, montaj conform proiectului tehnic</b>	<b>91.725.880,00</b>	<b>92.638.561,28</b>	<b>4.517.215,65</b>	<b>4.517.215,65</b>	<b>6.377.561,65</b>	<b>1.136.246,00</b>	<b>724.100,00</b>	<b>4.817.215,65</b>	<b>- 88.121.345,63</b>
UE prin intermediul GIZ	35.273.148,00	37.593.228,06	-	-	-	-	-	-	- 37.593.228,06
APL I largara	7.499.932,00	4.788.218,51	-	-	1.300.000,00	800.000,00	200.000,00	300.000,00	- 4.788.218,51
<b>Subtotal localitatea largara</b>	<b>42.773.080,00</b>	<b>42.481.446,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>- 42.481.446,57</b>
UE prin intermediul GIZ	23.726.301,00	24.140.710,81	474.888,49	474.888,49	474.888,49	-	-	474.888,49	- 23.665.822,32
APL I Filipeni	1.476.999,00	2.373.845,10	-	-	524.100,00	-	524.100,00	-	- 2.373.845,10
<b>Subtotal localitatea Filipeni</b>	<b>25.203.300,00</b>	<b>26.514.555,91</b>	<b>474.888,49</b>	<b>474.888,49</b>	<b>998.988,49</b>	<b>-</b>	<b>524.100,00</b>	<b>474.888,49</b>	<b>- 26.039.667,42</b>
UE prin intermediul GIZ	17.498.442,00	11.989.415,55	1.959.999,07	1.959.999,07	1.959.999,07	-	-	1.959.999,07	- 10.029.416,48
APL I Cupcui	808.488,00	1.275.742,24	-	-	242.546,00	242.546,00	-	-	- 1.275.742,24
<b>Subtotal localitatea Cupcui</b>	<b>18.306.930,00</b>	<b>13.265.157,79</b>	<b>1.959.999,07</b>	<b>1.959.999,07</b>	<b>2.202.545,07</b>	<b>242.546,00</b>	<b>-</b>	<b>1.959.999,07</b>	<b>- 11.305.158,72</b>
UE prin intermediul GIZ	-	3.750.025,11	1.399.212,09	1.399.212,09	1.399.212,09	-	-	1.399.212,09	- 2.350.813,02
APL II Leova	-	1.193.883,96	-	-	-	-	-	-	- 1.193.883,96
<b>Subtotal magistrala A9 Cupcui – Sărata Nouă</b>	<b>-</b>	<b>4.943.909,07</b>	<b>1.399.212,09</b>	<b>1.399.212,09</b>	<b>1.399.212,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.399.212,09</b>	<b>- 3.544.696,98</b>
UE prin intermediul GIZ	5.130.226,00	4.697.418,75	683.116,00	683.116,00	683.116,00	-	-	683.116,00	4.014.302,75
APL I Romanovca	312.344,00	736.073,19	-	-	93.700,00	93.700,00	-	-	- 736.073,19
<b>Subtotal localitatea Romanovca</b>	<b>5.442.570,00</b>	<b>5.433.491,94</b>	<b>683.116,00</b>	<b>683.116,00</b>	<b>776.816,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>-</b>	<b>683.116,00</b>	<b>- 4.750.375,94</b>

RAPORT FINAL

al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	TOTAL - mijloace financiare				Total	Cheltuieli efectuate, Anul - 2020			Sold la sfârșitul A - 2020
	aprobat	contractat**	facturat, A - 2020	debursat la ADR, A - 2020		Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	
						Iunie	Iulie	Octombrie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-3
<b>Servicii</b>	<b>733.807,04</b>	<b>741.108,49</b>	<b>22.586,07</b>	<b>22.586,07</b>	<b>22.586,07</b>	-	-	<b>22.586,07</b>	<b>- 718.522,42</b>
Supraveghere tehnică (0,5 %)	458.629,40	463.192,81	22.586,07	22.586,07	22.586,07	-	-	22.586,07	- 440.606,74
Supraveghere de autor (0,3 %)	275.177,64	277.915,68	-	-	-	-	-	-	- 277.915,68
<b>Cheltuieli administrative</b>	<b>48.000,00</b>	<b>11.397,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>- 11.397,00</b>
Panou informativ (9 buc.)	48.000,00	11.397,00	-	-	-	-	-	-	- 11.397,00
<b>Total cheltuieli ale proiectului</b>	<b>92.507.687,04</b>	<b>93.391.066,77</b>	<b>4.539.801,72</b>	<b>4.539.801,72</b>	<b>6.700.147,72</b>	<b>1.136.246,00</b>	<b>724.100,00</b>	<b>4.839.801,72</b>	<b>- 88.851.265,05</b>
UE prin intermediul GIZ	82.139.924,04	83.023.303,77	4.539.801,72	4.539.801,72	4.539.801,72	-	-	4.539.801,72	- 78.483.502,05
4 APL-uri	10.367.763,00	10.367.763,00	-	-	2.160.346,00	1.136.246,00	724.100,00	300.000,00	- 10.367.763,00

\*\* - valoarea lucrărilor de construcție-montaj ca urmare a acordurilor adiționale

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	TOTAL - mijloace financiare				Total	Cheltuieli efectuate, Anul - 2021						Sold la sfârșitul A - 2021
	contractat**	executat, A - 2020	facturat, A - 2021	debursat la ADR, A - 2021		Trimestrul I		Trimestrul II	Trimestrul III		Trimestrul IV	
						Ianuarie	Martie	Mai	Iulie	August	Octombrie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=(3+5)-2
<b>LCM conform proiectului tehnic</b>	<b>92.638.561,28</b>	<b>4.517.215,65</b>	<b>88.121.345,63</b>	<b>88.121.345,63</b>	<b>88.121.345,63</b>	<b>33.031.841,15</b>	<b>22.457.181,81</b>	<b>13.623.721,66</b>	<b>7.895.903,20</b>	<b>11.042.521,95</b>	<b>70.175,86</b>	<b>0,00</b>
UE prin intermediul GIZ	37.693.228,06	-	39.481.446,57	39.481.446,57	39.481.446,57	2.299.329,79	13.704.140,82	10.771.088,85	4.880.323,35	7.756.387,90	70.175,86	1.788.218,51
APL I largara	4.788.218,51	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00	600.000,00	800.000,00	-	-	- 1.788.218,51
<b>Total localitatea largara</b>	<b>42.481.446,57</b>	<b>-</b>	<b>42.481.446,57</b>	<b>42.481.446,57</b>	<b>42.481.446,57</b>	<b>3.599.329,79</b>	<b>14.004.140,82</b>	<b>11.371.088,85</b>	<b>5.680.323,35</b>	<b>7.756.387,90</b>	<b>70.175,86</b>	<b>0,00</b>
UE prin intermediul GIZ	24.140.710,81	474.888,49	24.525.327,42	24.525.327,42	24.525.327,42	11.279.956,28	7.753.040,99	2.252.632,81	2.215.579,85	1.024.117,49	-	859.505,10
APL I Filipeni	2.373.845,10	-	1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00	524.100,00	700.000,00	-	-	-	290.240,00	- 859.505,10
<b>Total localitatea Filipeni</b>	<b>26.514.555,91</b>	<b>474.888,49</b>	<b>26.039.667,42</b>	<b>26.039.667,42</b>	<b>26.039.667,42</b>	<b>11.804.056,28</b>	<b>8.453.040,99</b>	<b>2.252.632,81</b>	<b>2.215.579,85</b>	<b>1.314.357,49</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
UE prin intermediul GIZ	11.989.415,55	1.959.999,07	10.496.670,72	10.496.670,72	10.496.670,72	9.936.887,71	-	-	-	559.783,01	-	467.254,24
APL I Cupcui	1.275.742,24	-	808.488,00	808.488,00	808.488,00	242.546,00	323.396,00	-	-	242.546,00	-	- 467.254,24
<b>Total localitatea Cupcui</b>	<b>13.265.157,79</b>	<b>1.959.999,07</b>	<b>11.305.158,72</b>	<b>11.305.158,72</b>	<b>11.305.158,72</b>	<b>10.179.433,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.125.725,01</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
UE prin intermediul GIZ	3.750.025,11	1.399.212,09	2.411.696,98	2.411.696,98	2.411.696,98	2.411.696,98	-	-	-	-	-	60.883,96
APL II Leova	1.193.883,96	-	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	-	-	1.133.000,00	-	-	-	- 60.883,96
<b>Total magistrala A9 Cupcui – Sărata Nouă</b>	<b>4.943.909,07</b>	<b>1.399.212,09</b>	<b>3.544.696,98</b>	<b>3.544.696,98</b>	<b>3.544.696,98</b>	<b>3.063.396,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481.300,91</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
UE prin intermediul GIZ	4.697.418,75	683.116,00	4.438.031,94	4.438.031,94	4.438.031,94	4.291.925,30	-	-	-	146.106,64	-	423.729,19
APL I Romanovca	736.073,19	-	312.344,00	312.344,00	312.344,00	93.700,00	124.938,00	-	93.706,00	-	-	- 423.729,19
<b>Total localitatea Romanovca</b>	<b>5.433.491,94</b>	<b>683.116,00</b>	<b>4.750.375,94</b>	<b>4.750.375,94</b>	<b>4.750.375,94</b>	<b>4.385.625,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364.750,64</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

RAPORT FINAL

al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	TOTAL - mijloace financiare				Total	Cheltuieli efectuate, Anul - 2021						Sold la sfârșitul A - 2021
	contractat**	executat, A - 2020	facturat, A - 2021	debursat la ADR, A - 2021		Trimestrul I		Trimestrul II	Trimestrul III		Trimestrul IV	
						ianuarie	Martie	Mai	Iulie	August	Octombrie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=(3+5)-2
<b>Servicii</b>	<b>741.108,49</b>	<b>22.586,07</b>	<b>718.522,42</b>	<b>718.522,42</b>	<b>718.522,42</b>	<b>277.806,38</b>	<b>112.285,92</b>	<b>68.118,61</b>	<b>171.409,94</b>	<b>65.071,01</b>	<b>23.830,57</b>	<b>0,00</b>
Supraveghere tehnică-0,5%	463.192,81	22.586,07	440.606,74	440.606,74	440.606,74	165.159,21	112.285,92	68.118,61	39.479,52	55.212,61	350,88	0,00
Supraveghere de autor-0,3%	277.915,68	-	277.915,68	277.915,68	277.915,68	112.647,17			131.930,42	9.858,40	23.479,69	0,00
<b>Cheltuieli administrative</b>	<b>11.397,00</b>	<b>-</b>	<b>11.397,00</b>	<b>11.397,00</b>	<b>11.397,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.397,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Panou informativ (9 buc.)	11.397,00	-	11.397,00	11.397,00	11.397,00	-	-	-	-	11.397,00	-	0,00
<b>Total cheltuieli ale proiectului</b>	<b>93.391.066,77</b>	<b>4.539.801,72</b>	<b>88.849.315,05</b>	<b>88.849.315,05</b>	<b>88.849.315,05</b>	<b>33.309.647,53</b>	<b>22.569.467,73</b>	<b>13.691.840,27</b>	<b>8.067.313,14</b>	<b>11.109.542,96</b>	<b>94.006,43</b>	<b>0,00</b>
UE prin intermediul GIZ	83.023.303,77	4.539.801,72	82.081.143,05	82.081.143,05	82.081.143,05	30.497.602,44	21.569.467,73	13.091.840,27	7.267.313,14	9.553.416,05	94.006,43	3.599.591,00
4 APL-uri	10.367.763,00	-	6.768.172,00	6.768.172,00	6.768.172,00	2.812.045,09	1.000.000,00	600.000,00	800.000,00	1.556.126,91	-	- 3.599.591,00

\*\* - valoarea lucrărilor de construcție-montaj ca urmare a acordurilor adiționale

## 7. RISCURI ȘI CONSTRÂNGERI ÎNTÂMPINATE

Descrierea riscului	Categoria riscului	Măsuri întreprinse	Impactul asupra proiectului
1	2	3	4
Termen extins de realizare a procedurii de achiziții și a lucrărilor de construcție	Operațional	Respectarea legislației privind achizițiile publice, condiții de realizare a lucrărilor	Achiziția lucrărilor de construcție a proiectului a fost executat conform normativelor în vigoare
Reticența populației în ceea ce privește conectarea la rețelele de apeduct și achitarea tarifelor pentru serviciile de care beneficiază	Financiar	Acțiuni de sensibilizare și informare în permanență	Pentru a avea un serviciu durabil aceste acțiuni trebuie să fie continuate
Lipsa ofertelor calitative din partea operatorilor economici poate duce la depășirea termenului planificat pentru achiziții	Operațional	Au fost reevaluate ofertele prezentate în cadrul licitației	Calitatea ofertei oferă calitatea lucrărilor executate
Constrângeri în desfășurarea activităților legate de situația epidemiologică generată de pandemia COVID-19	Operațional	Acțiuni repetate a solicitărilor privind obținerea actelor necesare	Actele necesare au fost obținute cu întârziere, prelungindu-se perioada de implementare a proiectului
Nerespectarea termenelor prevăzute în contract privind aprobarea facturilor de către reprezentanții Departamentul de Construcții al GIZ	Operațional / Financiar	Ședințe de lucru cu explicarea procedurilor naționale de aprobare a proceselor de execuție a lucrărilor	Tergiversarea implementării lucrărilor conform graficului de execuție a lucrărilor

## 8. ASIGURAREA DURABILITĂȚII PROIECTULUI

Darea în exploatarea/ transmiterea bunului serviciului către beneficiar	Data	Comentarii
1	2	3
Act f/n de predare – primire a setului de documente conform contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare	03 august 2018	FAZA 1 – Raport inițial
	13 martie 2019	FAZA 2 – Proiect tehnic preliminar
	22 august 2019	FAZA 3 – Proiect tehnic funcțional
	22 octombrie 2019	FAZA 4 – Raport final, inclusiv proiect de execuție detaliat verificat
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 13	04 decembrie 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decizia 2.8 din 12.03.2020 – APL Iargara;</li> <li>- Decizia 1.17 din 20.03.2020 – APL Filipeni;</li> <li>- Decizia 4.4 din 12.03.2020 – APL Cupcui;</li> <li>- Decizia 3.4 din 17.03.2020 – APL Romanovca.</li> </ul>
Raport de vizită pe teren versiunea septembrie 2021	-	Raport al reprezentantului Departamentului de Construcții al GIZ
Proces verbal nr. 01 de recepție la terminarea lucrărilor	29 octombrie 2021	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție, localitatea IARGARA: <ul style="list-style-type: none"> <li>- montarea plăcilor de beton pentru toate vanele de branșare;</li> <li>- refacerea stratului de asfalt;</li> <li>- amenajarea teritoriului adiacent străzilor.</li> </ul>
		Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție, localitatea FILIPENI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de instalat panouri informative pentru hidranți anti-incendiari;</li> <li>- de finalizat montarea scărilor de acces la căminele de vizitare;</li> <li>- de finalizat lucrările de hidroizolare a căminelor de vizitare;</li> <li>- restabilirea drumurilor locale.</li> </ul>
	12 octombrie 2021	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție, localitatea CUPCUI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- montarea plăcilor pentru hidranți;</li> <li>- scări de acces la căminele de vane;</li> <li>- hidroizolarea interioară a căminelor de vane;</li> <li>- refacerea stratului de asfalt;</li> <li>- restabilirea drumurilor locale;</li> <li>- de corectat capacele coverilor.</li> </ul>
Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție, localitatea ROMANOVCA: <ul style="list-style-type: none"> <li>- montarea plăcilor pentru hidranți;</li> <li>- scări de acces la căminele de vane;</li> <li>- hidroizolarea interioară a căminelor de vane;</li> <li>- refacerea stratului de asfalt;</li> <li>- restabilirea drumurilor locale.</li> </ul>	30 noiembrie 2021	În urma efectuării controlului efectuat prin măsuri instrumentale a lucrărilor executate de facto în localitatea IARGARA și compararea cu datele documentelor de execuție a lucrărilor - exagerări n-au fost constatate.
		În urma efectuării controlului efectuat prin măsuri instrumentale a lucrărilor executate de facto în localitățile FILIPENI, CUPCUI și ROMANOVCA și compararea cu datele documentelor de execuție a lucrărilor - exagerări n-au fost constatate.
Proces verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor executate nr. 3-1471/21	08 noiembrie 2020	În urma efectuării controlului efectuat prin măsuri instrumentale a lucrărilor executate de facto în localitățile FILIPENI, CUPCUI și ROMANOVCA și compararea cu datele documentelor de execuție a lucrărilor - exagerări n-au fost constatate.

Darea în exploatarea/ transmiterea bunului serviciului către beneficiar	Data	Comentarii
1	2	3
Proces verbal nr. 02 de recepție finală	19 decembrie 2021	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție IARGARA: - nu au fost consemnate. Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție FILIPENI: - nu au fost consemnate. Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție CUPCUI: - nu au fost consemnate. Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție ROMANOVCA: - nu au fost consemnate.
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 29	25 octombrie 2022	- Act de predare – primire a fost elaborat; - Act de predare – primire nu a fost transmis spre aprobare;
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 28	25 octombrie 2022	- Act de predare – primire a fost elaborat; - Act de predare – primire nu a fost transmis spre aprobare;
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 26	25 octombrie 2022	- Act de predare – primire a fost elaborat; - Act de predare – primire nu a fost transmis spre aprobare;
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 34	25 octombrie 2022	- Act de predare – primire a fost elaborat; - Act de predare – primire nu a fost transmis spre aprobare;
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 27	25 octombrie 2022	- Act de predare – primire a fost elaborat; - Act de predare – primire nu a fost transmis spre aprobare;

## 9. ASIGURAREA VIZIBILITĂȚII PROIECTULUI

1. <a href="#">INVITATIE/ANUNT de participare la Licitația Publică inițiată în vederea implementării proiectelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în raionul Leova, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
2. <a href="#">Uniunea Europeană va finanta cinci proiecte din sudul țării privind aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și eficiență energetică   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
3. <a href="#">Au fost semnate contractele de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectele care prevăd asigurarea accesului îmbunătățit la servicii de apă potabilă și canalizare în localitățile din raionul Leova, cu finanțare din fondurile UE   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
4. <a href="#">Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul ADR Sud s-a întrunit în sedință   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud</a>
5. <a href="#">Membrii Comitetului Director Local al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova” au evaluat activitățile desfășurate și au trasat sarcini de viitor   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
6. <a href="#">Membrii CDL al proiectului ”Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în localitățile din raionul Leova”, s-au întrunit în cea de-a treia ședință   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
7. <a href="#">Comitetul Director Local al proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Leova” a bifat rezultatele obținute pe parcursul anului 2018   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
8. <a href="#">Ședință de lucru cu APL-urile beneficiare ale proiectelor finanțate în Regiunea de Dezvoltare Sud de Uniunea Europeană   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
9. <a href="#">Recepția serviciilor de proiectare în domeniul AAC din r-nul Leova   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
10. <a href="#">ANUNTURI DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
11. <a href="#">ANUNT de participare la LICITAȚIA PUBLICĂ privind Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>
12. <a href="#">ANUNT! Licitație INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”   Noutăți   Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);</a>

13. [A avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul concursului privind achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, implementate în Regiunea Sud | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
14. [A avut loc deschiderea ofertelor în cadrul licitațiilor publice internaționale privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” și “Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova”, cu finanțare din sursele Uniunii Europene | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
15. [Ziua Europei — prilej de promovare a proiectelor investitoriale implementate de ADR Sud cu suportul partenerilor europeni | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud;](#)
16. [Uniunea Europeană va investi circa 11 milioane de euro pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectelor de infrastructură și eficientă energetică, în Regiunea de Dezvoltare Sud | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
17. [Noi contracte de antrepriză, supraveghere tehnică și drept de autor, în valoare de peste 90 de milioane lei, au fost semnate în vederea îmbunătățirii, cu suportul Uniunii Europene, a serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
18. [Cu suportul Uniunii Europene, locuitorii din Regiunea de Dezvoltare Sud vor beneficia de proiecte de eficiență energetică și de servicii calitative de aprovizionare cu apă și canalizare în valoare de peste 211 milioane lei | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\)](#)
19. [Ședință de lucru cu beneficiarii proiectelor implementate în raionul Leova cu suportul Uniunii Europene | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
20. [Proiectele europene unesc comunitățile din raionul Leova și responsabilizează cetățenii | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)  
[Sisteme de alimentare cu apă îmbunătățite, cu suportul UE, în localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
21. [Peste 12000 de cetățeni din localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui ale raionului Leova vor beneficia de servicii de apă îmbunătățite | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
22. [Eveniment de inaugurarea proiectelor „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Filipeni, Romanovca, Cupcui și Iargara din raionul Leova” și „ Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova ” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
23. [ADR Sud a desfășurat o ședință de lucru cu beneficiarii proiectelor europene din raioanele Leova și Basarabeasca. La ordinea zilei - onorarea angajamentelor financiare de achitare a contribuțiilor | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud;](#)

## 10. LECȚII ÎNVĂȚATE ȘI BUNELE PRACTICI IMPLEMENTATE

1. Bunurile create în cadrul proiectului vor fi transmise în gestiune S.A. Apă Canal Leova, care va fi responsabil de integritatea și buna funcționare a lor.
2. Beneficiarii, care se vor conecta la rețelele de apeduct vor semna contracte de prestare a serviciilor și vor achita plățile în conformitate cu tarifele aprobate de către consiliul orașenesc.
3. Unul din rezultatele proiectului va fi buna practică în domeniul gestionării apei potabile, care va asigura o dezvoltare la nivel regional, ce vor fi luate în considerație de către Ministerul Mediului din Republica Moldova și va contribui la dezvoltarea cadrului instituțional național din acest domeniu. Astfel de practici la nivel local sunt foarte puține la momentul actual și ar fi o bună oportunitate pentru extinderea acestei practici spre alte domenii.
4. Partenerii din proiect vor organiza mai multe întâlniri la etapa de implementare și de asigurare a durabilității proiectului, ceea ce va avea impact pentru o mai bună cunoaștere între actorii regionali, identificarea celor mai favorabile metode de comunicare și colaborare, identificarea noilor oportunități de dezvoltare.
5. În acest sens se va consolida cooperarea regională și se vor crea structuri informale între participanți. La momentul elaborării propunerii de proiect, participanții au semnat acorduri de colaborare pentru dezvoltarea regiunii

## 11. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUAREA EX-POST

1. Obținerea din partea MIDR a 5 Acte de predare-primire aprobat;
2. Monitorizarea obținerii din partea APL I Iargara a Deciziei de preluarea a costurilor investiționale formate și a Planului de asigurare a durabilității;
3. Examinarea realizării acțiunilor expuse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul orașenesc Iargara;
4. Monitorizarea obținerii din partea APL I Filipeni a Deciziei de preluarea a costurilor investiționale formate și a Planului de asigurare a durabilității;
5. Examinarea realizării acțiunilor expuse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul sătesc Filipeni;
6. Monitorizarea obținerii din partea APL I Cupcui a Deciziei de preluarea a costurilor investiționale formate și a Planului de asigurare a durabilității;
7. Examinarea realizării acțiunilor expuse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul sătesc Cupcui;
8. Monitorizarea obținerii din partea APL II Leova a Deciziei de preluarea a costurilor investiționale formate și a Planului de asigurare a durabilității;
9. Examinarea realizării acțiunilor expuse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul raional Leova;
10. Monitorizarea obținerii din partea APL I Romanovca a Deciziei de preluarea a costurilor investiționale formate și a Planului de asigurare a durabilității;
11. Examinarea realizării acțiunilor expuse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul sătesc Romanovca;


Director ADR SUD

  
(semnătura)

**Ion PÎNZARI**

(numele, prenumele)


Contabil - Șef

  
(semnătura)

**Olga DIACONU**

(numele, prenumele)

Șef SMIP

  
(semnătura)

**Andrei POPUȘOI**

(numele, prenumele)

”14” noiembrie 2022




### Instrucțiuni de completare:

1. Raportul final a implementării reprezintă o sintetizează informația referitoare la progresul în implementarea proiectului și rezultatele atinse.
2. Raportul prevede reflectarea setului de indicatori de produs și rezultat, din perspectiva țintelor propuse și a rezultatelor atinse, respectarea planului de implementare, gradul de valorificare a bugetului și cofinanțarea asigurată.
3. Elaborarea și prezentarea raportului este asigurată de către specialistul desemnat al SMIP, în conformitate cu cerințele Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare regională, aprobată prin ordinul MIDR (în vigoare Ordinul MADRM nr.149 din 23.07.2021)


R A P O R T F I N A L

al proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”




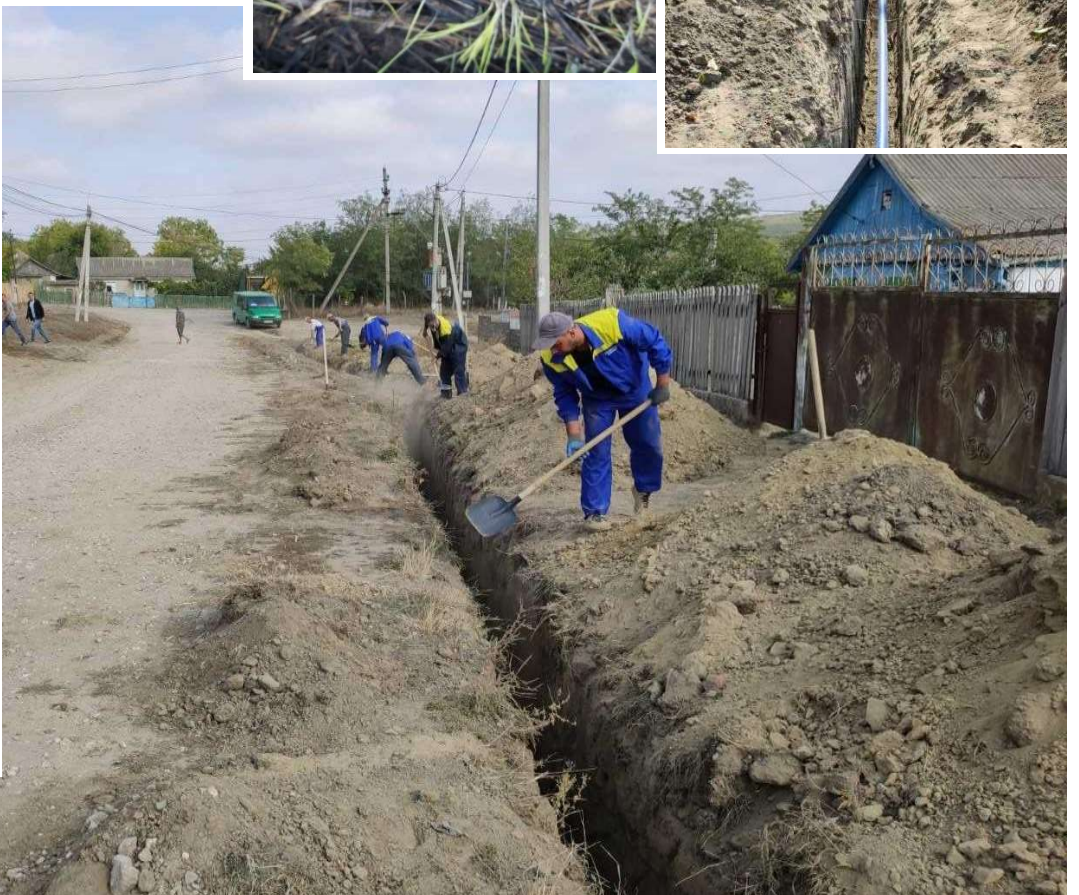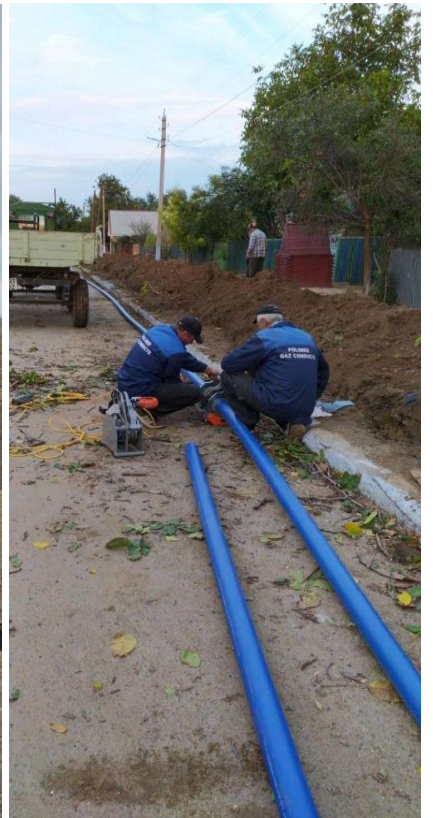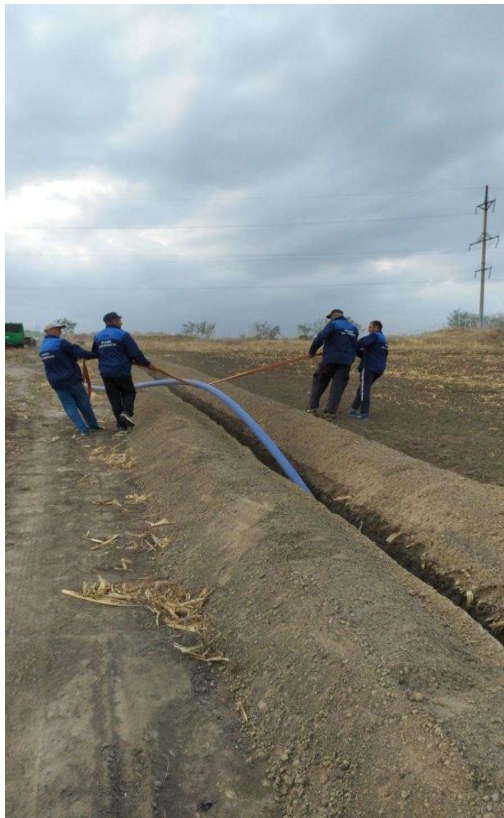




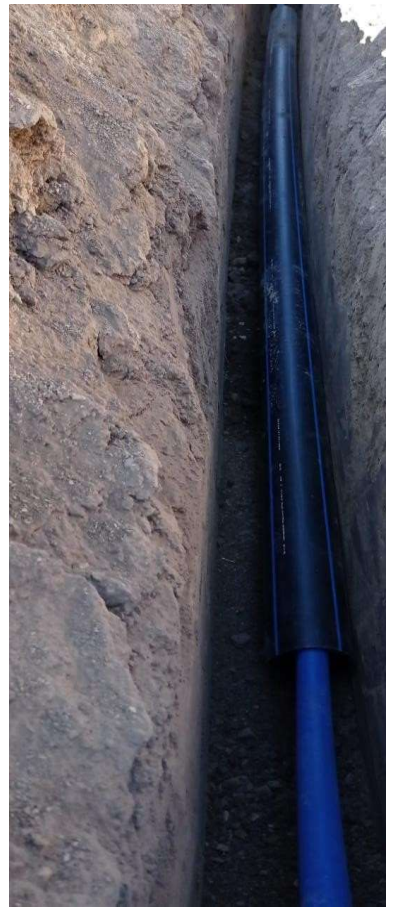



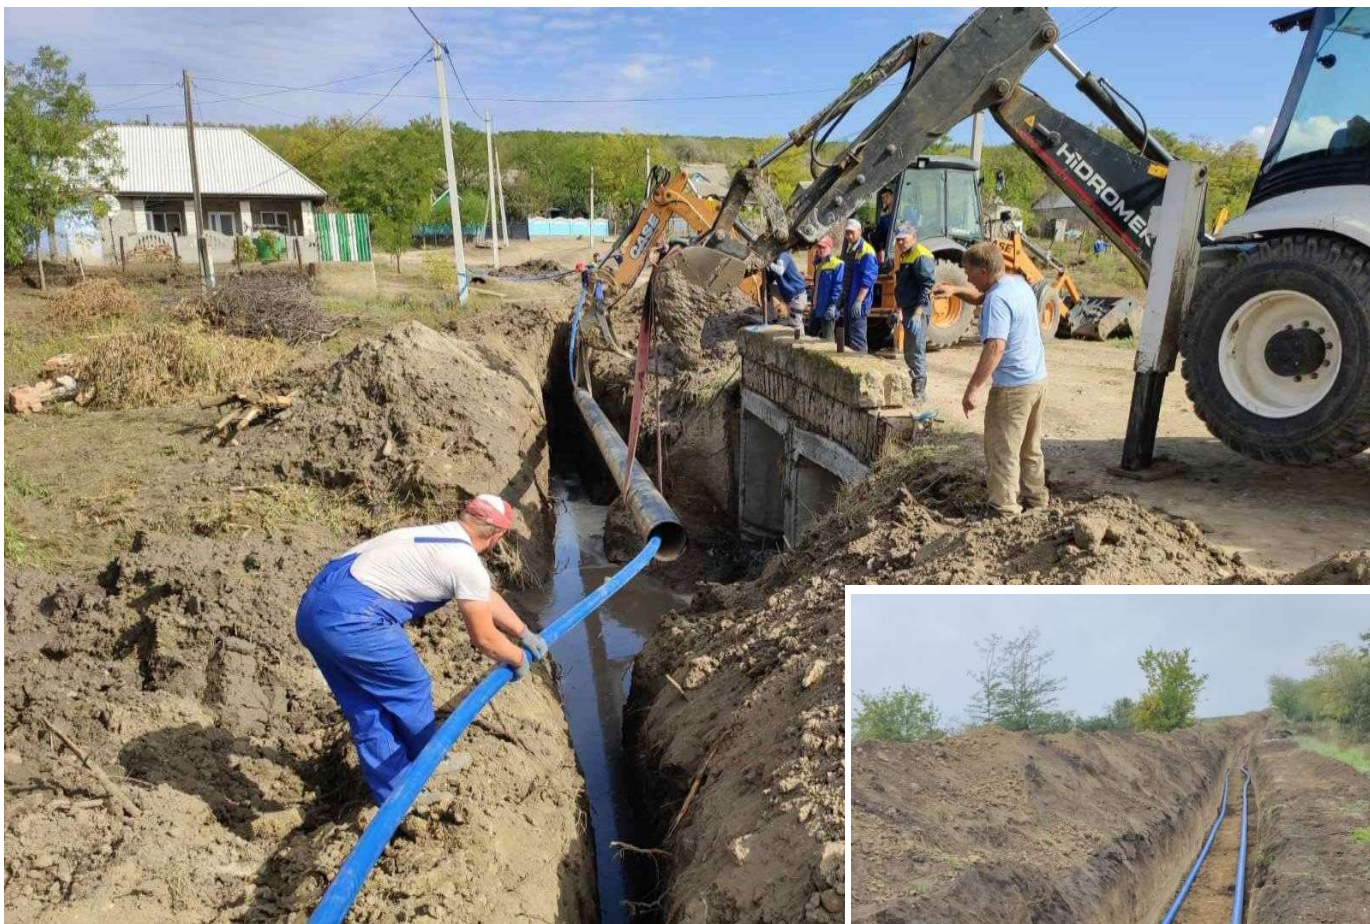



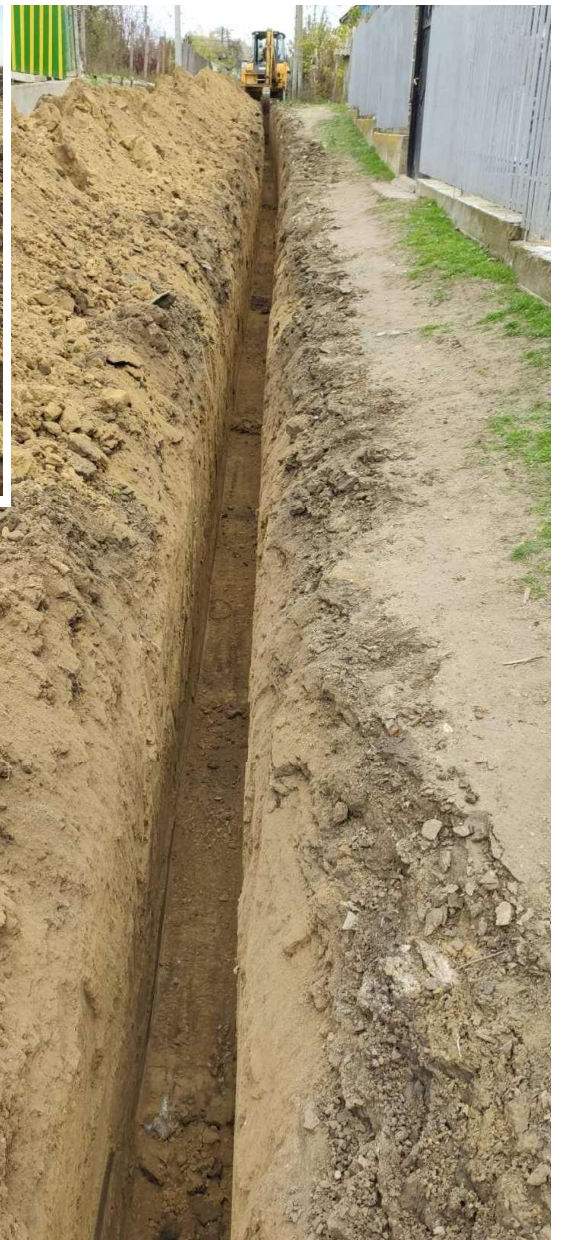













RAPORT FINAL

al proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova"




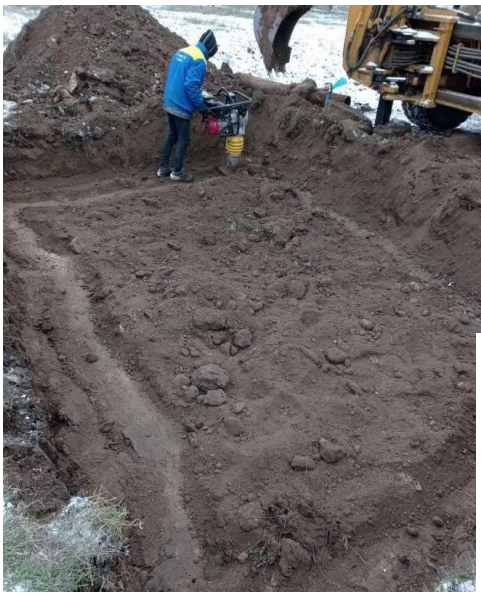



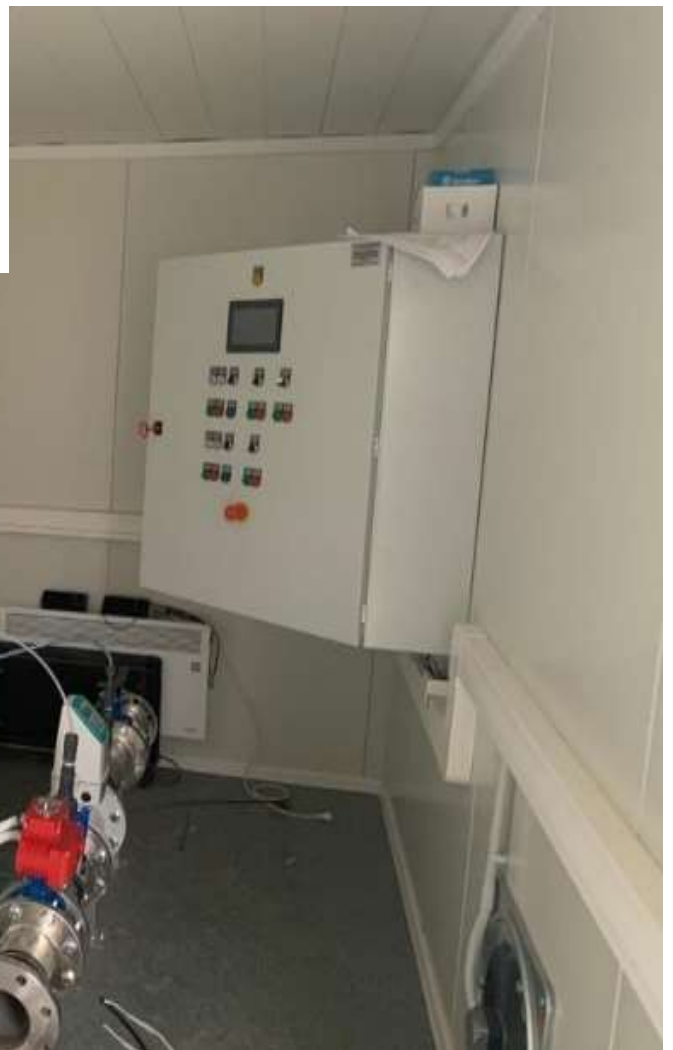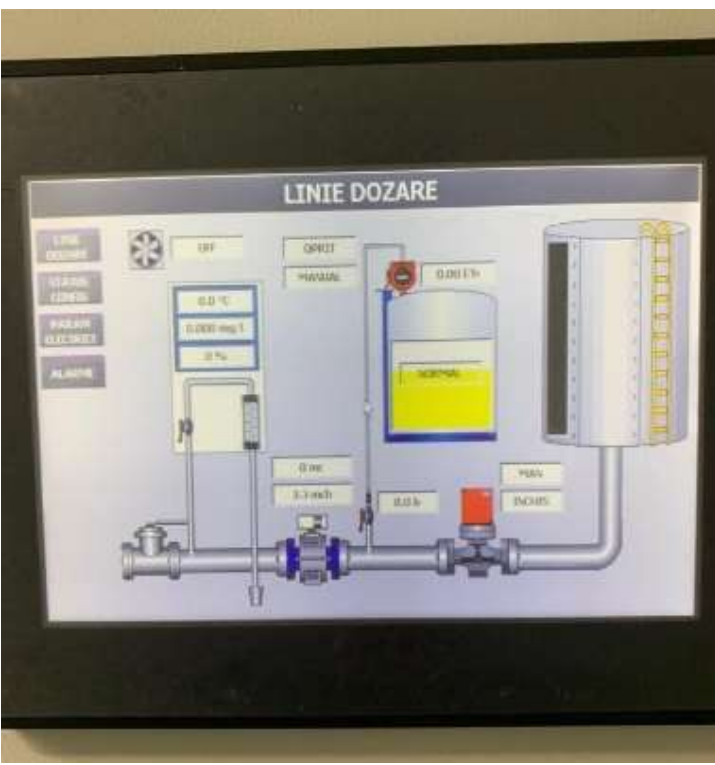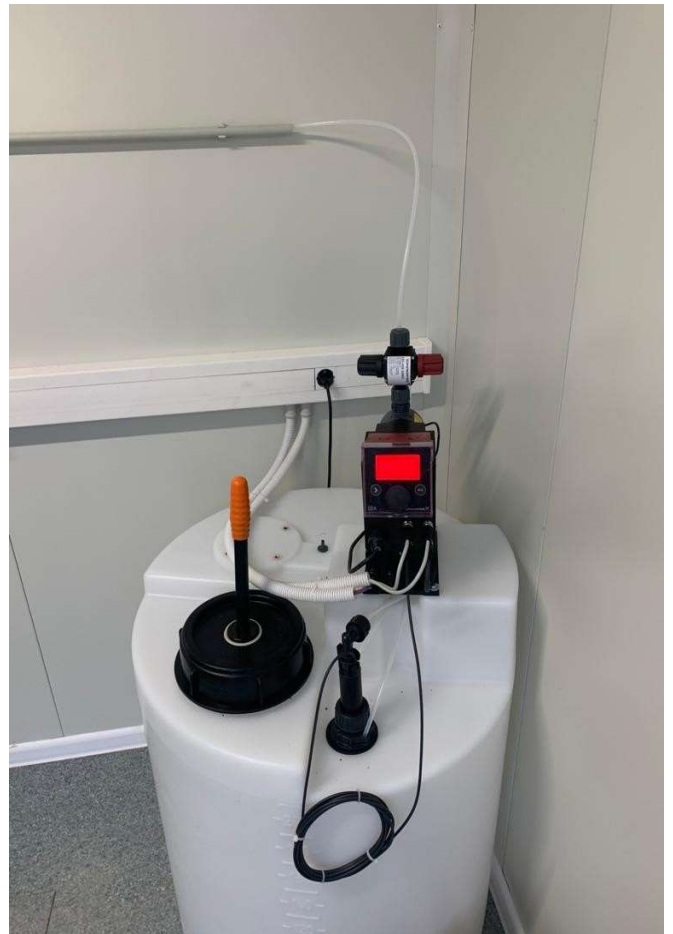



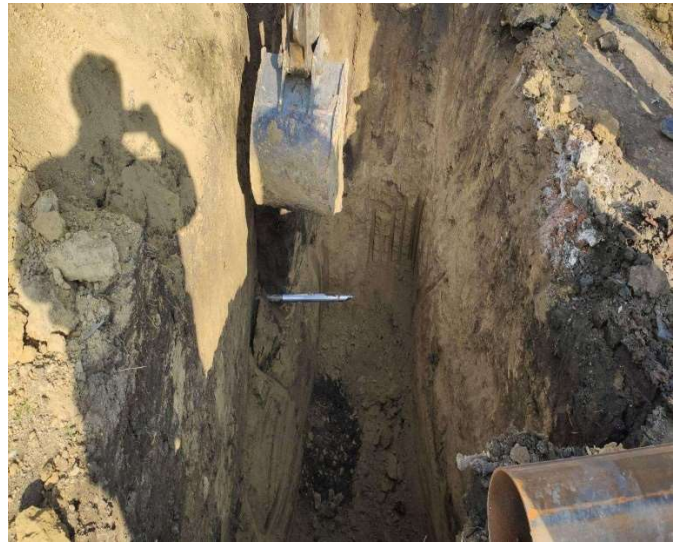








SCADA

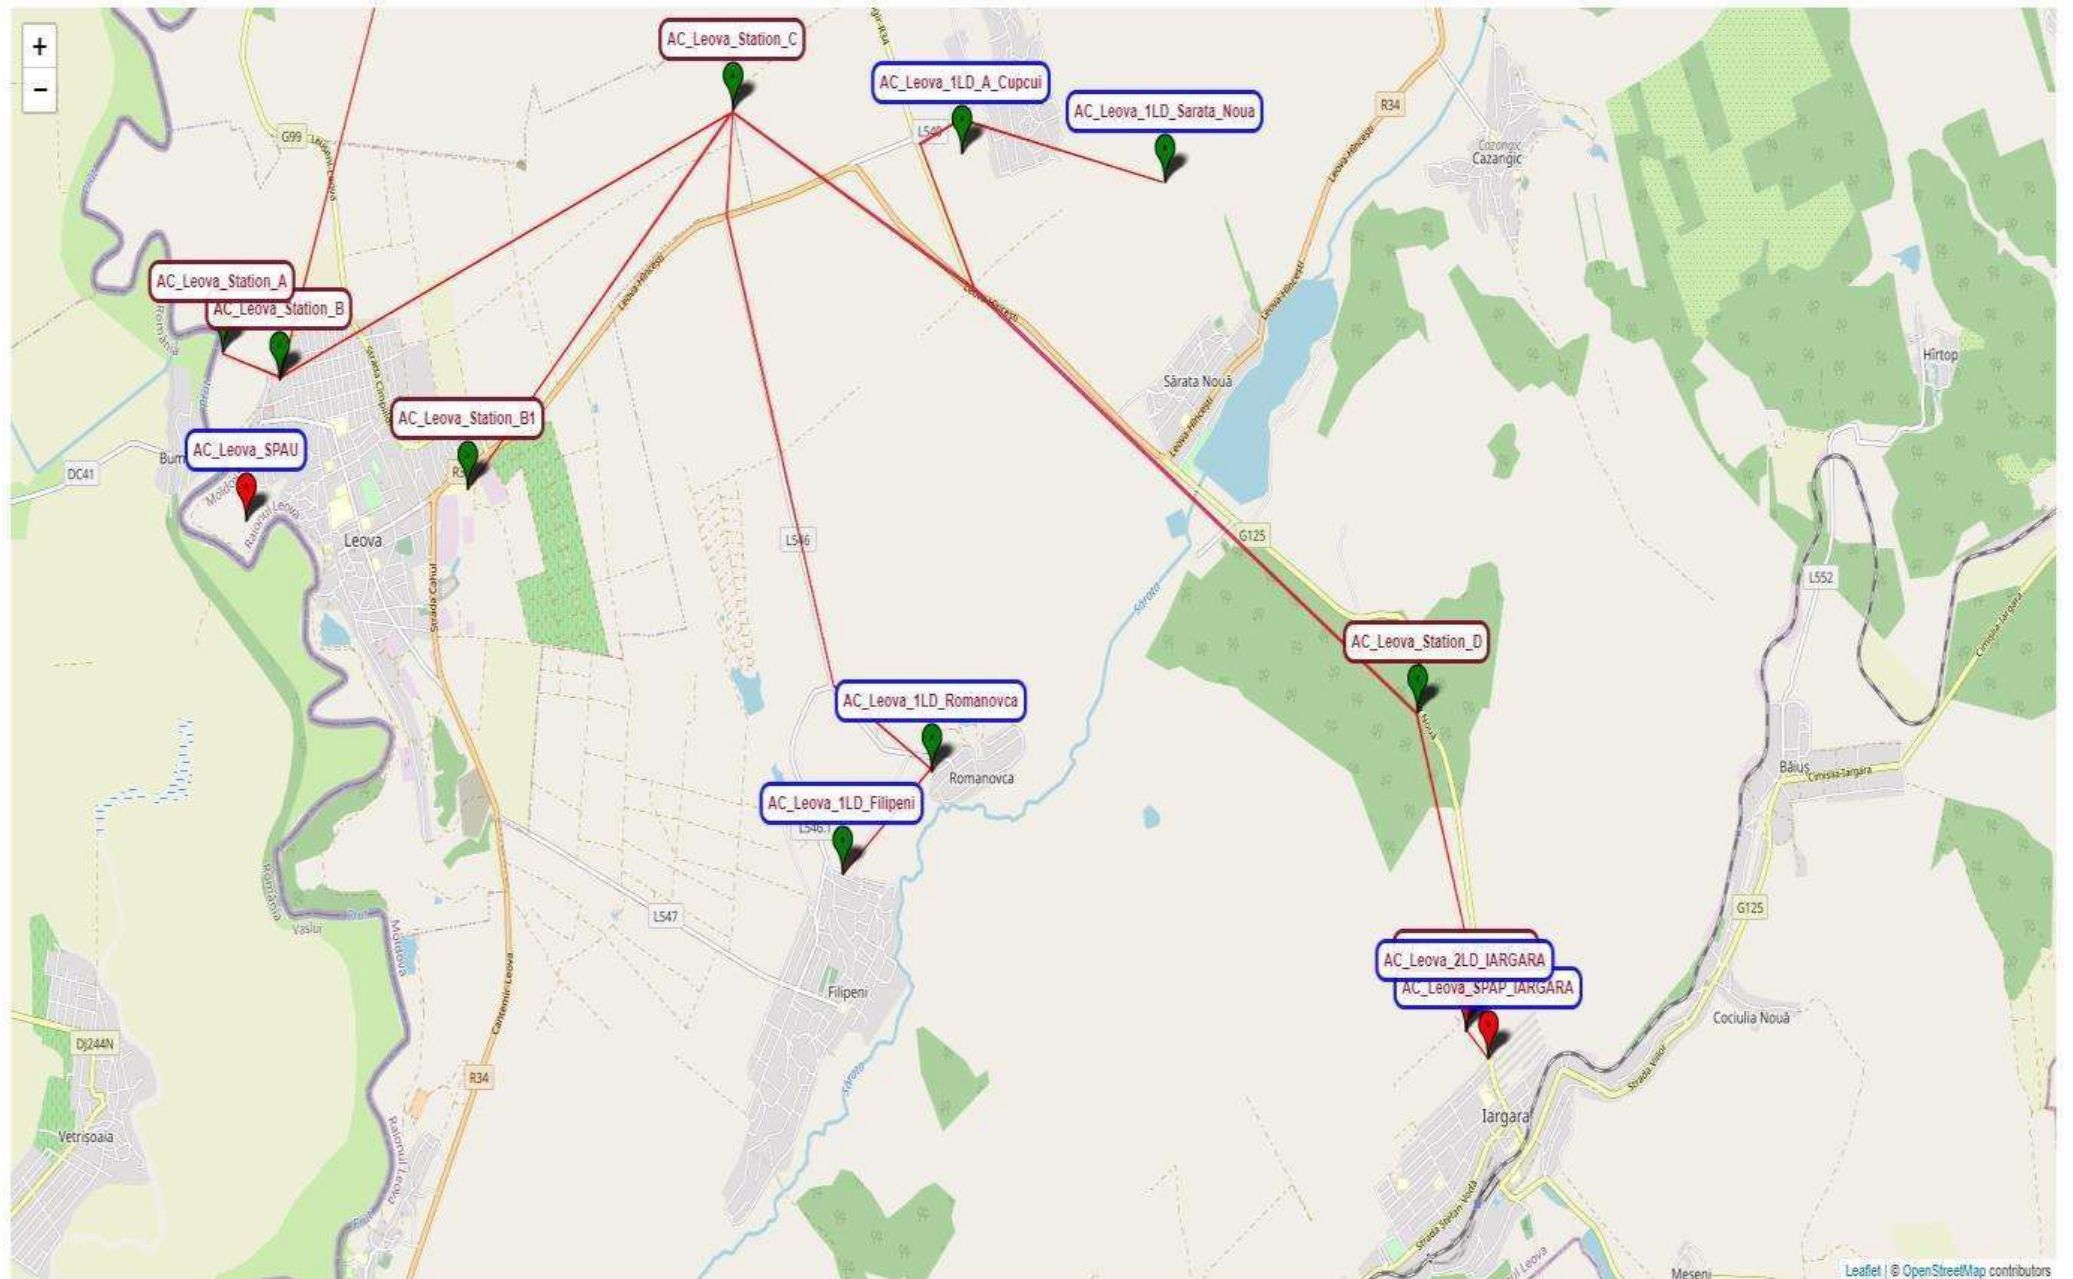

RAPORT FINAL  
al proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova"
