

RAPORTUL FINAL A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

S 2005: Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova.

ETAPA I (Sîrma și Tochile-Răducani)

(codul și titlul proiectului)

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

(agenția)

1. INFORMAȚIE GENERALĂ

Localizarea proiectului	Raionul Leova, localitățile Sîrma și Tochile-Răducani
Denumirea programului	Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare
Domeniul de intervenție	Aprovizionare cu apă și canalizare
Obiectivele proiectului	<p>Obiective generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea accesului la sursa sigură de aprovizionare cu apă potabilă a populației din localitățile Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai - Dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Leova <p>Obiective specifice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea serviciului calitativ de aprovizionare cu apă prin cooperarea regională; - Construcția rețelelor interioare de apeduct în localitățile Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai pe o porțiune de 46,2 km; - Furnizarea apei potabile conform standardelor naționale și a directivei DWD 2000/60/CE privind apa potabilă; - Reducerea riscurilor igienico-sanitare prin conectarea la o sursă certificată de apă; - Consolidarea capacităților de management ale operatorului regional și a primăriilor; - Extinderea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a operatorului regional prin conectarea rețelelor de apeduct interioare a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai la apeductul magistral Leova-largara.
Aplicant	Primăria Tomai
Partenerii	Primăria Sîrma; Primăria Tochile-Răducani.
Grupuri-țintă	Primăria Sîrma, Primăria Tochile-Răducani, Primăria Tomai.
Beneficiari finali	2490 populație cu acces la sistemul îmbunătățit de aprovizionare cu apă din localitățile Sîrma și Tochile-Răducani
Durata totală a proiectului	36 luni.
Perioada efectivă de implementare	5 luni.
Bugetul conceput al proiectului	25.128.920,00 lei.
Valoarea bugetară totală alocată	19.920.909,73 lei.
Valoarea bugetară totală executată	19.920.909,73 lei.
Sursele de finanțare și bugetele valorificate	1. FNDR - 19.920.909,73 lei.
Costurile transmise către beneficiar	1. Sîrma – Act nr. 32 din 13.01.2022 în valoare 9.442.942,68 lei; 2. Tochile-Răducani – Act nr. 33 din 13.01.2022 în valoare 10.477.967,05 lei.

2. FINANȚAREA PROIECTULUI

Proiectul „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova” a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în anul 2016, în cadrul celui al treilea apel de propuneri de proiecte, prin HG Nr. 203 din 29 martie 2017 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program (DUP) pentru anii 2017-2020 și ulterior prin Decizia Consiliului Național pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale (CNCDR) cu nr. 14/20 din 13.02.2020 a fost aprobat spre finanțare.

Finanțarea proiectului din sursele Fondului național pentru dezvoltare regională.				
Nr. ord.	Decizia CNCDR	Mijloace financiare, MDL		
		Aprobate	Redistribuit	Valo-ificat
1.	nr. 14/20 din 13.02.2020	6.227.500,00	-	-
2.	nr. 23/20 din 04.08.2020	-	6.227.500,00	-
3.	nr. 25/20 din 17.11.2020	-	0,00	-
4.	nr. 04/21 din 28.01.2021	19.947.691,93	-	19.920.909,73
5.	nr. 16/21 din 10.12.2021	-	19.920.909,73	-

3. ACHIZIȚII PUBLICE

Contract	Lucrări construcție - montaj (LCM)
9/L/20 din 24.12.2020	În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1598374099482 din 17.09.2020, publicată la 25.08.2020, ora 19:52, prin intermediul M-Tender privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova. ETAPA I (Sîrma și Tochile-Răducani)”, de către grupul de lucru pentru achiziții publice a fost desemnat câștigător SRL „Polimer Gaz Conducte”, cu valoarea ofertei de 19.753.271,89 MDL , inclusiv TVA, cu perioada de realizare a lucrărilor de 5 luni calendaristice

RAPORT FINAL

<p><u>AA nr. 1 din 02.03.2021</u> <u>la Contractul 9/L/20 din</u> <u>24.12.2020.</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – conform modificărilor legislative, și anume art. XIII, pct. 9 din Legea nr. 257 din 16.12.2020 prin care se modifică Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr. 60 din 23.04.2020 prin care este exclus pct. 1 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărirea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 01.01.2021, la bugetarea și contabilizarea lucrărilor executate de către antreprenori din sectorul privat, se aplică un tarif de 24% al contribuțiilor de stat obligatorii la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea execuției de lucrări sau prestării de servicii, astfel valoarea acestora constituie suma de 34.369,19 MDL. Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de 19.787.641,0€ MDL, inclusiv TVA.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contracte	Servicii de supraveghere tehnică (RT)
<p>08/S/20 din 10.11.2020</p>	<p>Serviciile privind supravegherea tehnică a obiectului au fost achiziționate în urma desfășurării concursului prin COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1599821196146 din 25.09.2020, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice prin intermediul M-Tender la 11.09.2020, ora 13:52 organizată de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Contractul de achiziționare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor a fost atribuit prestatorului SRL "Favor Proiect" cu oferta de 146.999,00 MDL, ceea ce constituie 0,79 % din valoarea estimată a lucrărilor.</p>
<p><u>AA nr. 1 din 21.10.2021</u> <u>la Contractul 08/S/20</u> <u>din 10.11.2020.</u></p>	<p><u>Micșorarea valorii contractului</u> – circumstanțe care au generat prezenta modificarea țin de efectuarea recalculelor în baza Legii nr. 178 din 26.07.2018 a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii ce au fost operate pe parcursul executării Contractului de antrepriză, astfel valoarea acestora constituie suma de 16.730,36 MDL. Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de 130.268,64 MDL, inclusiv TVA.</p>

Contracte	Alte cheltuieli
<p>14/B/21 din 12.02.2021</p>	<p>Pentru promovarea zonei și informarea beneficiarilor privind realizarea obiectivului proiectului a fost achiziționat panoul informativ, fiind cheltuite din sursele FNDR suma de 3.000,00 MDL, inclusiv TVA conform facturii IY 3437075 dir 20.04.2021.</p>

4. INDICATORII ATINȘI

Descrierea indicatorului		Unitatea de măsură	Valoarea inițială	Ținta finală	Progres atins	Abateri	Comentarii
Cod	Denumirea						
1	2	3	4	5	6	7	8
Indicatori de rezultat:							
204	Rețele de apeduct date în exploatare	Km	0	32,69	35,69	+ 3,0	Surplusul de rețea a fost asigurat din contul antreprenorului cu beneficiarul final
206a	Instalații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu	Nr	0	2	2	-	- Sîrma - Tochile-Răducani
208	Castele de apă date în exploatare	Nr	0	2	2	-	- Tochile-Răducani
209	Rezervoare de apă potabilă date în exploatare	Nr	0	2	2	-	- Sîrma
213	Conectări la apeduct îmbunătățit	Nr	0	805	805	-	- 355 în s. Sîrma - 450 în s. Tochile-Răducani
Indicatori de produs:							
217	Localități ce au acces la servicii îmbunătățite de AAC	Nr	0	2	2	-	- Sîrma - Tochile-Răducani
218	Populație cu acces la sistemul îmbunătățit de AAP	Nr	0	2490	2490	-	- Sîrma - Tochile-Răducani

5. ACTIVITĂȚILE REALIZATE

Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2020 de implementare												Abateri
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Examinarea Documentației de proiect	planificat	ADR Sud													Ședință de lucru cu beneficiarii (PV nr. 1 din 24.02.2020)
		realizat														
2	Aprobarea finanțării proiectului	planificat	CNCDR													Suma alocată nu a fost posibil de valorificat
		realizat														
3	Actualizarea Documentației de proiect, inclusiv Devizul de cheltuieli	planificat	APL / Compania de proiectare													Obținerea DT actualizată și a Rapoartelor de verificare a fost îngreunată de situația pandemică instituită pe teritoriul țării.
		realizat														
4	Pregătirea și semnarea	planificat	ADR Sud / APL													Instituirea stării de urgență
		realizat														

Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2020 de implementare												Abateri	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Contractul de finanțare																
5	Organizarea licitației pentru achiziționarea execuția lucrărilor de construcție:	planificat	ADR Sud / Beneficiar														1. Primirea Rapoartelor de Verificare actualizate abia în luna august a tergiversat termenul de lansare a procedurii de achiziție publice 2. În cadrul procedurii au fost depuse 6 contestații soluționarea cărora au tergiversat procedura. Notă: atribuirea contractului s-a efectuat în baza Deciziei ANSC, prin care s-a menținut ultima decizie de atribuire a GL din cadrul ADR
		realizat															
6	Semnarea contractului de lucrări.	planificat	ADR Sud / Antreprenor														Soluționarea contestațiilor de către ANSC
		realizat															
7	Organizarea licitației pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică:	planificat	ADR Sud														1. Primirea tardivă a RV actualizat 2. Au fost depuse 2 contestații Notă: atribuirea Contractului similar ca la lucrări
		realizat															
8	Semnarea contractului de servicii.	planificat	ADR Sud / RT														Soluționarea contestațiilor de către ANSC
		realizat															
Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2021 de implementare												Abateri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	Aprobarea finanțării proiectului	planificat	CNCDR														-
		realizat															
9	Emiterea ordinului de începere a lucrărilor	planificat	ADR Sud														-
		realizat															
10	Executarea lucrărilor de construcție conform cu proiectului și a contractului	planificat	Antreprenor / RT														-
		realizat															
11	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	planificat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT														Au fost consemnate unele obiecții de către membrii comisiei de recepție
		realizat															
12	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	planificat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT														-
		realizat															
Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2022 de implementare												Abateri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	planificat	ADR Sud / APL														S tuatția epidemiologică terg versează procesul de predare primire
		realizat															

Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2020 de implementare												Abateri
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Obținerea Deciziei Consiliului local privind preluarea costurilor investiționale	planificat	APL													
		realizat														
15	Obținerea Planului de asigurare a durabilității aprobat prin Decizie Consiliului local	planificat	APL													
		realizat														

6. BUGETUL PROIECTULUI

6.1 Bugetul după activități

Nr. crt	Activități	Valoarea totală bugetară, lei	Valoarea executată a bugetului, lei	Cofinanțarea, lei	Buget debursat în anul A-2021, lei			Abateri
					IV	VI	VIII	
1	2	3	4	5	- 9 -	- 11 -	- 13 -	18
1. Lucrări de construcție		19.787.641,09	19.787.641,09		2.775.248,68	6.650.755,93	10.361.636,48	
1.1 Aprovizionarea cu apă potabilă localitatea Sîrma.		9.379.693,03	9.379.693,03		594.841,50	3.033.685,05	5.751.166,48	
1.1.1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier.	52.920,00	52.920,00				52.920,00	
1.1.2	Rețele exterioare de distribuție a apei.	2.771.423,81	2.771.423,81		587.530,99	687.583,75	1.496.309,07	
1.1.3	Rețele exterioare de distribuție a apei (bransamente).	3.049.257,62	3.049.257,62			1.143.786,71	1.905.470,92	
1.1.4	Rezervor metalic V=50m3. (2buc). LCM.	130.876,47	130.876,47		7.310,51	109.354,59	14.211,37	
1.1.5	Rezervor suprateran de apa V=50m3 (2buc). TH.	339.471,07	339.471,07				339.471,07	
1.1.6	Rezervor suprateran metalic de apa V=50m3 (2buc). Utilaj.	1.092.960,00	1.092.960,00			1.092.960,00		
1.1.7	Stația de dezinfectare a apei. LCM.	32.413,91	32.413,91				32.413,91	
1.1.8	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH.	692.557,19	692.557,19				692.557,19	
1.1.9	AEE. LCM.	547.586,30	547.586,30				547.586,30	
1.1.10	Amenajarea teritoriului.	670.226,66	670.226,66				670.226,66	
1.2 Aprovizionarea cu apă potabilă a localitatea Tochile-Răducani		10.407.948,06	10.407.948,06		2.180.407,18	3.617.070,88	4.610.470,00	
1.2.1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier.	52.680,00	52.680,00				52.680,00	
1.2.2	Rețele exterioare de distribuție a apei.	3.787.570,97	3.787.570,97		1.153.057,80	1.068.607,39	1.565.905,78	
1.2.3	Rețele exterioare de distribuție a apei (bransamente).	3.761.199,16	3.761.199,16			2.524.558,37	1.236.640,79	
1.2.4	Castel de apa V=50m3, H=18m (2buc).	1.331.142,77	1.331.142,77		1.027.349,38		303.793,39	
1.2.5	Stația de dezinfectare a apei. LCM.	31.597,97	31.597,97			23.905,12	7.692,87	
1.2.6	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH.	622.164,23	622.164,23				622.164,23	
1.2.7	AEE. LCM.	105.457,41	105.457,41				105.457,41	
1.2.8	Amenajarea teritoriului.	716.135,55	716.135,55				716.135,55	
2. Servicii		133.268,64	133.268,64		21.270,39	43.784,14	68.214,11	
2.1	Supraveghere tehnică	130.268,64	130.268,64		18.270,39	43.784,14	68.214,11	
2.2	Panou informativ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	-	-	
Total costuri ale proiectului		19.920.909,73	19.920.909,73		2.795.519,07	6.694.540,07	10.429.850,59	

6.2 Bugetul după categorii și surse

Structura bugetară pe surse de finanțare	Mijloace financiare, lei							
	Aprobate		Contractate		Facturate		Debursate la ADR	
	Total	incl. A-2021	Total	incl. A-2021	Total	incl. A-2021	Total	incl. A-2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Lucrări, inclusiv din surse:	19.787.641,08	+ 0,01	19.753.271,89	+ 34.369,19	19.787.641,09	19.787.641,09	19.787.641,09	19.787.641,09
1.1 (FNDR)	19.787.641,08	+0,01	19.753.271,89	+ 34.369,19	19.787.641,09	19.787.641,09	19.787.641,09	19.787.641,09
2. Servicii, inclusiv din surse:	156.322,37	- 26.053,73	146.999,00	- 16.730,36	130.268,64	130.268,64	130.268,64	130.268,64

RAPORT FINAL

al proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova" ETAPA I (Sîrma și Tochile-Răducani)

2.1 (FNDR)	156.322,37	- 26.053,73	146.999,00	- 16.730,36	130.268,64	130.268,64	130.268,64	130.268,64
3. Altele, inclusiv din surse:	3.728,48	- 728,48	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1 (FNDR)	3.728,48	- 728,48	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sumar pe proiect, inclusiv din surse:	19.947.691,93	- 26.782,20	19.903.270,89	+ 17.638,83	19.920.909,73	19.920.909,73	19.920.909,73	19.920.909,73
(FNDR)	19.947.691,93	- 26.782,20	19.903.270,89	+ 17.638,83	19.920.909,73	19.920.909,73	19.920.909,73	19.920.909,73

6.2 Bugetul după categorii și surse (continuare)

Structura bugetară pe surse de finanțare	Cheltuieli efectuate în anul de gestiune A-2021, lei													Sold, lei la sfârșitul perioadei de raportare față de mărimea finanțării aprobate pentru anul de gestiune	
	Total		inclusiv pe luni												
	Total	incl. A-2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		XII
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Lucrări, inclusiv din surse:	19.787.641,09	19.787.641,09				2.775.248,68		6.650.755,93		10.361.636,48					0,00
1.1 (FNDR)	19.787.641,09	19.787.641,09				2.775.248,68		6.650.755,93		10.361.636,48					0,00
2. Servicii, inclusiv din surse:	130.268,64	130.268,64				18.270,39		43.784,14		68.214,11					0,00
2.1 (FNDR)	130.268,64	130.268,64				18.270,39		43.784,14		68.214,11					0,00
3. Altele, inclusiv din surse:	3.000,00	3.000,00				3.000,00		-		-					0,00
3.1 (FNDR)	3.000,00	3.000,00				3.000,00		-		-					0,00
Sumar pe proiect, inclusiv din surse:	19.920.909,73	19.920.909,73				2.796.519,07		6.694.540,07		10.429.850,59					0,00
(FNDR)	19.920.909,73	19.920.909,73				2.796.519,07		6.694.540,07		10.429.850,59					0,00

7. RISCURI ȘI CONSTRÎNGERI ÎNTÎMPINATE

Descrierea riscului	Categoria riscului	Măsuri întreprinse	Impactul asupra proiectului
1	2	3	4
Deficiențele în documentația tehnică elaborată de către proiectant ar putea influența negativ calitatea, costul și durata de implementare a proiectului	Operațional	Au fost organizate mai multe ședințe de lucru cu beneficiarii, în rezultat a fost agreată re-proiectarea documentației tehnice (DT)	Proiectul a fost executat conform normativelor în vigoare, fără depășirea costurilor și a duratei de implementare a proiectului
Lipsa ofertelor calitative din partea operatorilor economici poate duce la depășirea termenului planificat pentru achiziții	Operațional	Au fost reevaluate de mai multe ori ofertele prezentate în cadrul licitației	Calitatea ofertei oferă calitatea lucrărilor executate
Insuficiența fondurilor locale pot împiedica punerea în aplicare eficientă a lucrărilor de extindere și conectare a rețelei de alimentare cu apă	Financiar	Au fost alocate mijloace suplimentare din partea beneficiarilor	Proiectul este sustenabil, astfel asigurând conectarea tuturor gospodăriilor
Nerespectarea calendarului agreat de lucrări și servicii de către contractant poate tergiversa finalizarea cu succes a măsurilor de infrastructură	Operațional	Reieșind că plasarea comenzii echipamentului a fost efectuată după semnarea contractului și totodată situația epidemiologică instituită, Ordinul de începere a fost emis în luna martie cu termenul de începere din luna aprilie.	Materialele și utilajele integrale au fost plasate la obiect.

8. ASIGURAREA DURABILITĂȚII PROIECTULUI

Darea în exploatarea/transmiterea bunului serviciului către beneficiar	Data	Comentarii
1	2	3
Proces verbal nr. 01 de recepție la terminarea lucrărilor (Sîrma) Proces verbal nr. 01 de recepție la terminarea lucrărilor (Tochile-Răducani)	26 octombrie 2021	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție: - Finalizarea lucrărilor de amenajare a platformei
Proces verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor nr. 3-1469/21 (Sîrma și Tochile-Răducani)	30 noiembrie 2021	În urma efectuării controlului volumelor și costurilor lucrărilor prin măsurări instrumentale a lucrărilor executate de facto și compararea cu datele documente or de execuție a lucrărilor exagerate n-au fost constatate.
Proces verbal nr. 02 de recepție finală (Sîrma) Proces verbal nr. 02 de recepție finală (Tochile-Răducani)	16 decembrie 2021	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție: - nu au fost consemnate.
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 32	13 ianuarie 2022	- Decizia de preluare a costurilor investiționale formate aprobat de către Consiliul local Sîrma. - Plan de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul local Sîrma.

Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 33	13 ianuarie 2022	- Decizia de preluare a costurilor investiționale formate aprobat de către Consiliul local Tochile-Răducani. - Plan de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul local Tochile-Răducani.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualitatea Planului de asigurare a durabilității	Actualizat / În proces de Actualizare	Perioada	Responsabil
1	2	3	4
Elaborat în anul 2017	În proces	Februarie - Martie	APL Sîrma APL Tochile-Răducani

9. ASIGURAREA VIZIBILITĂȚII PROIECTULUI

<ol style="list-style-type: none"> http://adsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4269&t=/PresaNoutati/Din-200-de-milioane-de-lei-alocati-in-anul-2020-pentru-proiecte-de-dezvoltare-regionala-circa-39-de-milioane-vor-fi-investite-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud/ http://adsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4279&t=/PresaNoutati/Beneficiarii-i-actorii-implicati-in-procesul-de-implementare-a-proiectului-Aprovizionarea-cu-apa-potabila-a-localitatilor-Sirma-Tochile-Raducani-i-Tomai-din-raionul-Leova-informati-despre-suma-alocata-din-Fondul-National-de-Dezvoltare-Regionala-apr/ http://adsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4421&t=/PresaNoutati/edinta-de-lucru-in-cadrul-proiectului-Aprovizionarea-cu-apa-potabila-a-localitatilor-Sirma-Tochile-Raducani-i-Tomai-din-raionul-Leova-finatat-din-Fondul-National-de-Dezvoltare-Regionala/ http://adsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4539&t=/PresaNoutati/Gratie-unui-proiect-de-dezvoltare-regionala-circa-6400-de-cetateni-din-localitatile-Sirma-Tochile-Raducani-i-Tomai-din-raionul-Leova-vor-capata-acces-la-o-sursa-sigura-de-aprovizionare-cu-apa-potabila/ http://adsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4575&t=/PresaNoutati/Circa-6400-de-cetateni-din-localitatile-Sirma-Tochile-Raducani-i-Tomai-din-raionul-Leova-vor-avea-acces-la-o-sursa-sigura-de-aprovizionare-cu-apa-Recent-au-inceput-lucrarile-de-construcție-a-rețelelor-interioare-de-apeduct/ http://adsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4621&t=/PresaNoutati/Ministrul-MADRM-Ion-Perju-cu-Secretarul-de-Stat-Ghenadie-Lurco-au-efectuat-vizite-de-monitorizare-a-3-proiecte-in-proces-de-implementare-de-catre-ADR-Sud-din-raionul-Leova/ http://adsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4641&t=/PresaNoutati/Sunt-in-plina-desfășurare-lucrarile-de-construcție-a-rețelelor-interioare-de-apeduct-in-localitatile-Sirma-i-Tochile-Raducani-din-raionul-Leova/ http://adsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4710&t=/PresaNoutati/Consiliul-Regional-pentru-Dezvoltare-Sud-s-a-reunit-in-edinta-ordinara/

10. LECȚII ÎNVĂȚATE ȘI BUNELE PRACTICI IMPLEMENTATE

- Alimentarea populației cu apă potabilă va avea ca efect eminent creșterea indicilor de sănătate și speranță de viață mai mare a populației, deoarece reprezintă un indicator de impact, ce urmează a fi produs de rezultatele proiectului într-o durată mai lungă de timp;
- Conform prevederilor Studiului de Fezabilitate privind Aprovizionarea cu Apă și Canalizare a raionului Leova și a opțiunii selectate proiectul dat reprezintă a doua etapă de creare a apeductului regional din raionul Leova, urmând ca proiectul dat să fie multiplicat pe cel puțin încă 20 de localități;
- Regionalizarea serviciului de aprovizionare cu apă va duce la minimizarea costurilor de operare și la creșterea calității serviciului ceea ce va servi ca model de implementare a proiectelor în domeniu pentru alte localități ale regiunii;
- Creșterea competitivității locale și regionale cu peste 20% (din indicatorii agregați descriși în Strategia privind aprovizionare cu apă și canalizare a localităților din republica Moldova);
- Diminuarea costurilor de aprovizionare cu apă pentru localitățile din apropierea r. Prut în mediu peste 20% (din indicatorii agregați de calcul folosiți în Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizarea localităților din Republica Moldova);
- Creșterea traficului de marfă și a producției rurale și orășenești raionale și regionale cu mediu 20 % până în 2023, iar în perspectivă până în 2030 cu 30%;
- Micșorarea coraportului aprovizionare-timp-consum-cheltuieli-întreținere până la 30 %;
- Atragerea de noi posibilități de dezvoltare a zonei datorită existenței apei de calitate;
- Diseminarea informației - Construcția apeductului va fi un model de bune practici pentru alte localități ale RDS și a R. M.;
- Facilitarea dezvoltării industriei prelucrătoare și de producere în zonă de noi tipuri de produse ce vor da posibilitatea agricultorilor și înreprinderilor să se lanseze în diferite domenii.

11. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUAREA EX-POST

- Obținerea Deciziilor Consiliilor locale privind preluarea costurilor investiționale formate;
- Examinarea realizării acțiunilor expuse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul local Tochile-Răducani;
- Examinarea realizării acțiunilor expuse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul local Sîrma;

Director interimar ADR SUD


Contabil - Șef

Șef SMIP


"01" martie 2022


(semnătura)

Ion PÎNZARI
(numele, prenumele)


(semnătura)

Olga DIACONU
(numele, prenumele)


(semnătura)

Andrei POPUȘOI
(numele, prenumele)

Instrucțiuni de completare:

- Raportul final a implementării reprezintă o sinteză a informației referitoare la progresul în implementarea proiectului și rezultatele atinse.
- Raportul prevede reflectarea setului de indicatori de produs și rezultat, din perspectiva țintelor propuse și a rezultatelor atinse, respectarea planului de implementare, gradul de valorificare a bugetului și cofinanțarea asigurată.
- Elaborarea și prezentarea raportului este asigurată de către specialistul desemnat al SMIP, în conformitate cu cerințele Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare regională, aprobată prin ordinul MIDR (în vigoare Ordinul MADRM nr.149 din 23.07.2021).

RAPORT FINAL


al proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova" ETAPA I (Sîrma și Tochile-Răducani)"

1. Situația până la și în procesul de implementarea proiectului







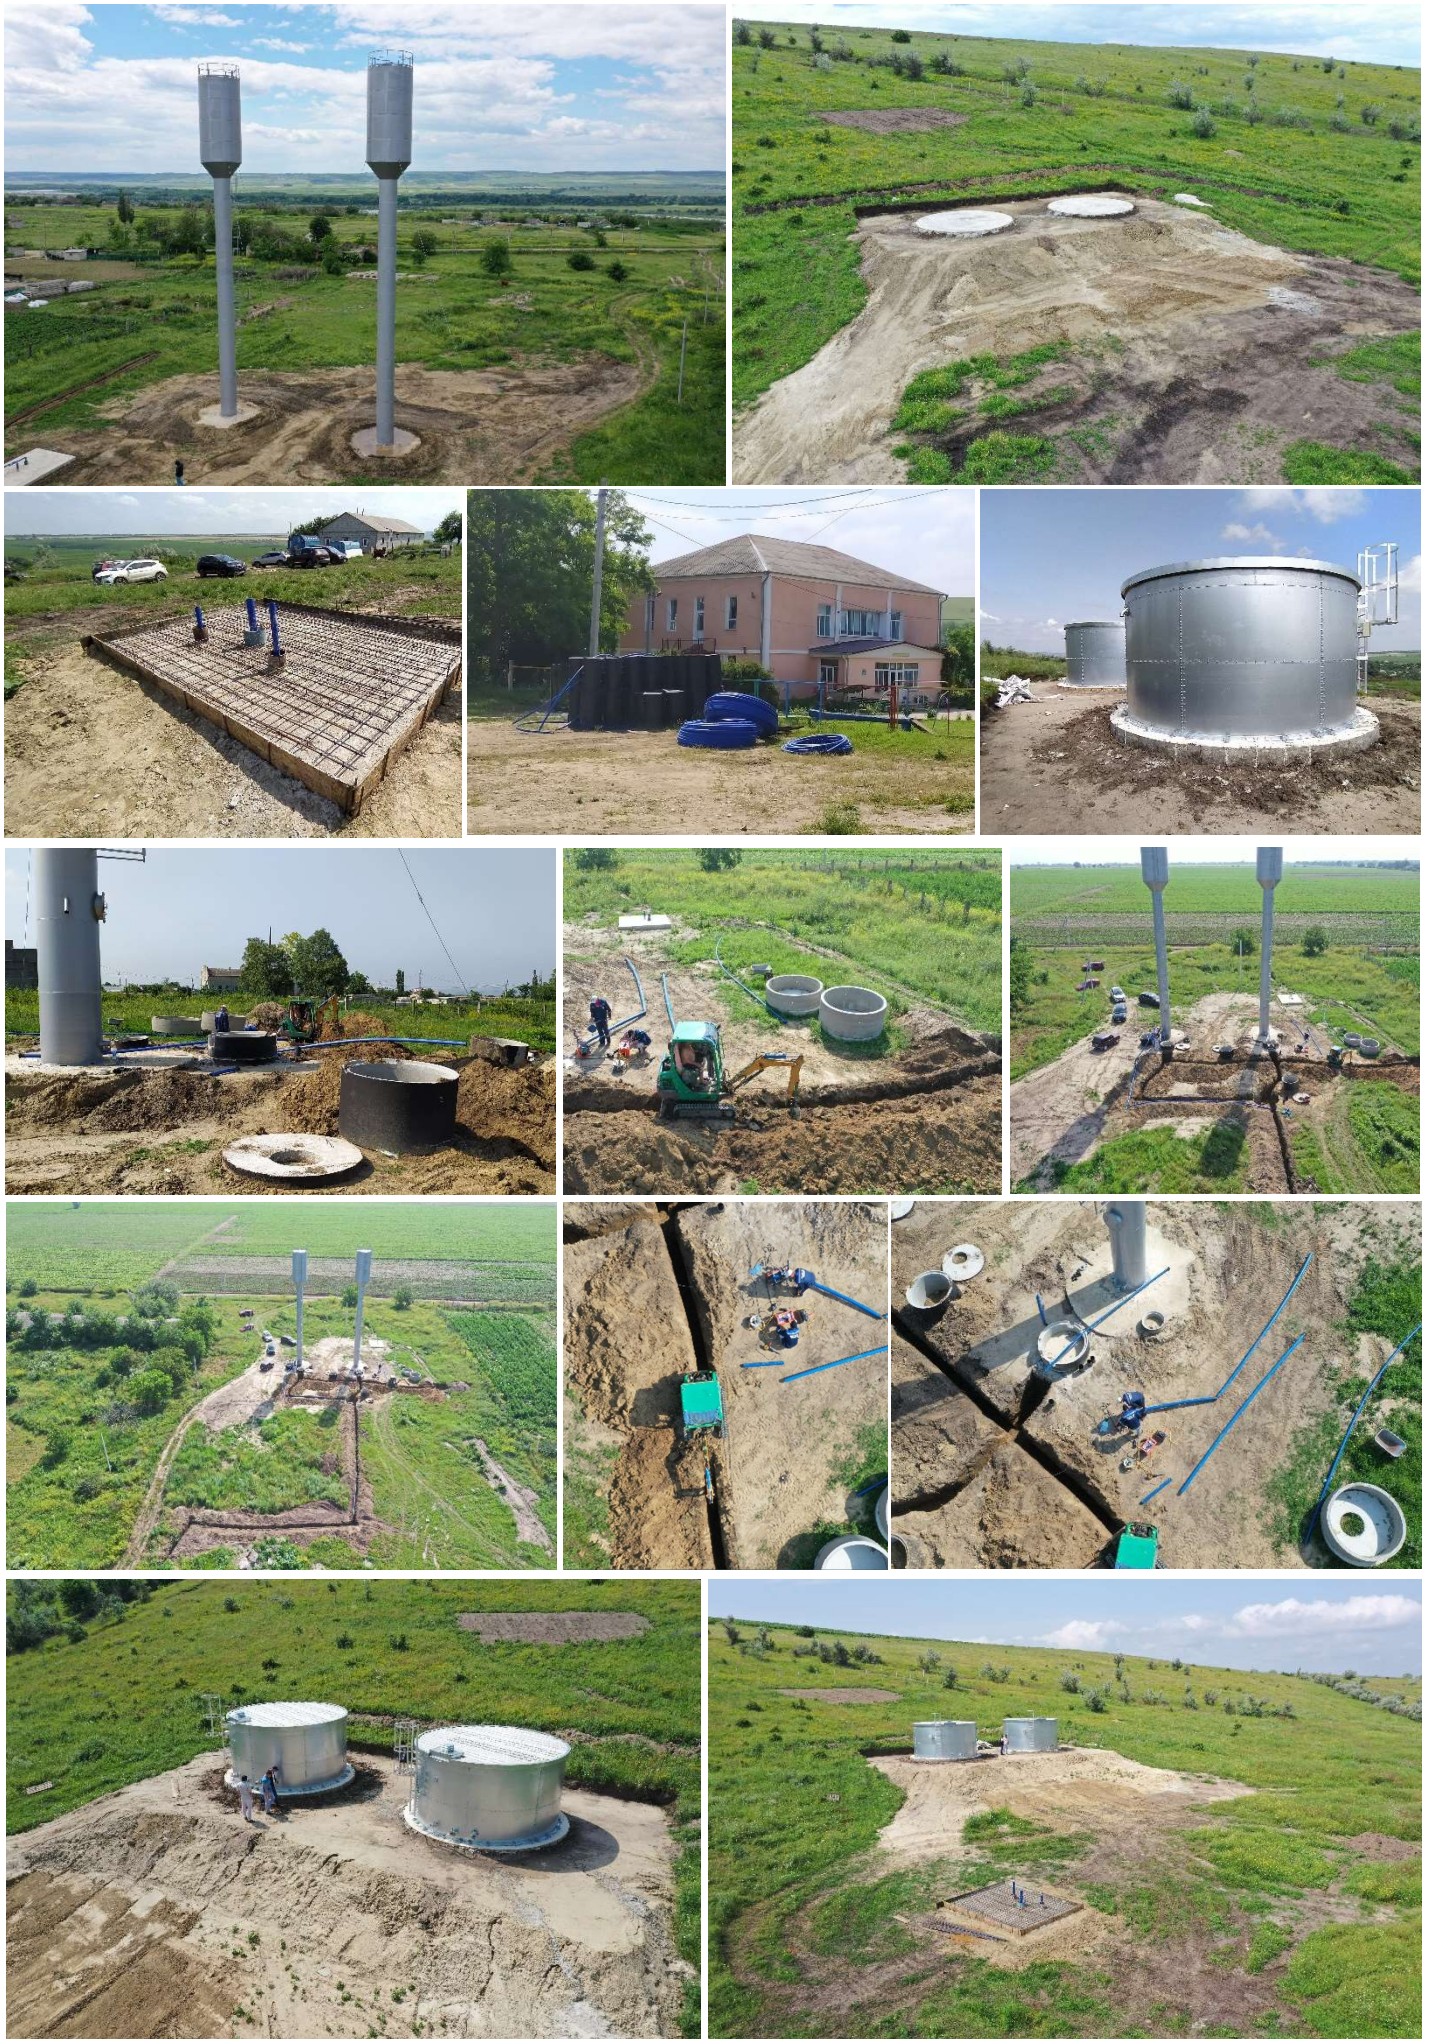

RAPORT FINAL

al proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile- Răducani și Tomai din raionul Leova" ETAPA I (Sîrma și Tochile- Răducani)"



RAPORT FINAL

2. Situația la finele procesului de implementarea proiectului



Rezervoare de apă din localitatea Sîrma



Castele de apă din localitatea Tochile-Răducani
