



Raport final privind implementarea proiectului

„Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut”

I. Date generale:

Aplicant: Primăria comunei Manta, raionul Cahul

Partener: Primaria satului Crihana Veche; Primaria or. Cahul;

Durata de implementare a proiectului: 18 luni

Bugetul proiectului aprobat: 18688,35 mii lei

Suma solicitată din FNDR: 16097,5 mii lei

Obiectivul general al proiectului: Construirea infrastructurii adecvate și durabile de alimentare cu apă pentru localitățile Manta și Crihana Veche prin extinderea sistemului de alimentare cu apă centralizat al or. Cahul și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii.

Beneficiari: Proiectul are ca scop construirea sistemului de alimentare cu apă, care oferă acces la apă potabilă fiabilă și sigură.

Se estimează că în urma proiectului vor beneficia un număr de 9600 locuitori: 4100 în satul Manta și Pașcani, 5500 în Crihana Veche, inclusiv 4500 femei și 1520 copii, precum și trei școli, 2 grădinițe, 2 centre de sănătate și 2 centre administrative.

Gospodării individuale care vor beneficia de rezultatele proiectului – 2550

Agenți economici care vor beneficia de rezultatele proiectului – 68

II Finanțarea proiectului.

Proiectul „Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut” a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în urma apelului de propuneri de proiecte 2010. Prin Hotărârea de Guvern Nr.772 din 26 august 2010 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program 2010 – 2012. Finanțarea proiectului în valoare de **18688,35** mii lei a fost aprobată de către CNCDR prin decizia Nr 18/10 din 20 septembrie 2010. În urma implementării proiectului costurile totale au constituit 16 868, 00 mii lei din FNDR. Pentru anul 2011 prin decizia CNCDR au fost alocată suma de 15 668,6 mii lei, iar pentru anul 2012 din FNDR au fost alocate sursele financiare în urma rezultatului redistribuirii 1 199,2 mii lei

În cadrul acestui proiect, a fost anunțat în urma publicării anunțului de intenție al ADR Sud în Buletinul achizițiilor publice nr.98 din 17.12.2010, următoarea achiziție publică: Licitația publică nr. 1642/10 din 15.12.2010, cu invitația de participare publicată în Buletinul achizițiilor publice nr. 92 din 26.11.2010 privind achiziționarea

lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a satelor Crihana Veche și Manta, conform proiectului "Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut". Licitația s-a desfășurat la termenul stabilit. Conform deciziei grupului de lucru a fost desemnată câștigătoare oferta S.R.L. "Planta", în valoare de 14 747 374,00 lei, inclusiv TVA. Ulterior, în urma apariției unor volume de lucrări suplimentare a fost semnat acordul adițional Nr1 din 24 decembrie 2011 prin care costul lucrărilor s-a majorat pînă la 1 960 309 lei. Total costul lucrărilor de construcție a apeductului constituind 16 707 683,00 lei

La data de 24 februarie 2011, a fost semnat contractul de antrepriză cu SRL „Planta”, cu perioada de realizare a lucrărilor de 8 luni. Contractul a fost înregistrat la Agenția de Achiziții Publice la data de 17.03.2011.

Cheltuieli pentru supravegherea tehnică – 100,25 mii lei (din FNDR)

Cheltuieli pentru supravegherea de autor – 35,75 mii lei (din FNDR)

Cheltuieli administrative efectuate în cadrul proiectului - 41,30 mii lei (din FNDR)

În total au fost efectuate cheltuieli în valoare de 16 868,00 mii lei din FNDR

Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

1. Lansarea proiectului.

2. Activități de achiziții publice.

3. Monitorizarea proiectului

4. Executarea lucrărilor de construcție

- Lucrări de construcție a conductei magistrale de apă de la stația de tratare a Apei din or. Cahul

- Lucrări generale de construcție a stației de pompare,

- Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă potabilă în s. Crihana Veche,

- Lucrări de construcție a rețelei de distribuție a apei în com. Manta,

- Amenajarea teritoriului

- Recultivarea terenului

5. Activități de instruire.

6. Finalizarea proiectului.

III. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr	Indicatori planificați conform cererii de finanțare	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor	
			Indicatori de produs	
1	Lungimea rețelelor noi construite. (valoarea inițială-0)			
	Lungimea rețelei de apeduct – 57,69 km	Lungimea rețelei de apeduct nou construită - 59,1 km	Aplicantul a dispus de proiectul tehnic pentru construcția apeductului. Acesta a fost depus odată cu cererea de finanțare. În urma modificărilor apărute lungimea rețelei de apeduct noi construite a constituit 59,1 km.	
2	Lungimea rețelelor renovate. (valoarea inițială-0)			
	0	0	Reieșind din faptul că în cadrul proiectului a fost prevăzută integral construcția rețelei noi de apeduct, nu au fost renovate rețele de apeduct	
3	Capacitatea sistemelor de aprovizionare cu apă și servicii de canalizare (valoarea inițială - 0)			
	1961 m3/zi	1961 m3/zi	După finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei noi de apeduct în satul Crihana Veche și c. Manta, raionul Cahul, va fi dat în gestiunea Î.M. "APĂ CANAL" Cahul. Conform analizei efectuate, capacitatea de livrare a apei pentru cei 9600 de locuitori ai c. Manta și s. Crihana Veche Î.M. "APĂ CANAL" Cahul va livra apă în volum de 1961 m3/zi.	
4	Volumul de apă m3/lună, (valoarea inițială - 0)			
	58830 m3/lună	58830 m3/lună	Odată cu conectarea 100 % a tuturor gospodăriilor la sistemul de conectare a apeductului va fi livrat volumul de apă de 58830 m3/lună	
5	Volumul de apă consumat în mediu de o persoană (m3/persoană/lunar) (valoarea inițială - 0)			
	2,5 m3/zi	2,5 m3/zi	Volumul de apă consumat de o persoană pe lună fiind de 2,5 m3/lună.	
6	Persoane instruite (valoarea inițială - 0)			
	Total: 18 din care - 16 bărbați - 2 femei Angajați ai serviciului – 14 din care -14 bărbați	Total: 41 din care - 30 bărbați - 11 femei Angajați ai serviciului – 14 din care -13 bărbați - 1 femei	Un punct vulnerabil al proiectului a fost realizarea activităților de instruire. Din aceste considerente instruirile s-au axat pe 2 direcții: 1. Au fost desfășurate instruirii privind tehnica securității pentru 41 persoane angajate de către firma de construcție. 2. A doua direcție a fost axată pe îmbunătățirea capacităților reprezentanților APL în domeniul elaborării proiectelor. Astfel, 7 reprezentanți ai primăriei c. Manta, s. Crihana Veche au participat la	

	Reprezentanți APL - 4, din care - 2 bărbat - 2 femeie	Reprezentanți APL - 7, din care - 4 bărbat - 3 femeie	seminarul cu genericul "Elaborarea proiectelor în domeniul infrastructurii de apă și canalizare" organizat de ADR Sud în luna noiembrie 2011.
7	Persoane informate (valoarea inițială - 0)		
	9600 persoane informate	9727 persoane informate	În procesul implementării proiectului publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile din regiune și naționale, reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate 12 reportaje radio, și publicate 6 articole în presa scrisă și electronică (Gazeta de Sud, www.civic.md , www.icomunicat.md , www.adrsud.md ș.a.). De asemenea, evenimentul de lansare a proiectului la care au participat peste 70 persoane, a contribuit la asigurarea transparenței în cadrul proiectului. Se estimează că peste 9727 persoane au fost informate privind la activitățile proiectului. Au fost amplasate 2 banere de informare, totodată, au fost distribuite circa 300 de buclele informaționale.
	Indicatori de rezultat		
8	Locuri de muncă noi create (valoarea inițială - 0)		
	9 locuri de muncă noi create pe termen lung 1 loc de muncă creat pe termen scurt	0 locuri de muncă create pe termen lung 1 loc de muncă creat pe termen scurt	În cadrul proiectului a fost angajat pe un termen de 8 luni un manager de proiect în sarcina căruia a stat monitorizarea procesului de implementare a proiectului. Indicatorul planificat (9 persoane angajate) nu a fost realizat la moment. Se planifică că după finalizarea conectărilor, în fiecare localitate vor fi angajate de către ÎM Apă Canal Cahul, câte 3 persoane pentru colectarea datelor și distribuirea bonurilor de plată pentru servicii.
9	Branșamente la rețele construite (valoarea inițială - 0)		
	2665 de gospodării cu acces îmbunătățit la serviciile de apeduct	120 gospodării cu acces îmbunătățit la serviciile de apeduct	În rezultatul construcției rețelei de apeduct în c. Manta și s. Crihana Veche au fost conectați circa 120 de gospodării din 2665 de gospodării. Recepția finală în cadrul acestui proiect a avut loc în luna septembrie 2012. Datorită capacităților reduse a Î.M. "APĂ CANAL", care fiind singura instituție ce efectuează lucrările de conectare la rețeaua de apeduct, lucrările de conectare au fost direcționate în s. Roșu, urmînd ca conectarea cetățenilor din s. Crihana Veche, și Manta să se desfășoare ulterior. Pentru localitățile

				Crihana Veche și Manta în perioada septembrie-decembrie 2012 a fost efectuată campania de informare cu privire la conectarea sistemului de apeduct. În prezent sunt în proces de colectare a cererilor de conectare la rețeaua de apeduct.
10	Populație cu acces îmbunătățit la serviciile de apeduct (valoarea inițială - 0)			
	9600 cetățeni ai c. Manta și s. Crihana Veche	9600 cetățeni ai c. Manta și s. Crihana Veche	În urma construcției sistemului de apeduct, a fost îmbunătățit accesul la serviciile de aprovizionare cu apă pentru 9600 de cetățeni ai localităților c. Manta și Crihana Veche. Deși accesul la servicii este asigurat, totuși rata de conectare este destul de scăzută, la momentul raportării fiind conectate doar 120 de gospodării din 2665.	

IV. Finalizarea proiectului.

La data de 12 iulie 2012 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe obiectul dat. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic (*Proces verbal nr. 1 din 12 iulie 2012*). La data de 21 august 2012 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 2 din 21 august 2012*).

La data de 8 noiembrie 2012 ADR Sud, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 772 din 26 august 2010 și a acordului de parteneriat, a predat obiectul construit către primăria c. Manta, raionul Cahul (*Act de primire-predare a obiectului din 8 noiembrie 2012*).


Director ADR Sud



 Maria CULEȘOV

Anexa 2.

1. Procesul de implementare

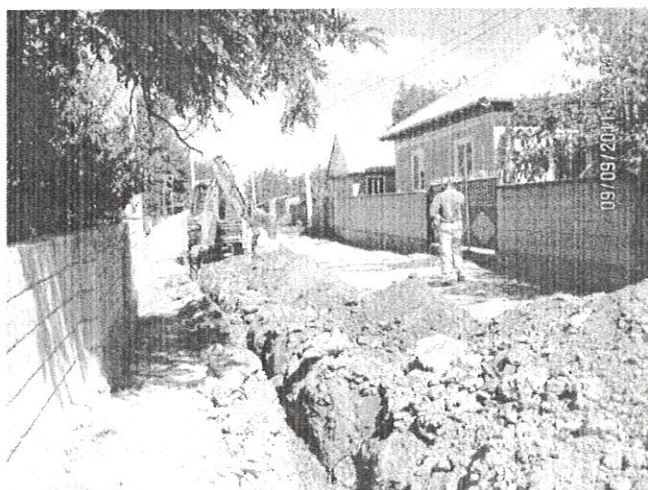

2. Situația după implementarea proiectului.

