



Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12
Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adrsud@gmail.com

nr. 04 din 14 ianuarie 2015

Ministerului Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Raport final
privind implementarea proiectului cod: 0866,
„Construcția drumului local Sărățica Nouă-Tomaiul Nou, raionul Leova”.

I. Date generale:

Aplicant: CONSILIUL RAIONAL LEOVA

Parteneri: Primăriile comunelor Sărățica Nouă și Tomaiul Nou din raionul Leova.

Durata de implementare a proiectului: 9 luni

Bugetul proiectului aprobat: 10 476 850,0 lei

Suma solicitată din FNDR: 10 476 850,0 lei

Obiectivul general al proiectului: Modernizarea infrastructurii de acces raionale în comunele Sărățica Nouă - Tomaiul Nou.

Beneficiarii proiectului:

- 1985 locuitori (c. Sărățica Nouă, c. Tomaiul Nou – bătrâni, copii, tineri, studenți etc).
- circa 611 gospodării casnice – din c. Sărățica Nouă, c. Tomaiul Nou;
- Instituții de menire socială – 9 din c. Sărățica Nouă, c. Tomaiul Nou;
- 13 - agenții economici (comunele Sărățica Nouă și Tomaiul Nou);
- circa 150 – posesori de autoturisme personale (din c. Sărățica Nouă și Tomaiul Nou);
- 535 - Gospodării Țărănești din localitățile susmenționate;
- Posesori ce dispun de autovehicule personale inclusiv cu destinație agricolă - 30 locuitori din localitățile țintă susnumite.
- Consiliul Raional Leova, S.A. „Drumuri” Leova.

II. Finanțarea proiectului.

Proiectul „Construcția drumului local Sărățica Nouă-Tomaiul Nou, raionul Leova” a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în urma apelului II de propuneri de proiecte, efectuat în anul 2012. Prin Hotărârea de Guvern Nr. 933 din 18 decembrie 2012 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program 2013–2015. Finanțarea proiectului pe anul 2014 în valoare de 3 000,0 mii lei a fost aprobată de către CNCDR prin decizia Nr. 13/13 din 20 decembrie 2013. Ulterior, prin Decizia CNCDR nr. 5/14 din 11.11.2014 a fost aprobată suma de 9 816,13 mii lei.

În urma desfășurării licitației publice nr.14/00736 privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Construcția drumului local Sărățica Nouă-Tomaiul Nou, raionul Leova”, petrecută pe data de 23.04.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 29 din 11.04.2014, de către grupul de lucru a fost desemnat câștigător SRL „Acit-Trans”, cu oferta de 9 152 202,48 lei.

La data de 25 aprilie 2014 a fost semnat contractul de antrepriză nr. 4/L/14 cu câștigătorul licitației publice SRL „Acit-Trans” în sumă de 9 152 202,48 lei, cu perioada de realizare a lucrărilor de 12 luni calendaristice. Contractul a fost înregistrat la Agenția de Achiziții Publice la data de 26.05.2014.

La data de 14 octombrie 2014 a fost semnat acordul adițional nr. 1, la contractul de antrepriză nr. 4/L/14 din 25.04.2014 cu SRL „Acit-Trans”, în valoare de 570 873,65 lei, valoarea lucrărilor de construcție majorându-se la suma de 9 723 076,13 lei. Acordul adițional nr. 1 din 14.10.2014 a fost înregistrat la AAP pe data de 14.11.2014.

Serviciile privind supravegherea tehnică a obiectului au fost achiziționate în urma licitației publice nr. 14/00654 din 18.04.2014. De către grupul de lucru a fost desemnat câștigător ÎS „SABOS”, cu oferta de 0,95% din suma contractată pentru lucrările de construcție, ce constituie suma de 86 945,92 lei. Contractul nr. 11/S/14 cu privire la supravegherea tehnică a fost încheiat pe data de 30 aprilie 2014.

În legătură cu majorarea contractului antreprenorial de bază, pe data de 20 noiembrie 2014 a fost semnat acordul adițional nr. 1 și la contractul de supraveghere tehnică. Valoarea contractului a fost mărită cu 5 423,30 lei, suma totală a contractului de bază fiind egală cu 92 369,22 lei.

De asemenea, din FNDR a fost achitat panoul informativ al proiectului, în valoare de 680,0 lei.

În total, din FNDR au fost efectuate cheltuieli în valoare de 9 816 125,33 lei.

Din partea Aplicantului – Consiliului raional Leova, au fost achitate serviciile de supraveghere de autor și servicii de modificare a proiectului în valoare de 40 788,0 lei.

Costul total al proiectului constituie 9 856 913,33 lei, din care din FNDR au fost valorificați 9 816 125,33 lei (99,59%), iar din partea Aplicantului (C.R. Leova) – 40 788,0 lei (0,41%).

III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

1. Organizarea licitației pentru execuția lucrărilor

- A fost elaborată documentația de licitație (caietul de sarcini).
- A fost publicat anunțul în BAP și pe paginile web a Agenției, privind organizarea licitațiilor de selectare a antreprenorului și a responsabilului tehnic.
- Organizarea licitațiilor, deschiderea ofertelor prezentate.
- Evaluarea ofertelor, selectarea antreprenorului și a responsabilului tehnic în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație
- Încheierea și semnarea contractului de antrepriză, înregistrarea lui la AAP.
- Semnarea acordului de parteneriat

2. Lucrări de pregătire a terenului pentru construcția drumului.

- Restabilirea traseului și pichetarea axei (3,778 km).
- Pregătirea și curățirea traseului de copaci și arbuști (1000 m²)

3. Realizarea lucrărilor de terasament

- Au fost executate lucrări de terasament, construcția rambleului și a rigolelor de scurgere a apei.

4. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere.

- Executată nivelarea mecanică a suprafeței terenului (34950 m²), Așternerea stratului de nisip H=10 cm 3640 m³, așternerea stratului de pietriș M400 H=15 cm. 23335 m³, așternerea stratului de pietriș M400 H=15 cm prin metoda împanării 22745 m³
- Executate lucrări de amenajare a drumurilor laterale - 6 drumuri laterale

5. Executarea lucrărilor de artă.

- Montarea tuburilor de evacuare a apelor pluviale (8 buc), construcția canalului de scurgere de la PC 33+75 pînă la PC 37+25 (350 m)

6. Montarea indicatorilor rutieri.

- Au fost montate 69 de indicatoare rutiere.

7. Lucrări de finalizare

- Executate lucrări de nivelare a terenului și a platformelor de terasamente. Amenajarea taluzurilor (13330 m²), amenajarea acostamentelor (7890 m²). A fost semănat gazonul pe taluzuri și acostamente (21220 m²)

8. Asigurarea managementului eficient al proiectului

- Monitorizarea activităților proiectului
- Evaluarea lucrărilor îndeplinite de către comisia de recepție, semnarea actului de recepție la terminarea lucrărilor.
- Înlăturarea neconformităților depistate, desfășurarea recepției finale a proiectului.
- Transmiterea obiectului în mod gratuit la bilanțul beneficiarului

IV. Realizarea indicatorilor de proce și rezultat în cadrul proiectului.

Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor

| Nr. | Indicatori planificați conform cererii de finanțare | Rezultatele atinse la finele proiectului | Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor |
|-----|---|--|---|
| | | | Indicatori de produs |
| 1 | Localități beneficiare de drum (valoarea inițială - 0) | | |
| | 2 localități care vor beneficia de drum | 2 localități care beneficiază de drum | Proiectul „Construcția drumului local Sărățica Nouă-Tomaial Nou, raionul Leova” este un proiect nou, la etapa inițială localități beneficiare nu au fost. La final, 2 localități (s. Sărățica Veche și s. Cîmpul Drept) beneficiază direct de drumul nou-construit. |
| 2 | Lungimea drumului construit (valoarea inițială - 0 km) | | |
| | 3,78 km de drum local construit | 3,78 km de drum local construit | Indicatorul a fost atins pe deplin. În termen de 6 luni au fost executate lucrările de construcție a porțiunii de drum de 3,78 km, asigurând accesul beneficiarilor finali. |
| 3 | Persoane informate (valoarea inițială - 50) | | |
| | 3398 persoane informate | Peste 5000 persoane informate | În procesul implementării proiectului publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile de televiziune „Aici TV” și „Media TV” 4 reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate 3 reportaje radio (Radio Media), și publicate 14 articole în presa scrisă și electronică (Gazeta de Sud, www.civic.md, www.adrsud.md ș.a.). Se estimează că peste 5000 persoane au fost informate privitor la activitățile proiectului. |
| | | | Indicatori de rezultat |
| 4 | Persoane cu acces îmbunătățit la drum (valoarea inițială - 0) | | |
| | 1985 persoane cu acces îmbunătățit la drum | Peste 2000 persoane cu acces îmbunătățit la drum | În rezultatul efectuării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului, de drumul nou construit beneficiază direct peste 1900 de locuitori a satelor Sărățica Veche și Cîmpul Drept, precum și locuitorii satelor vecine. |
| 5 | Automobile pe trafic (valoarea inițială - 0) | | |
| | În zile lucrătoare – 160 unități În week-end și zile de sărbători – 80 unități Noaptea – 20 unități Total – 260 unități. | În zile lucrătoare – 160 unități În week-end și zile de sărbători – 80 unități Noaptea – 20 unități Total – 260 unități | În urma implementării proiectului a sporit considerabil traficul transportului pe porțiunea dată de drum. Au fost redirecționate un șir de rutiere inter-urbane și inter-rurale din localitățile beneficiare de proiect. |

V. Finalizarea proiectului.

La data de 15 octombrie 2014 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe obiectul dat. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate fără obiecții majore în conformitate cu proiectul tehnic (*Proces verbal nr. 1 din 15 octombrie 2014*). În urma înlăturării tuturor obiecțiilor, indicate de comisia de recepție, la data de 28 noiembrie 2014 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 2 din 28 noiembrie 2014*).

La finele lunii decembrie 2014 ADR Sud, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 și a acordului de parteneriat din 28 februarie 2014, a pregătit pachetul de documente pentru predarea obiectului construit către Beneficiar – Consiliul raional Leova. Obiectul a fost transmis prin act de primire-predare la data de 23 decembrie 2014.


Director ADR Sud



Maria CULEȘOV

Ex.: Andrei Tocaru,
specialist în elaborarea,
implementarea și monitorizarea
proiectelor în cadrul ADR Sud
tel.: 0 (241) 2-11-51

1. Situația pînă la implementarea proiectului

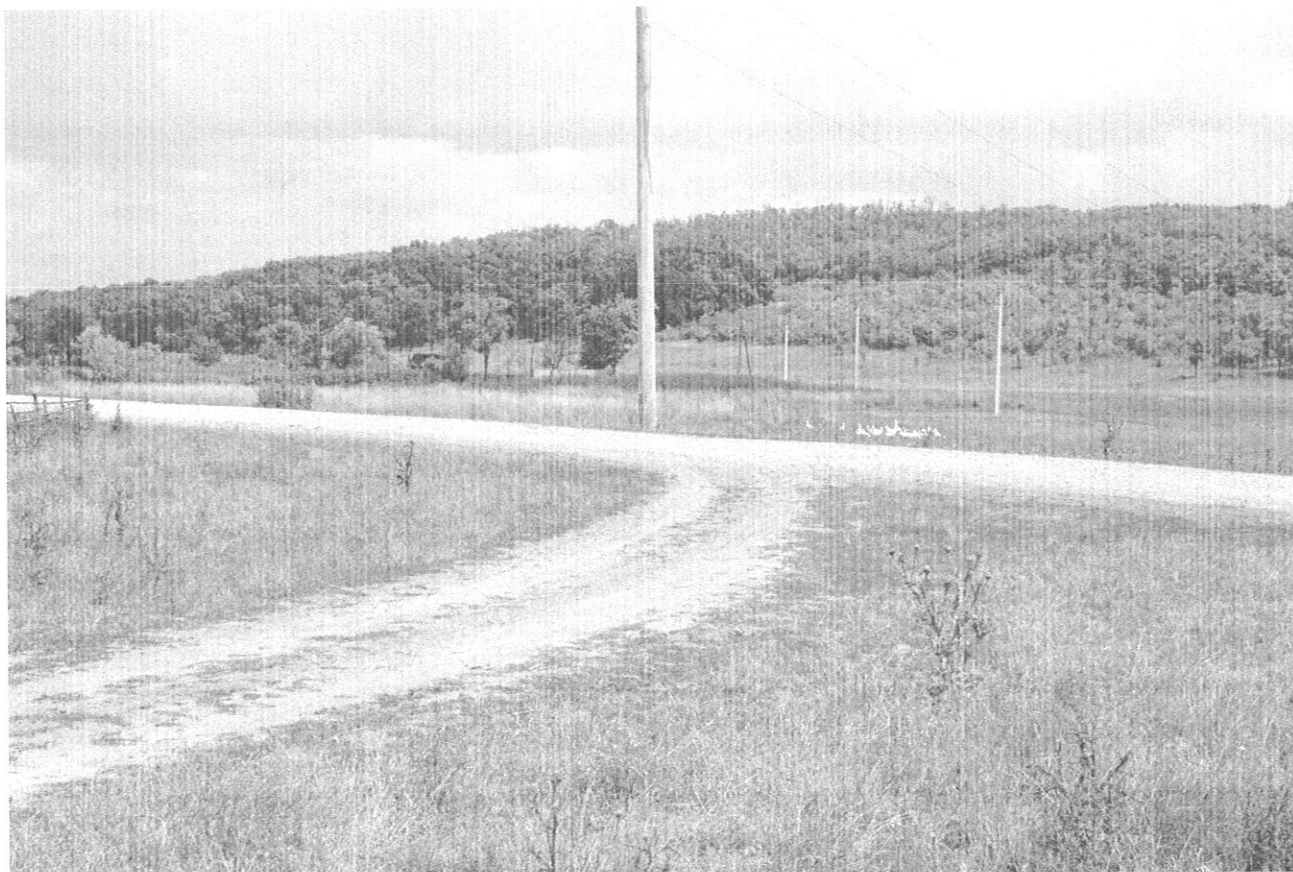

2. Procesul de implementare





3. Situația după implementarea proiectului.

