



nr. 363 din 20 iunie 2019

**Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului**

RAPORT FINAL

privind implementarea măsurii investiționale

„*Construcția apeductului magistral Leova - Iargara*” din cadrul proiectului
”Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în localitățile
din raionul Leova,,

I. Date generale:

Aplicant/Beneficiar: Consiliul raional Leova

Parteneri: MADRM, Primăria or. Leova

Durata de implementare a proiectului: 2013 - 2019.

Bugetul proiectului: 63.989.136,90 lei cu TVA la cota 0 (zero).

Suport financiar alocat de către Guvernul Germaniei prin intermediul GIZ:
54.171.284,66 lei cu TVA la cota 0 (zero).

Suport financiar alocat de către FNDR: 8.817.852,24 lei cu TVA la cota 0
(zero).

Suport financiar alocat de către Consiliul raional Leova: 1.000.000,00 lei cu
TVA la cota 0 (zero).

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de trai a
populației din raionul Leova prin asigurarea cu acces la servicii de alimentare cu
apă de calitate.

Beneficiarii direcți ai proiectului:

- or. Leova, or. Iargara, s. Cupcui, s. Sărata – Nouă, s. Filipeni, s. Romanovca, s. Hănăsenii Noi deservite de operatorul serviciului AAC (3 localități deservite în acest moment, 4 vor fi deservite în cadrul măsurii investiționale II și III, finanțate de UE);
 - 23.443 de persoane din 7 localități cu acces îmbunătățit la rețeaua de apă nou construită (în prezent - 11.779 de cetățeni din orașul Leova, Iargara și satul Hănăsenii Noi.) Alți 11.664 cetățeni din Filipeni, Cupcui, Romanovca, Sărata Nouă și Iargara beneficiază în cadrul măsurii investiționale II și III, finanțate de UE).
 - 42 agenți economici în locații vizate (nu există informații despre împărțirea pe localități)
 - 30 instituții sociale (nu există informații despre împărțirea pe localități)

Beneficiarii indirecti ai proiectului:

- 53.600 de persoane din 28 de localități din raionul Leova (Cluster A, B și C) vor putea beneficia de acces la apă potabilă prin conductele de apă de la Leova-Iargara.

II. Finanțarea proiectului.

Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale" a fost acceptat pentru finanțare din sursele Fondului German pentru Investiții în anul 2014. La data de 08 mai 2015 a fost semnat Memorandumul de înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Leova din cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".

Pe parcursul a 15 luni calendaristice, mai exact din data de 17.03.2016 – 13.06.2017 de către două companii de proiectare, și anume SRL "Fluxproiect,, ca lider al Consorțiului și SRL "Metiolis,, a fost pregătită documentația de proiect. Prin urmare tot procesul de elaborare a documentației de proiect a fost supravegheat de către Departamentul de Construcții GIZ prin intermediul companiei "Lotus Consulting". Valoarea contractului de achiziționare a serviciilor

de proiectare a fost de **2.613.070 lei cu TVA la cota 0 (zero)**. Mijloacele financiare au fost acoperite din Fondul German pentru Investiții.

În vederea implementării proiectului, în anul 2017, ADR Sud a organizat procedura de licitație publică nr. 17/03 din 12.10.2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 68 din 25.08.2017. Prin urmare, la data de 01.12.2017, părțile contractante - Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul raional Leova și SRL "Polimer Gaz Conducte" - au semnat Contractul de antrepriză nr. 12/L/17 în valoare de **60.857.485,13 lei** cu TVA la cota 0 (zero). Astfel, pe parcursul implementării contractului, s-a constatat necesitatea ajustării la cerința finanțatorului a unor prevederi cu referire la modalitatea de plată, și anume: indicarea surselor de finanțare ale Contractului și modalitatea de achitare și stingere a avansului, prin urmare a fost semnat la data de 15 decembrie 2017, Acordul adițional nr. 1 la Contractul de antrepriză nr. 12/L/17 din 01.12.2017.

Totodată la data de 08 decembrie 2017 a fost semnat contractul nr. 22/S/17 privind supravegherea de autor a lucrărilor de construcție în valoarea de **217 644 lei cu TVA la cota 0 (zero)**, astfel pe parcursul implementării, s-a constatat necesitatea ajustării valorii contractului la costurile reale efectuate, ca urmare a fost semnat acordul adițional nr. 1 la contractul nr. 22/S/17 din 08.12.2017, valoarea finală fiind de **182 572,46 lei cu TVA la cota 0 (zero)**.

Prin urmare a fost desfășurat licitația publică nr. 17/07 din 03.01.2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 102 din 22.12.2017, privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor și contractul a fost atribuit SC "Preant" SRL. Astfel, la data de 12.01.2018, părțile contractante - Agenția de Dezvoltare Regională Sud și SC "Preant" SRL - au semnat Contractul nr. 2/S/18 în valoare de **264.000,00 lei cu TVA la cota 0 (zero)**.

Lucrările de construcții din cadrul proiectului au demarat în luna ianuarie 2018, cu o perioadă de execuție a lucrărilor de 9 luni calendaristice.

În procesul de execuție a lucrărilor din cadrul măsurii investiționale „Construcția apeductului magistral Leova - Iargara” s-a constatat necesitate excluderii cât și a includerii unor volume suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de construcție contractate. Astfel a fost încheiat acordul adițional Nr. 2 la Contractul de antrepriză nr. 12/L/17 din 01.12.2017, prin care s-a exclus și s-a adăugat lucrări în valoare de 67 062,93 lei cu TVA la cota 0 (zero). Corespunzător s-a modificat valoarea contractului 12/L/17 din 01.12.2018 în suma fiind de **60 924 548,06 lei cu cota TVA 0 (zero)**.

Tot odată a fost necesar de încheiat acordul adițional nr. 1 la Contractul nr. 2/S/18 din 12.01.2018 cu supravegherea tehnică, valoarea lui fiind de **264.290,69 lei cu cota TVA 0 (zero)** și acordul adițional nr. 2 la Contractul nr. 22/S/17 din 08.12.2017, valoarea finală fiind de **182.773,65 lei cu cota TVA 0 (zero)**.

Executarea contractului fiind finanțată din sursele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Fondului Național pentru Dezvoltarea Regională (FNDR) și a Consiliului Raional Leova (CR Leova).

Anexa 1. Bugetul proiectului

Sursa de finanțare	Guvernul German prin GIZ, lei cu TVA la cota 0 (zero)	Fondului Național pentru Dezvoltarea Regională, lei cu TVA la cota 0 (zero)	Consiliului raional Leova, lei cu TVA la cota 0 (zero)	Total
Reproiectarea documentației proiectului	2.613.070,00			2.613.070,00
Lucrări de construcție	51.106.695,82	8.817.852,24	1.000.000,00	60.924.548,06
Supravegherea tehnică	264.290,69			264.290,69
Supravegherea de autor	182.773,65			182.773,65
Alte cheltuieli (BAP, panou informativ)	4.454,50			4.454,50
Total sursa	54.171.284,66	8.817.852,24	1.000.000,00	63.989.136,90

III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

1. Lansarea proiectului.

2. Organizarea licitației pentru achiziționarea serviciilor de proiectare și pentru execuția lucrărilor de construcție:

- Întocmirea documentației de licitație (caietul de sarcini).
- Publicarea anunțului în BAP și pe paginile web a Agenției, privind organizarea licitațiilor de selectare a antreprenorului și a responsabilului tehnic.
- Organizarea licitațiilor, deschiderea ofertelor prezentate.
- Evaluarea ofertelor, selectarea antreprenorului, responsabilului tehnic și a supravegherii de autor în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație

- Încheierea și semnarea contractelor de (antrepriză, supraveghere tehnică și supraveghere de autor) și înregistrarea lor la AAP.
 - Semnarea acordului de finanțare
- 3. Crearea comitetului local de monitorizare a proiectului:**
- Informarea cetățenilor cu privire la derularea proiectului;
 - Crearea cooperativelor pe străzi și alegerea liderilor acestora;
 - Întâlniri de lucru cu personalul de organizații, școală, grădiniță, biroul medicilor de familie;
- 4. Executarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Leova - Iargara în conformitate cu proiectul/contractul:**
- Montarea 22,9 km de rețea magistrală de alimentare cu apă (2x22,9 = 45,8 km de conductă);
 - Montarea 1,8 km de rețea de alimentare cu apă în sectorul Roza Moldovei;
 - Construcția stației de pompare treapta 1 (stația de captare);
 - Construcția a 2 stații de repompare;
 - Reabilitarea stației de tratare a apei;
 - Construcția a 2 rezervoare supraterane din panouri metalice a câte V=800 m³;
 - Reabilitarea a 2 rezervoare subterane din beton armat a câte V=700m³.
- 5. Asigurarea managementului eficient al proiectului:**
- Monitorizarea activităților proiectului, prin vizite de monitorizare de 2 ori pe lună;
 - Evaluarea lucrărilor îndeplinite de către comisia de recepție, semnarea actului de recepție la terminarea lucrărilor.
 - Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepție finală.
 - Transmiterea costurilor investiționale formate cu titlu gratuit la bilanțul beneficiarului.

IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr.	Indicatori planificați	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
Indicatori de produs			
1	Localități beneficiare de apeduct (valoarea inițială - 1)		
	1 localitate (or. Leova)	18 localități ai raionului Leova	3 localități deservite în acest moment, 4 vor fi deservite în cadrul măsurii investiționale II și III, finanțate de UE);

2	Lungimea rețelei noi construite (valoarea inițială - 0)		
	Montarea a 22,9 km de rețea magistrală de alimentare cu apă (2x22,9 = 45,8 km de conductă);	Montarea a 22,9 km de rețea magistrală de alimentare cu apă (2x22,9 = 45,8 km de conductă);	După finalizarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral, obiectul a fost transmis cu titlul gratuit către aplicantul proiectului Consiliul raional Leova, în baza Actului de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 09 din 15 mai 2019, care la rîndul lui, îl va transmite în gestiune către S.A. ”Apă-Canal Leova,,. Conform analizei efectuate, apa potabilă este de calitate și corespunde normelor sanitare în vigoare.
	Montarea a 1,8 km de rețea de alimentare cu apă în sectorul Roza Moldovei;	Montarea a 1,8 km de rețea de alimentare cu apă în sectorul Roza Moldovei;	
	Construcția stației de pompare treapta 1 (stația de captare);	Construcția stației de pompare treapta 1 (stația de captare);	
	Construcția a 2 stații de repompare;	Construcția a 2 stații de repompare;	
	Reabilitarea stației de tratare a apei;	Reabilitarea stației de tratare a apei;	
	Construcția a 2 rezervoare supraterane din panouri metalice a câte V=800 m ³ ;	Construcția a 2 rezervoare supraterane din panouri metalice a câte V=800 m ³ ;	
Reabilitarea a 2 rezervoare subterane din beton armat a câte V=700m ³ .	Reabilitarea a 2 rezervoare subterane din beton armat a câte V=700m ³ .		
3	Persoane informate (valoarea inițială - 500)		
30000 persoane informate	30000 persoane informate	În procesul implementării proiectului, publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile din regiune și naționale, reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate 2 reportaje tv, publicate articole despre procesul de implementare a proiectului pe contul ADR Sud pe pagina Facebook și în Grupul Dezvoltarea Regională cît și pe site-ul www.adrsud.md , serviciilocale.md ș.a.). De asemenea, au fost	

			amplasate 2 panouri de informare.
Indicatori de rezultat			
4	Locuri de muncă noi create (valoarea inițială - 0)		
	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	În cadrul proiectului au fost create pe termen scurt 1 loc nou de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen scurt au vizat persoanele din raionul Leova, care a fost angajat pe perioada efectuării lucrărilor de construcție a apeductului magistral.
	14 loc de muncă nou create pe termen lung	14 loc de muncă nou create pe termen lung	În cadrul proiectului au fost create pe termen lung 14 locuri noi de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen lung au vizat persoanele ce sunt necesare pentru o bună deservire și gestionare eficientă a investiției noi create.
5	Populație cu acces îmbunătățit la apă potabilă (valoarea inițială - 14238)		
	14238 locuitori cu acces îmbunătățit la apă potabilă	15601 locuitori cu acces îmbunătățit la apă potabilă	În urma construirii apeductului magistral Leova - Iargara, a fost îmbunătățită calitatea apei potabile pentru 15601 de cetățeni, agenți economici, instituțiile publice ale raionului Leova ce deja sunt racordate la apeductul nou construit (or. Leova, or. Iargara, s. Hănăsenii Noi). Urmează ca până la finele anului 2021 încă 4 localități din raionul Leova, vor fi construite rețele de apeduct (or. Iargara, s. Cupcui, s. Filipeni și s. Romanovca, finanțate de UE) care vor fi conectate la apeductul magistral nou construit, astfel va fi îmbunătățită calitatea apei potabile pentru 27563 de cetățeni din raionul Leova.

V. Finalizarea proiectului.

În urma implementării proiectului dat a fost atins în proporție de 100 % obiectivul general, prin satisfacerea nevoilor de aprovizionare cu apă potabilă de calitate a locuitorilor raionului Leova.

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc la data de 30 ianuarie 2019. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic (*Proces verbal nr. 01 din 30.01.2019*).

La data de 19 aprilie 2019 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 02 din 19.04.2019*).

La data de 29 mai 2019, ADR Sud în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor FNDR și din alte surse, aprobat prin HG. 1235 din 10.11.2016, precum conform procedurilor prevăzute de Acordul de finanțare nr. 81155779 din 10.12.2012, nr. proiectului 12.2505.1-001.00, Acordurile speciale cu amendamentele ulterioare din cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în RM" și Memorandumul de înțelegere din 08.05.2015 la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Leova, cu finanțare din Fondul German pentru Investiții, precum și în temeiul DUP pentru anii 2017 - 2020, aprobat prin HG. nr. 203 din 29 martie 2017, decizia CNCDR Nr. 12/18 din 11.09.2018 privind aprobarea finanțării din FNDR pentru implementarea proiectului "Construcția apeductului magistral Leova - Iargara", a transmis cu titlul gratuit obiectul construit către Consiliul raionul Leova (*Act de primire-predare a setului de documente care atestă costul investițional nr.09 din 15 mai 2019*).

Director ADR Sud




Maria CULEȘOV


Executor: Andrei Popușoi,
Șef Secție management proiecte
tel.: (0241) 2-11-51

1. Situația până la implementarea proiectului



2. Situația în procesul de implementare a proiectului.

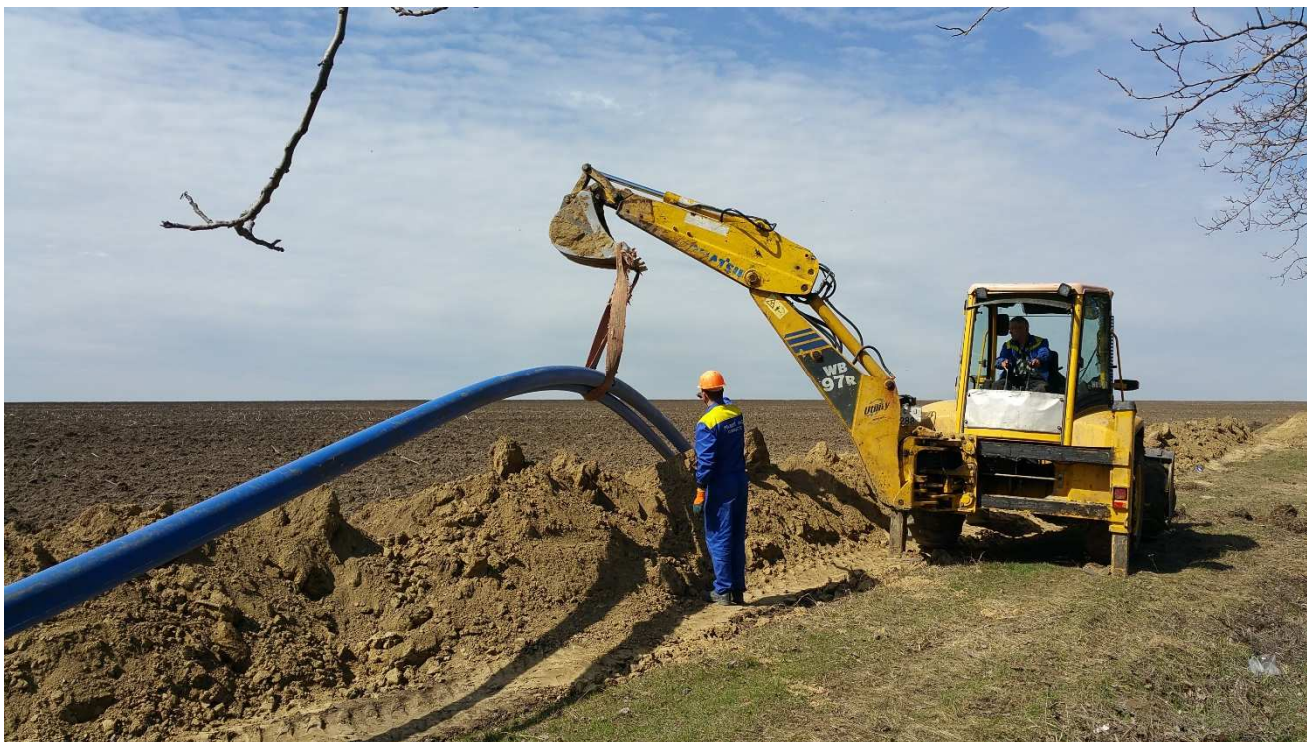

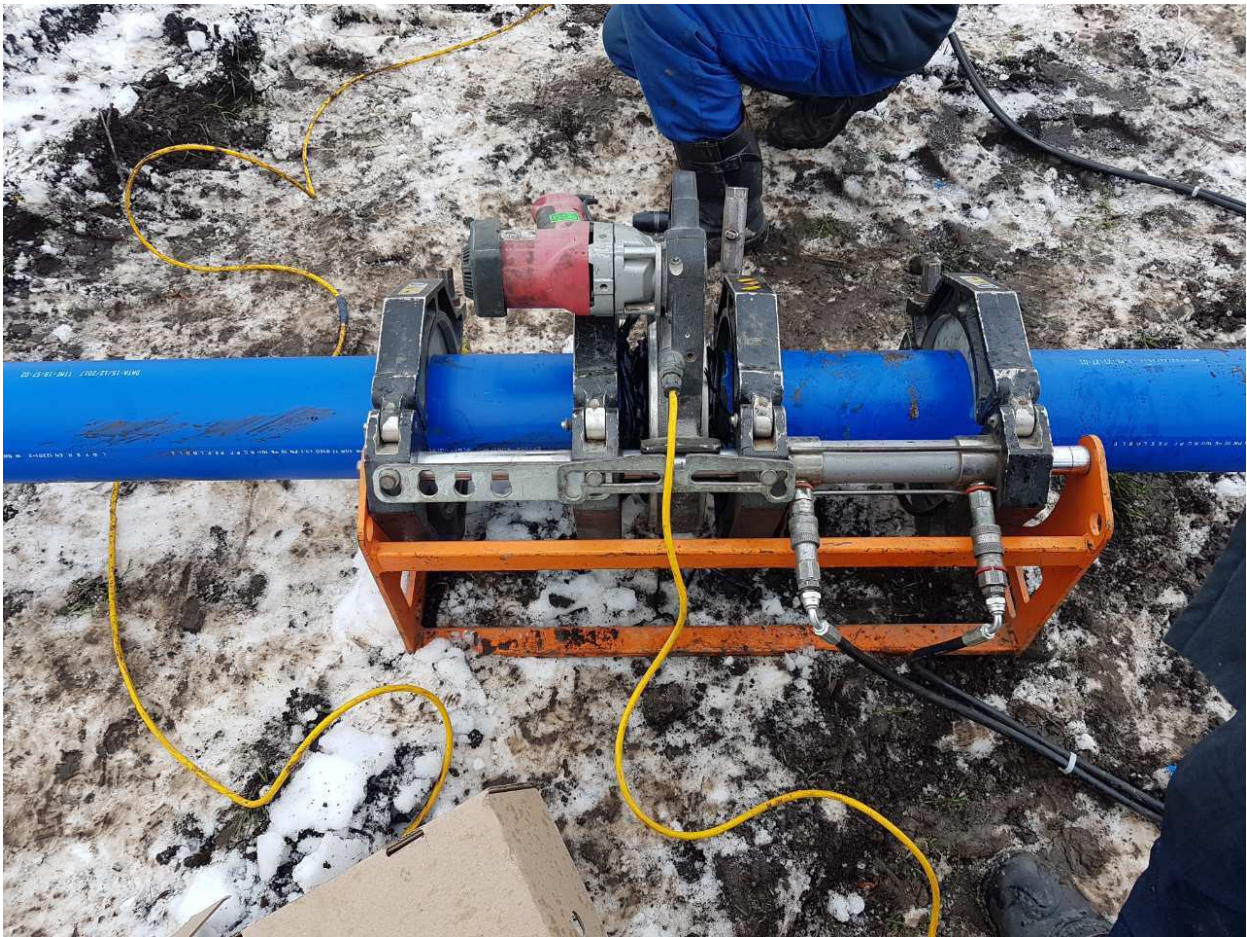







3. Situația după implementarea proiectului









