




MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

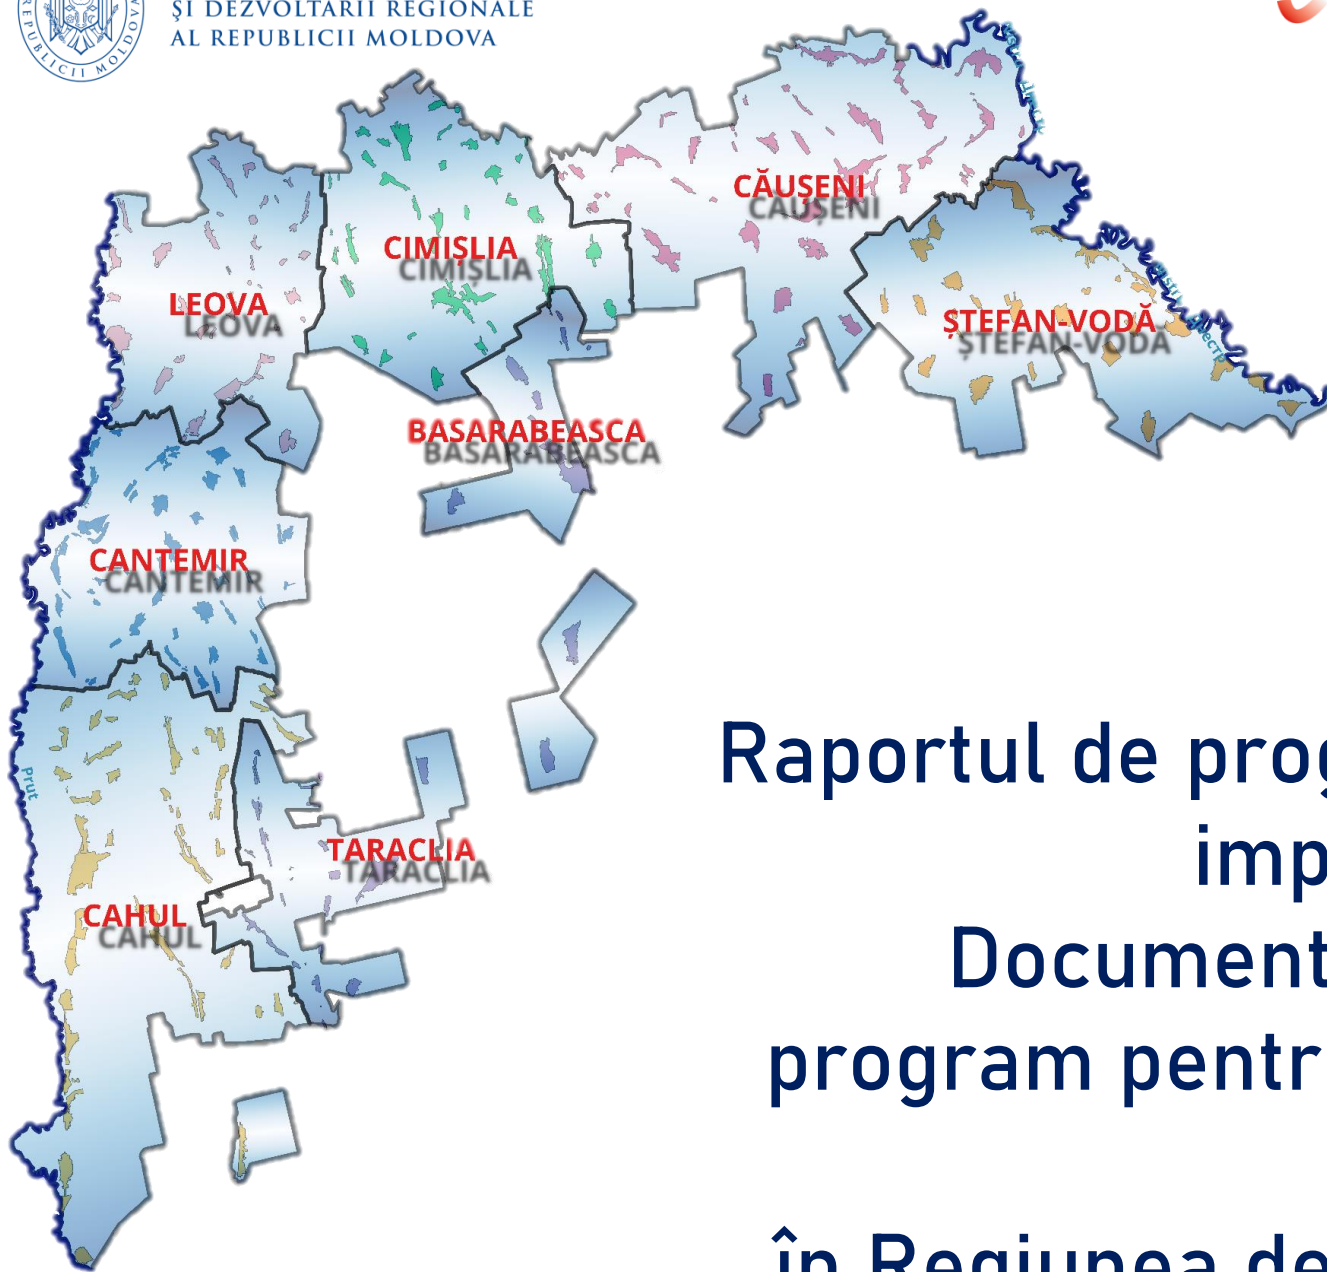

Raportul de progres privind implementarea Documentului unic de program pentru anii 2022- 2024, în Regiunea de Dezvoltare



Documentul unic de program

Documentul unic de program (DUP) - este un document de planificare elaborat pe termen mediu pentru implementarea SNDR. Acesta reprezintă documentul sinteză al programelor operaționale regionale (POR) și include lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională și locală, selectate în baza unui concurs organizat de autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională. DUP 2022-2024, avizat de către CNCDR la 03.12.2021 și aprobat prin HG nr. 23/2022.

Domeniile prioritare pentru care au fost selectate proiectele de dezvoltare regională sunt organizate în trei programe de finanțare:

Programul 1 „Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare”

- Măsura 1.1. Valorificarea infrastructurilor de afaceri
- Măsura 1.2. Dezvoltarea mediului antreprenorial
- Măsura 1.3. Sporirea atractivității turistice

Programul 2 „Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor”

- Măsura 2.1. Conectivitate și mobilitate urbană
- Măsura 2.2. Competitivitatea și susținerea activităților economice
- Măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice
- Măsura 2.4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice

Programul 3 „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale”

- Măsura 3.1. Aprovizionare cu apă și sanitație
- Măsura 3.2. Eficientizarea energetică a clădirilor publice

Documentul unic de program pentru anii 2022 - 2024

Număr de proiecte incluse în DUP 2022 - 2024

Programul 1


„Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare”

Programul 2

„Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor”

Programul 3

„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale”



- Măsura 1.1. Valorificarea infrastructurilor de afaceri (VIA)
- Măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice (RUDISP)
- Măsura 2.4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice (MITERUP)
- Măsura 3.1. Aprovizionare cu apă și sanitație (AAS)

16 proiecte de dezvoltare regională incluse în DUP 2022 – 2024

14 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv 6 proiecte noi în anul 2024 – aprobate spre finanțare

13 Contracte de finanțare semnate cu APL I și II


37 proceduri de achiziții publice organizate privind contractarea lucrărilor de construcție și a serviciilor de supraveghere tehnică

19 contestații depuse privind contractarea lucrărilor de construcție și a serviciilor de supraveghere tehnică


8 decizii ANSC cu privire la anulare/reevaluare/respingere contestațiilor



Documentul unic de program pentru anii 2022 - 2024

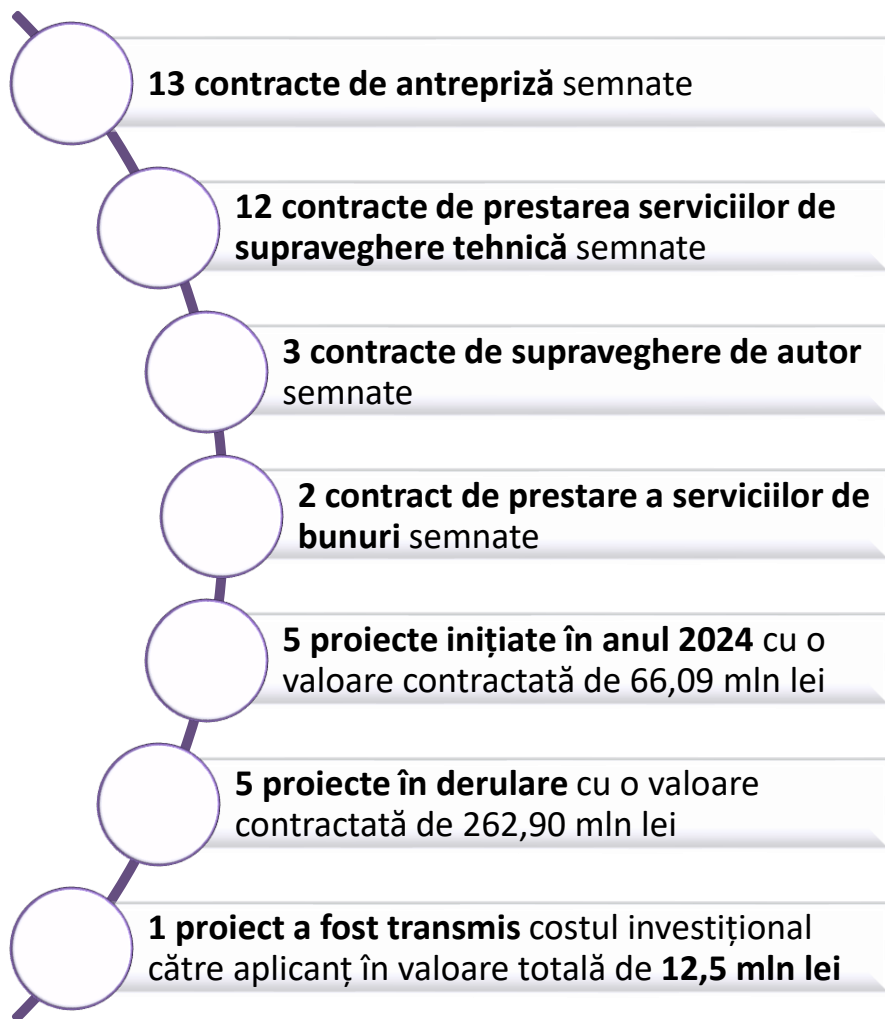

Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)

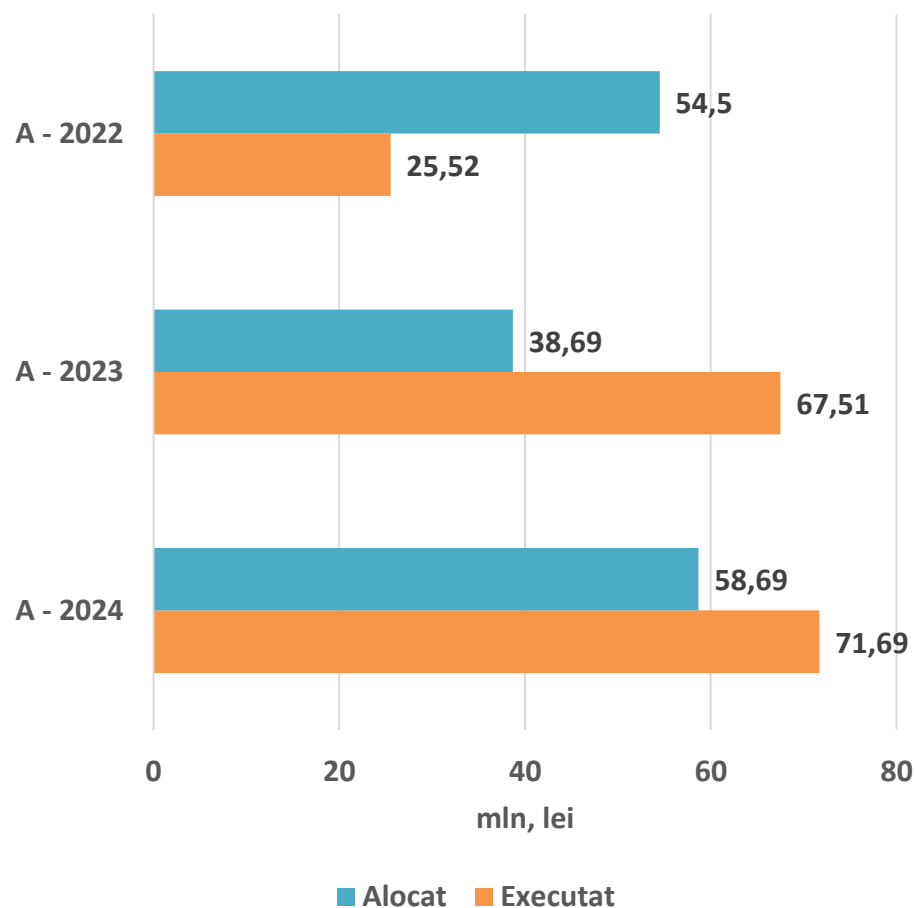



Program 1 | **S 1 11 016 L „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei**
Măsura 1.1 | **Economice Libere „Bălți””**

Obiectivul general al proiectului: Sporirea atractivității investiționale în economia RD Sud și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din regiune.

Implementat: 2022 – 2023 (8 luni calendaristice)

Suma contractată: 12,54 mln lei

Sursa de finanțare:
FNDRL - 11,28 mln lei (89,8374 %)
ZEL Bălți - 1,26 mln lei (10,1626 %)

Statutul proiectului: Obiect finalizat și costuri investiționale formate transmise către aplicant.

Rezultatul planificat: - Un obiectiv de suport în afaceri conectat la structura de acces și utilități publice.



Produsele proiectului

Realizat

2,1 km rețea electrică de tensiune înaltă de 10 kV

100 %

1,36 km rețea de apeduct

100 %

1,58 km rețea de canalizare

100 %

0,88 km rețea de gaze naturale de presiune medie

100 %





Program 1 | **S 1 11 027 C „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru**
Măsura 1.1 dezvoltarea noilor afaceri în regiune”

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea infrastructurii de suport al mediului de afaceri din regiune prin susținerea noilor companii – rezidente ale IACM

Perioada implementării: 2024 – 2025 (6 luni calendaristice contractat)

Suma contractată: 13,51 mln lei

Sursa de finanțare: FNDRL - 12,15 mln lei (89,97 %)
Consiliul raional Cimișlia - 1,36 mln lei (10,03 %)

Valorificat 2024: 2,08 mln lei sau 15,4 %

Statutul proiectului: Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 14.05.2024.
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 14.08.2024.

Rezultate planificate: - 1 obiect al infrastructurii de susținere a afacerilor conectat la utilități (apă, canalizare, gaz, energie electrică)
- Minim 100 locuri de muncă create



Program 1
Măsura 1.1

S 1 11 027 C „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune”



Produsele proiectului	Realizat
1 Hală de producere multifuncțională cu suprafața de 1181 m2 construită	50,4 %
racordare hală de producere la utilități (apă, canalizare, gaze, energie electrică)	19,2 %
teren amenajat cu suprafața de 0,35 ha	44,4 %





Program 2 | **S 2 23 025 C „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii**
Măsura 2.3 spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni”

Obiectivul general al proiectului:

Sporirea atractivității zonei de revitalizare Căușenii Vechi, prin îmbunătățirea situației socio-economice a sectorului, generarea locurilor de muncă și stimularea dezvoltării zonelor adiacente.

Perioada implementării:

2024 – 2025 (LOT 1 - 9 luni); (LOT 2 - 9 luni); (LOT 3 - 5 luni); (LOT 4 - 3 luni / 90 zile)

Suma contractată:

15,71 mln lei

Sursa de finanțare:

FNDRL - 13,75 mln lei (87,51 %)

Primăria orașului Căușeni - 1,96 mln lei (12,49 %)

Valorificat 2024:

0,2 mln lei sau 1,44 %

Statutul proiectului:

Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 21.10.2024 (LOT 1). Lucrări de construcție în curs de desfășurare

LOT 2 semnat Contract LCM și SRT, inițiere în anul 2025

LOT 3 semnat Contract LCM și SRT, inițiere în anul 2025, in decembrie 2024

LOT 4 semnat Contract bunuri, inițiere în anul 2025

Rezultate planificate:

- O localitate beneficiară de revitalizare urbană;



Program 2 | **S 2 23 025 C „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii**
Măsura 2.3 spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni”

LOT	Produsele proiectului	Realizat
LOT 1	1 instituție publică renovată (Reparația acoperișului și termoizolarea fațadelor clădirii Grădiniței pentru Copii nr.6 „Lia Ciocârlia” din or. Căușeni)	26,8 %
LOT 2	1 instituție publică renovată (Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.)	În proces
LOT 3	1 stadion multifuncțional (adaptat la condiții de odihnă activă și activități sportive solicitate de locuitori.)	În proces
LOT 4	6 terenuri de joacă aferente (grădinița de copiii nr.6 din Căușenii Vechi și curțile a patru blocuri locative amenajate și asigurate cu echipament pentru organizarea activităților în aer liber;	În proces





Program 2 | **S 2 23 002 DR „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din**
Măsura 2.3 | **municipiul Cahul”**

Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii publice de educație timpurie – Grădinița Nr.4 „Zâmbetul” prin realizarea lucrărilor de reconstrucție

Perioada implementării: 2024 – 2025 (10 luni calendaristice)

Suma contractată: 12,36 mln lei

Sursa de finanțare: FNDRL - 11,12 mln lei (90,0%)
Primăria orașului Cahul - 1,24 mln lei (10,0 %)

Valorificat 2024: 3,01 mln lei sau 24,27 %

Statutul proiectului: Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 17.06.2024.
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 05.08.2024 - reluate din 17.10.2024;
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 31.10.2024.



Rezultate planificate:

- Condiții optime de învățare create pentru cca 237 de copii și angajați din cadrul Grădiniței nr. 4 „Zâmbetul”;
- Pierderi de căldură și a consumurilor energetice reduse cu 30%;
- Emisii poluante reduse cu 30%.



Program 2
Măsura 2.3

S 2 23 002 DR „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din
municipiul Cahul”

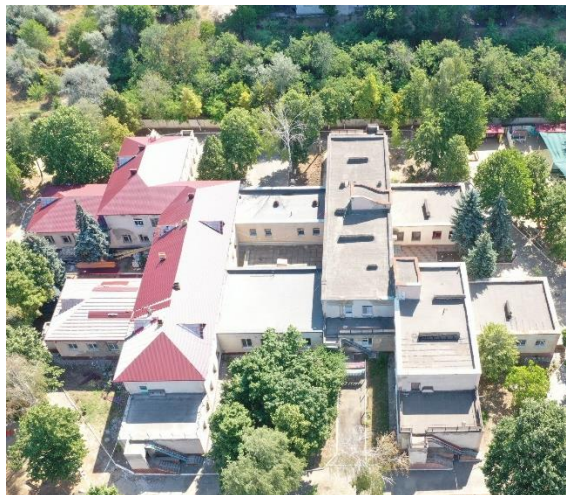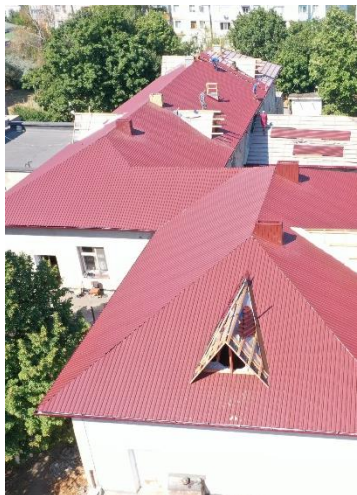

Produsele proiectului	Realizat
1 clădire cu performanță energetică sporită de 6.189,7 m2 (suprafață termoizolată)	3,3 %
3.334,9 m2 de acoperiș renovat	49,0 %
440,0 m2 de pereu renovat	În proces
1180,0 m2 de pavaj nou construit	În proces
4.252 m2 de spații verzi renovate	În proces
2 grupe renovate	În proces



Program 2 | **S 2 23 001 DR „Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric**
Măsura 2.3 | **Kizil”**

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea calității vieții locuitorilor, prin dezvoltarea economică și valorificarea patrimoniului cultural-istoric, incluziune socială și îmbunătățirea infrastructurii tehnic-edilitare

Perioada implementării:

2024 – 2025 (12 luni calendaristice)

Suma contractată:

8,86 mln lei

Sursa de finanțare:

FNDRL - 7,98 mln lei (90,0%)

Primăria orașului Ștefan Vodă - 0,88 mln lei (90,0%)

Valorificat 2024:

1,4 mln lei sau 15,6 %

Statutul proiectului:

Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 20.05.2024.

Lucrări de construcție sunt sistate din data de 08.11.2024

Rezultate planificate:

- 1 obiectiv turistice amenajate;
- 1 traseu tematic comun conectat la rețeaua regională;





Program 2
Măsura 2.3

S 2 23 001 DR „Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric
Kizil”



Produsele proiectului	Realizat
1 pod din piatră (de Cosăuți peste râul GEALAIR cu specific de arhitectură medievală)	În proces
1220 m (pavaj pietonal)	100 %
1,6 ha (spațiu înverzit)	În proces
610 m (albia râului curățită și pavată)	În proces
1 fântâna germană reconstruită	În proces
1 clopotnița germană reconstruită	53 %
1 parcare pentru automobile	100 %
1 pistă pentru bicicliști delimitată	100 %

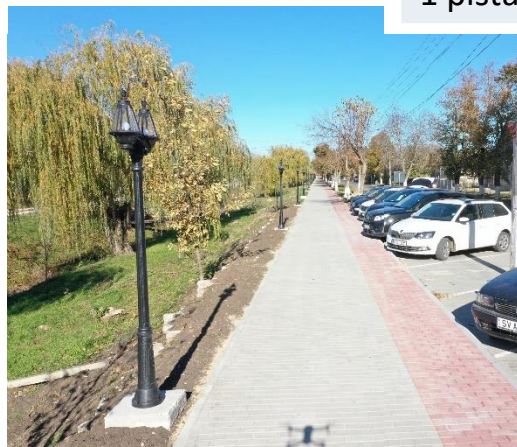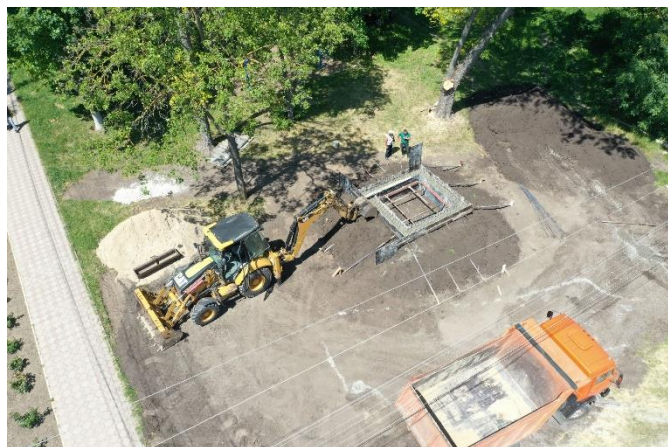



Program 2
Măsura 2.3

S 2 23 003 DR „Crearea complexului turistic „Valul lui Traian””

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea obiectivului turistic natural și istoric, Valul lui Traian de Sus, cu o lungime totală de 138 km (pe teritoriul Republicii Moldova), care își are originile în România, iar pe teritoriul țării noastre, începe din orașul Leova, la vest și trece prin raioanele Cimișlia și Căușeni, la est.

Perioada implementării:

2024 – 2025 (9 luni calendaristice)

Suma contractată:

15,63 mln lei

Sursa de finanțare:

FNDRL - 14,07 mln lei (90,0%)

Primăria orașului Leova - 1,56 mln lei (10,0%)

Valorificat 2024:

3,28 mln lei sau 20,96 %

Statutul proiectului:

Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 07.06.2024.

Lucrări de construcție sunt sistate din data de 01.11.2024

Rezultate planificate:

- 3 obiective turistice amenajate;
- 1 traseu tematic comun conectat la rețeaua regională.



Program 2
Măsura 2.3

S 2 23 003 DR „Crearea complexului turistic „Valul lui Traian””

Produsele proiectului	Realizat
1 zonă de recreere	În proces
2 atracții turistice (amenajate)	În proces
15 ha (teritoriu amenajat)	95,0 %
0,475 m de drum construit/renovat/reabilitat	În proces
10 eco-sfere	În proces





Program 3 | **S 3 31 012 C „Construcția apeductelor magistrale largara- Borogani, largara-
Măsura 3.1 Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în 4 localități”**

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea serviciului calitativ de aprovizionare cu apă potabilă prin cooperare regională a localităților din raionului Leova

Perioada implementării: 2023 – 2025 (14 luni calendaristice)

Suma contractată: 36,18 mln lei

Sursa de finanțare: FNDRL - 32,56 mln lei (89,9999 %)

Contribuția APL I și II - 3,62 mln lei (10,0001 %), din care:

Primăria comunei Tigheci – 1,03 mln lei;

Primăria comunei Băiuș - 0,9 mln lei;

Consiliul raional Leova – 1,69 mln lei.

Valorificat 2023 - 2024: 22,56 mln lei sau 62,36 %

Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 04.09.2023.

Statutul proiectului: Lucrări de construcție sunt sistate din data de 25.12.2023 - reluate din 29.01.2024
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 16.09.2024.


Rezultate planificate:

- 6 localități cu acces la servicii de aprovizionare cu apă;
- 8215 populație cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă îmbunătățit



Program 3 | **S 3 31 012 C „Construcția apeductelor magistrale largara- Borogani, largara- Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în 4 localități”**
Măsura 3.1

Produsele proiectului	Realizat
17,5 km (rețele de apeduct magistral)	96,3
44,33 km (rețele interioare de apeduct)	95,9
2 rezervoare de apă potabilă (V=150m ³)	15,0 %
2 castele de apă potabilă (V=50 m ³)	100 %
1 turn de apă (V=50 m ³)	100 %
2 stații de pompare a apei	10,0 %
1150 de brașamente la gospodării	75,4 %

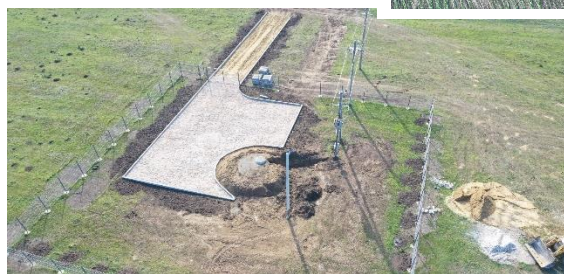



Program 3 | **S 3 31 005 L „Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu**
Măsura 3.1 | **conectarea a 14 localități”**

Obiectivul general al proiectului:

Asigurarea accesului la sursa sigură de aprovizionare cu apă potabilă a populației din localitățile: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadâr, Colibabovca și Cneazevca din raionului Leova

Perioada implementării:

2023 – 2025 (20 luni calendaristice)

Suma contractată:

53,94 mln lei

Sursa de finanțare:

FNDRL - 48,33 mln lei (89,6 %)

Consiliul raional Leova - 5,61 mln lei (10,4 %)

Valorificat 2023 - 2024:

22,52 mln lei sau 41,75 %

Statutul proiectului:

Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 06.11.2023.

Lucrări de construcție sunt sistate din data de 28.12.2023 - reluate din 21.01.2024

Lucrări de construcție sunt sistate din data de 20.05.2024.

Rezultate planificate:

- 14 localități cu acces la servicii de aprovizionare cu apă;

- 10341 populație cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă îmbunătățit



Program 3 | **S 3 31 005 L „Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu**
Măsura 3.1 | **conectarea a 14 localități”**

Produsele proiectului	Realizat
54,6 km rețele de apeduct magistral	97,10 %
3 rezervoare de apă (V=50m ³)	66,67 %
4 stații de pompare a apei	100 %
14 stații de dezinfectare a apei	59,0 %





Program 3
Măsura 3.1

S 3 31 034 C „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia”

Obiectivul general al proiectului: Creșterea confortului urban și a atractivității orașului Cimișlia pentru cetățeni și investitori prin extinderea sistemului de canalizare conform standardelor

Perioada implementării: 2022 – 2025 (14 luni calendaristice)

Suma contractată: 36,3 mln lei

Sursa de finanțare: FNDRL - 32,14 mln lei (88,7013 %)
Primăria orașului Cimișlia – 4,16 mln lei (11,2987 %)

Valorificat 2022 - 2024: 31,1 mln lei sau 85,7 %

Statutul proiectului: Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 12.09.2022.
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 16.12.2022 - reluate din 22.01.2023;
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 03.04.2023 - reluate din 01.05.2023;
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 30.10.2023 - reluate din 20.08.2024;
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 07.11.2024;
La data de 28.11.2024 recepționarea a 2 obiecte din cele 5 contractate.

Rezultate planificate:

- O localitate urbană cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare;
- 5200 de locuitori conectați la sistemul de canalizare;
- 277 de întreprinderi conectate la sistemul de canalizare.



Program 3
Măsura 3.1

S 3 31 034 C „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia”

Produsele proiectului

Realizat

1 SPAU construită

în proces

27,3 km rețea de canalizare

100 %





Program 3 | **S 3 31 002 C „ Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””**
Măsura 3.1

Obiectivul general al proiectului:

Un mediu curat și sigur, prin impactul diminuat asupra sănătății oamenilor, și sistemelor fluviale de la apele netratate, noi oportunități economice pentru întreprinderea municipală din orașul Căușeni

Perioada implementării:

2022 – 2025 (24 luni calendaristice)

Suma contractată:

73,59 mln lei

Sursa de finanțare:

FNDRL - 60,77 mln lei (82,59 %)

Consiliul raional Căușeni – 12,82 mln lei (17,41 %)

Valorificat 2022 - 2024:

55,65 mln lei sau 78,18 %

Statutul proiectului:

Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 16.11.2022.

Lucrări de construcție sunt sistate din data de 03.04.2023 - reluate din 01.05.2023;
Lucrări de construcție sunt sistate din data de 27.12.2023 - reluate din 29.01.2024
Lucrări de construcție în curs de desfășurare.

Rezultate planificate:

- Stația de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni cu capacitatea de 5000 m³/24h;
- Conectarea a 1000 gospodării casnice la sistemul nou de canalizare;
- Extinderea serviciului al ÎM „Apă-Canal”.



Program 3 | **S 3 31 002 C „ Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””**
Măsura 3.1



Produsele proiectului	Realizat
1 SEAU reconstruită cu capacitatea de 5000 m ³ /24h	95,1 %
3 SPAU construite	100 %
10,4 km rețea de canalizare	100 %








Program 3 | **S 3 31 026 C „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin**
Măsura 3.1 | **extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului”**

Obiectivul general al proiectului:	Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației și calității mediului ambiant în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă prin asigurarea accesului la servicii de sanitație de calitate
Perioada implementării:	2022 – 2025 (8 luni + 246 zile + 6 calendaristice)
Suma contractată:	62,5 mln lei
Sursa de finanțare:	FNDRL - 53,4 mln lei Consiliul raional Căușeni - 9,1 mln lei
Valorificat 2022 - 2024:	49,22 mln lei sau 78,73 %
Statutul proiectului:	Ordinul de începere a lucrărilor a fost preluat de către OE la data de 05.12.2022. Lucrări de construcție sunt sistate din data de 16.12.2022 - reluate din 22.01.2023; Lucrări de construcție sunt sistate din data de 03.04.2023 - reluate din 01.05.2023; Lucrări de construcție sunt sistate din data de 12.06.2023 - reluate din 01.11.2023; Lucrări de construcție sunt sistate din data de 28.12.2023 - reluate din 15.01.2024; Lucrări de construcție sunt sistate din data de 16.01.2024 - reluate din 24.01.2024; Lucrări de construcție sunt sistate din data de 03.05.2024 - reluate din 14.05.2024; Lucrări de construcție în curs de desfășurare.
Rezultate planificate:	- 6 localități cu acces la sistemul de canalizare - 7654 populație cu acces la sistemul îmbunătățit de canalizare;



Program 3 | **S 3 31 026 C „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin**
Măsura 3.1 | **extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului”**

Produsele proiectului	Realizat
19,3 km rețea de canalizare;	100 %
4 SPAU construite;	99,0 %

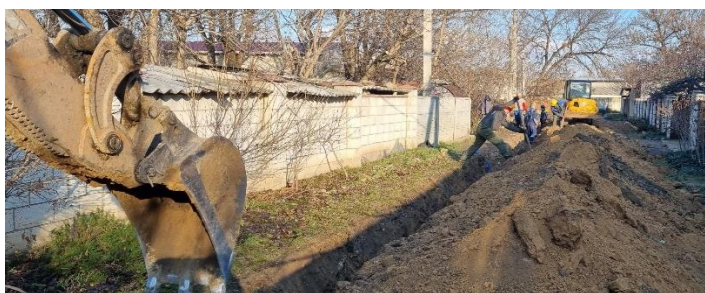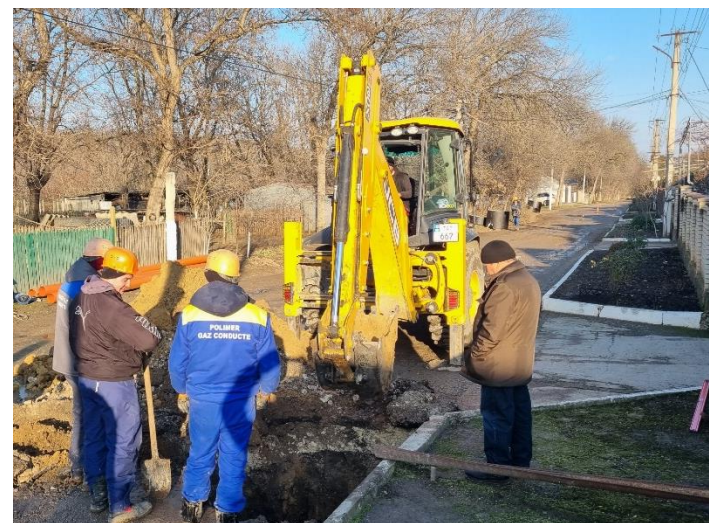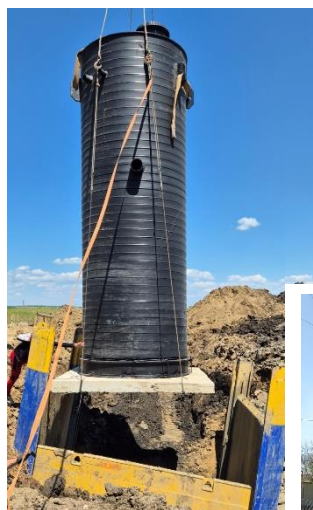




**Perioada
2010-2024**

- Implementate 56 (12) proiecte de dezvoltare regională cu o valoare de 1.340 mln lei:**
- 44 (12) proiecte cu finanțare din FNDRL (857 mln lei);
 - 12 proiecte cu finanțare externă (383 mln lei);
 - Cofinanțarea de către APL I și II a 26 proiecte din 56 (100 mln lei).

Mijloace financiare valorificate în RD Sud în 2011 – 2024 (mln lei)

— FNDRL — Surse externe — APL I și II

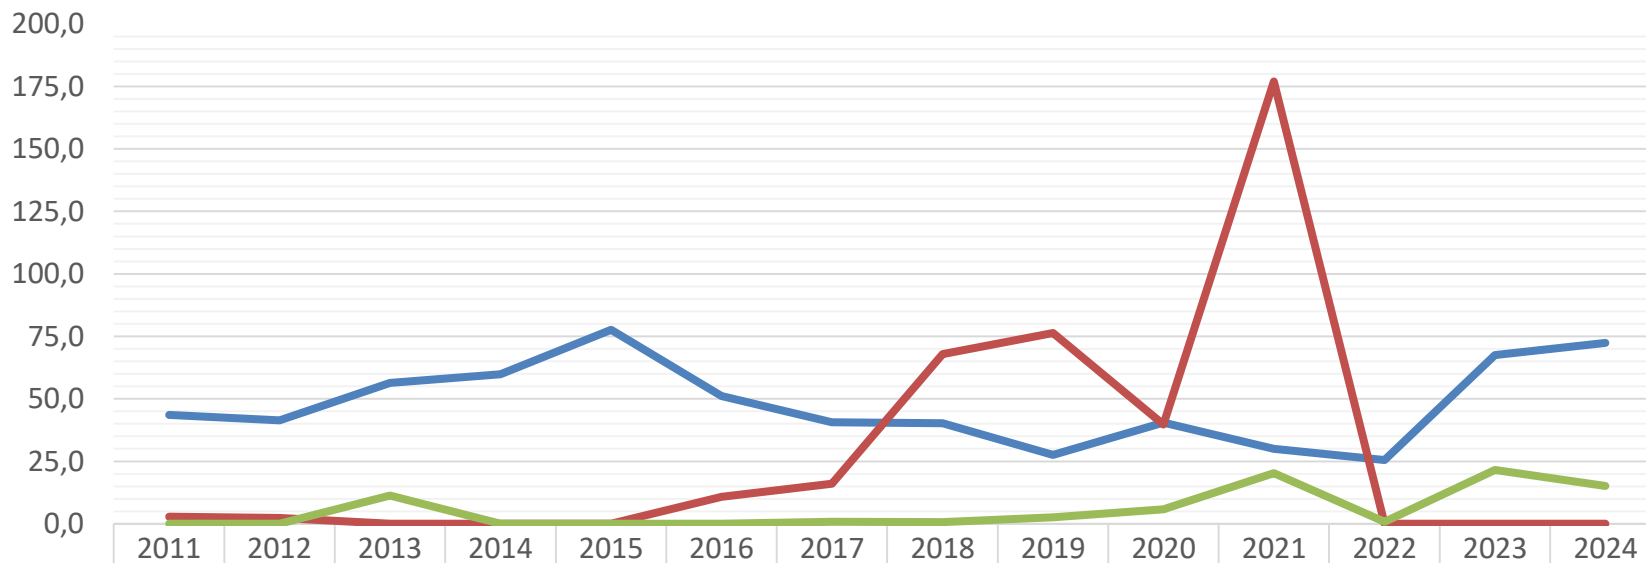


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FNDRL	43,6	41,4	56,4	59,8	77,7	51,1	40,6	40,2	27,6	40,5	30,0	25,5	67,5	72,4
Surse externe	2,8	2,3	0,0	0,0	0,0	10,8	16,0	67,9	76,4	39,7	177,0	0,0	0,0	0,0
APL I și II	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	2,6	5,8	20,3	0,8	21,6	15,2




Perioada
2010-2024

Implementarea 56 (12) proiecte de dezvoltare regională cu o valoare de **1.340 mln lei**,
pe raioane din Regiunea de Dezvoltare Sud

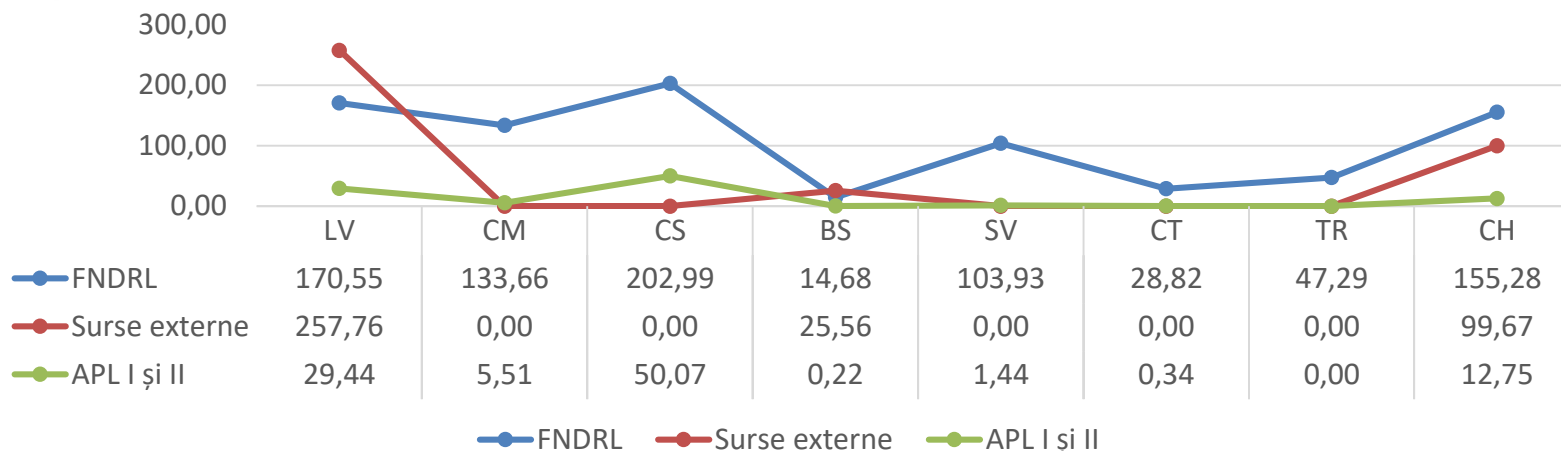

Număr proiecte

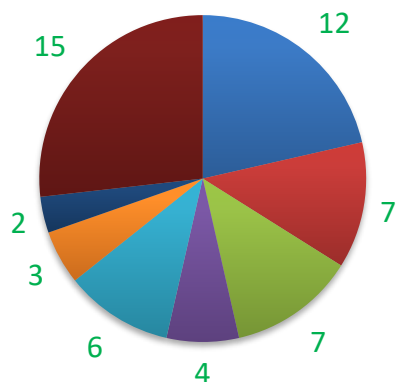

- LEOVA
- CIMIȘLIA
- CĂUȘENI
- BASARABEASCA
- ȘTEFAN VODĂ
- CANTEMIR
- TARACLIA
- CAHUL

mln lei





2025 Activitățile planificate ale Agenției Achiziții publice:

Proiect:
„Finalizarea sistemului de iluminat public
stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul”

- Finalizarea procedurii de achiziționare a lucrărilor de construcție;
- Semnarea Contractului de antrepriză;
- Inițierea lucrărilor de construcție.

Proiect:
„Construcția apeductelor interioare în satele
Tomai și Sărata- Răzeși, raionul Leova”

- Organizarea procedurilor de achiziții privind contractarea lucrărilor și serviciilor;
- Evaluarea ofertelor.

Proiect:
„Finalizarea stației de pompare a apelor
reziduale pentru îmbunătățirea
infrastructurii de canalizare în regiunea de
Nord-Vest a orașului Cimișlia”

- Organizarea procedurilor de achiziții privind contractarea lucrărilor și serviciilor;
- Evaluarea ofertelor.

Proiect:
„Finalizarea construcției sistemului de
evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea
Perjei, r-nul Cimișlia”

- Organizarea procedurilor de achiziții privind contractarea lucrărilor și serviciilor;
- Evaluarea ofertelor.

Trimestru I
2025



2025

Activitățile planificate ale Agenției

Managementul contractelor:

Proiect: Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi”

Proiect: Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului

Proiect: Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune

Proiect: Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni

Proiect: Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din municipiul Cahul

Proiect: Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Kizil

Proiect: Crearea complexului turistic „Valul lui Traian”

Proiect: Construcția apeductelor magistrale largara- Borogani, largara- Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în 4 localități

Proiect: Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea a 14 localități

Proiect: Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia

Trimestru I 2025

- Organizarea recepției la terminarea lucrărilor;

- Reluarea lucrărilor de construcție

- LOT 1 - continuarea lucrărilor de construcție;
- LOT 2, 3 și 4 – Inițierea lucrărilor de construcție.

- Reluarea lucrărilor de construcție



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

VĂ MULȚUMIM!

bd. Ștefan cel Mare, 12,
or. Cimișlia,
Republica Moldova, MD-4101

Tel: +373 241 2 62 86
Fax: +373 241 2 62 86
Email: adrsud@adrsud.gov.md
