



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Aprobat: _____

Nicolae HRISTOV
Director ADR Sud


„_____” _____ 2025

Coordonat: _____

Angela ȚURCANU
Secretar general MIDR

„_____” _____ 2025

**RAPORT de activitate
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2024**

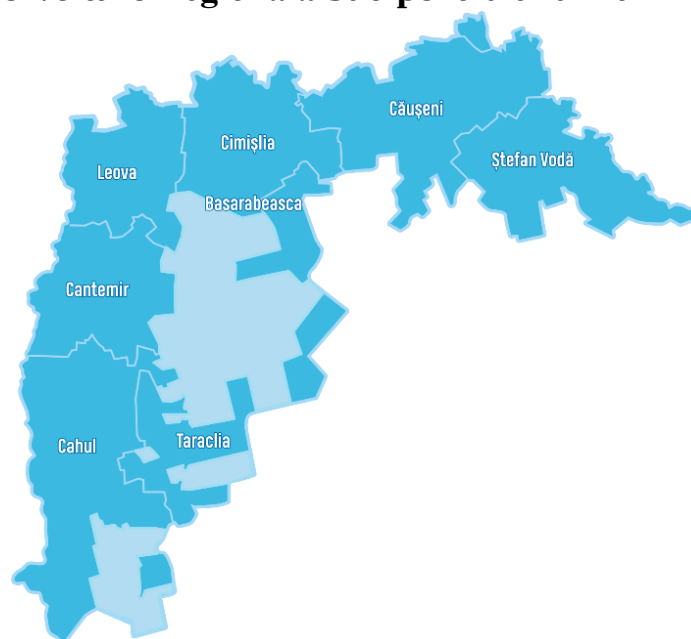

Cimișlia 2025

Indicatori de performanță					
Domeniu	Denumire indicator	Valoare de referință 2023	Valoare țintă	Grad de realizare	
Performanță eficientă și	Numărul proiectelor de dezvoltare regională implementate (nr./ %)	6	13	1	
	Populația cu acces la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare construite/reabilite (nr./ %)	18492	28036	25 899/ 92,4	
	Numărul de proiecte atrase	-	2	2	
	Numărul de noi documente elaborate (studii, ghiduri etc.)	-	1	1	
	Numărul de parteneriate stabilite	-	1	2	
Politici publice	Gradul de implementare a proiectelor incluse în Documentul Unic de Program, (%)	40,0	100,0	63,1	
	Rata de implementare a Programului Operațional Regional (POR) , (%)	42,4	66,9	58,7	
	Rata de participare a membrilor CRD la ședințele organizate, (%)	50,0	55,0	76,92	
	Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției, (%)	66,7	89,0	94,39	
Management instituțional	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte, (%)	155,49	100,0	139,94	
	Gradul de asigurare cu personal, (%)	62,5	82,5	81,58	
	Rata fluctuației personalului din cadrul instituției publice, (%)	38,46	16,67	0	
	Ponderea angajaților instruiți, (%)	0	50,0	66,67	
	Nivelul de transparență a activității, inclusiv financiară	90	100	100	
	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al autorității (nr. vizualizărilor, aprecierilor, urmăritorilor, beneficiarilor de programe/activități etc. / %)	150108	160000	240201	
	- Număr de vizitatorilor unici ai paginii web / %	10800	12800	1019499	
	- impactul postărilor (nr. vizualizărilor spoturilor video și nr. aprecierilor postărilor / %)	74400	84400	108890	

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
Obiectiv 1: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact							
- 1 studiu de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud elaborat; - 4 ședințe ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud desfășurate.							
1.	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)	Nr. consultări oferite APL aferente elaborării/actualizării Programelor de Revitalizare Urbană; Nr. consultări oferite mun. Cahul în implementarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM 2021-2027	01.01.2024-31.12.2024	Secția planificare și cooperare regională Secția managementul integrat al proiectelor Secția monitorizare și evaluare	Șef SPCR	Realizat - 7 scrisori remise către APL I aferente elaborării / actualizării/implementării PRU; - 2 ședințe de lucru cu privire la evaluarea și elaborarea PRU Căușeni; - 3 ședințe cu mun. Cahul aferente implementării PNDOPC; - 5 consultări oferite mun. Cahul aferente implementării PNDOPC; - 1 Plan de acțiuni ADR Sud-UIP Cahul pentru implementarea PNDOPC, Etapa I, 2024 elaborat și aprobat; - 6 consultări oferite APL I aferente elaborării/actualizării /implementării Programelor de Revitalizare Urbană.	69,07

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
2.	Actualizarea componenței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	1 concurs public organizat și desfășurat Componența CRD Sud actualizată	02.01.2024-09.02.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat - 1 concurs public organizat și desfășurat; - Componența CRD Sud actualizată.	24,12
3.	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese-verbale întocmite Nr. decizii aprobate	01.02.2024-31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat - 3 ședințe organizate și desfășurate; - 3 procese-verbale; - 12 decizii aprobate.	36,50
4.	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR	Șef SPCR	Realizat 1 participare în cadrul sesiunii de instruire pentru membrii GNL privind implementarea noilor Programe de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională 2021-2027 (28-29.02.2024).	4,66
5.	Participare în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente domeniilor de intervenție ale politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte depuse Nr. proiecte câștigate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD Șef SMIP	Realizat - 3 Cereri complete de finanțare elaborate și depuse în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, Programul de dezvoltare regională, Apel pe listă, cu finanțare din sursele FNDRL;	51,58

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 2 proiecte desemnate câștigătoare și incluse în Documentul unic de program 2022-2024.	
6.	Participarea la consultările publice privind elaborarea, modificarea unor hotărâri ale Guvernului aferente implementării politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte de hotărâri de guvern consultate Nr. propuneri înaintate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME	Director ADR Sud Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	Realizat - 2 proiecte de hotărâri de guvern examinate; - 1 participare la consultarea publică.	4,81
7.	Elaborarea studiului de specializare inteligentă a RDS	1studiu elaborat	01.07.2023-31.03.2024	SPCR SME	Șef SPCR	Realizat - 1 Studiu de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Sud elaborat și prezentat CRD Sud în cadrul ședinței din 17.12.2024.	59,62
8.	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	Nr. consultări oferite actorilor regionali 1 parteneriat stabilit/facilitat	02.01.2024-31.12.2024	Director ADR Sud SPCR/SME	Șef SPCR	Realizat - 12 consultări oferite actorilor regionali; - 2 Acorduri de colaborare elaborate, coordonate și semnate.	14,37
9.	Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RDS cu suportul partenerilor de dezvoltare	Nr. proiecte cartografiate 1 bază de date regională și actualizată	01.05.2024-28.06.2024	SME/SPCR	Șef SME Șef SPCR Specialist monitorizare și evaluare	Realizat - 1 bază de date actualizată.	9,80
10.	Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare	Nr. evenimente organizate/facilitate 60	01.05.2024-31.10.2024	SPCR/SMIP/SME/SA	Șef SPCR	Realizat	56,57

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	a potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	participanți la evenimente				- 1 eveniment - „15 ani de dezvoltare regională” a ADR Sud, Centru și Nord organizat și desfășurat în parteneriat; - 170 participanți la eveniment.	
11.	Elaborarea Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2024 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan anual de implementare a POR Sud 2022-2024 elaborat și aprobat	02.01.2024-31.03.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Șef SMIP	Realizat - 1 plan anual de implementare a POR Sud 2022-2024 elaborat și aprobat	19,62
12.	Actualizarea Planului de implementare a POR Sud 2022-2024 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan de implementare a POR Sud 2022-2024 actualizat și aprobat	03.06.2024-30.08.2024	SPCR	Șef SPCR	În curs de realizare Urmare a discuțiilor cu MIDR, s-a decis ca Planul de implementare a POR Sud 2022-2024 să nu fie actualizat în perioada curentă cu cererile de finanțare aplicate în cadrul apelului pe listă 2023 FNDRL.	0,0
13.	Elaborarea Programului Operațional Regional Sud 2025-2027	Elaborarea Programului Operațional Regional inițiat	01.09.2024-31.12.2024	SPCR SMIP/SME	Șef SPCR	În curs de realizare - Elaborarea POR inițiată.	51,05
14.	Actualizarea Programului Regional Sectorial privind sporirea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Sud	1 raport de evaluare a PRS elaborat 3 ședințe ale grupului de lucru organizate	01.05.2024-31.12.2024	SME SPCR	Șef SME Specialist în monitorizare și evaluare Șef SPCR	Neinițiat Această activitate nu a fost inițiată din cauza lipsei de cadre în agenție.	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		Actualizarea PRS privind sporirea atractivității turistice a RDS inițiată			Specialist în planificare		
15.	Elaborarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul de referință 2025 și prezentarea spre aprobare de către MIDR	1 plan de activitate elaborat și aprobat	15.07.2024-20.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	În curs de realizare - 1 Plan de activitate în curs de elaborare.	43,87
Obiectiv 2: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - cca 10 000 de locuitori ai zonelor neiluminate; - 3 obiective turistice amenajate; - 2 obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice; - 33 localități ce au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare; - 28036 persoane cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare.							
Direcția prioritară 1.1. CONSOLIDAREA ROLULUI ȘI FUNCȚIILOR ORAȘELOR ÎN SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	5 Contracte de finanțare semnate	17.11.2023	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 5 contracte de finanțare.	22,20
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	4 anunțuri de intenții incluse în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 5 anunțuri de intenții incluse în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP.	5,63
		4 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 5 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor.	5,63

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		4 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 4 Licitații publice privind achiziționarea serviciile de responsabil tehnic.	5,63
		1 procedură de achiziții publice desfășurată pentru servicii de responsabil tehnic LP, 3 prin COP	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 4 proceduri de achiziții publice desfășurate.	2,19
		8 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 11 decizii de seamă de atribuire a contractelor de antrepriză și responsabil tehnic.	1,49
		8 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 8 dări de seamă de atribuire a contractelor de antrepriză și responsabil tehnic.	1,25
3.	Semnarea contractelor de antrepriză servicii	8 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	01.03.2024-01.08.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 14 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate.	11,25
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	11 vizite de monitorizare desfășurate 11 ședințe desfășurate 1 zonă de recreere 2 atracții turistice amenajate	01.04.2024-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Realizat - 21 vizite de monitorizare desfășurate - 31 ședințe desfășurate - 26,8 % (LOT 1) în proces de renovare IP –	68,92

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		15 ha de teritoriu amenajat 10 ecosfere create 4 poduri construite cu specific de arhitectură medievală 610 m de albia râului curățită și pavată 1 parcare pentru automobile 3 instituții publice renovare 9 terenuri de joacă aferente grădiniței de copii amenajate și asigurate cu echipament pentru organizarea activităților în aer liber 88,8 km de rețele de cablu iluminare stradală modernizate 765 piloni montați 2397 de corpuri de iluminat LED instalate				Grădinița nr.6. Lia Ciocârlia. - 334,9 mp (tâmplărie PVC, termoizolarea canalelor de ventilare) – 5,41 % - 1 634,0 mp de acoperiș renovat - 49,0 % - 1220 m de pavaj pietonal; - 53 % din clopotnița germană reconstruită; - 1 parcare pentru automobile; - pistă pentru bicicliști delimitată. - 95,0 % din 15 ha de teritoriu amenajat;	
5.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	2 acte de recepție la terminarea lucrărilor semnate	01.09.2024-01.10.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Neinițiat activitatea dată va fi posibil de organizat doar după finanțarea integrală a proiectului	0,0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
6.	Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării	1 act de predare-primire semnat 1 raport elaborat și transmis în termen	01.10.2024-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Neinițiat activitatea dată va fi posibil de organizat doar după finanțarea integrală a proiectului și finalizarea lucrărilor de construcție	0,0
Direcția prioritară 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE DE BAZĂ DIN REGIUNE							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	7 Contracte de finanțare semnate	01.03.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat -7 Contracte de finanțare semnate	11,25
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	01.03.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat -1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	1,40
		2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor				În curs de Realizare 1 anunț de participare publicat	2,81
		2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md				În curs de Realizare 1 anunț de participare publicat	2,81
		2 proceduri de achiziții publice desfășurate				Realizat 2 proceduri de achiziții publice desfășurate	0,94
		2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele				Realizat	0,95

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				- 4 Decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP.	
		2 dări de seamă de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				Realizat - 2 dări de seamă de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP.	0,09
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	14 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	01.07.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 13 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate.	11,25
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	15 vizite de monitorizare desfășurate 12 ședințe desfășurate 71,1 km rețele de apeduct magistral construit 89,2 km rețele de apeduct interne 11 Rezervoare de apă construite 6 stații de pompare a apei construite 16 stații de clorinare cu hipoclorit de sodiu construite 1 stație de epurare modernizată	01.09.2022-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Realizat - 37 vizite de monitorizare organizate; - 43 ședințe de lucru organizate; - 62,35 km rețele apeducte magistrale construit; - 11,76 km de rețele de canalizare; - 20,65 km de rețea de apeduct intern; - 95,1 % de modernizarea a stației de epurare - 7 SPAU realizat la 100%. - 2 rezervoare (V=50 m3); - 47 de cămine de vizitare a magistrale;	66,67

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		49,8 km rețele de canalizare construite 8 stații de pompare a apelor uzate construite 1 documentație de proiect				- 2 Stație de pompare; - 1 rezervor (castel) (V=25 m3) - 4 stații de pompare a apei; - 4 stații de dezinfectare a apei.	
5.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	2 acte de recepție la terminarea lucrărilor semnate	01.09.2024-01.10.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Realizat - 2 acte de recepție la terminarea lucrărilor.	63,02
6.	Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării	2 acte de predare-primire semnate 2 rapoarte elaborate și transmise în termen	01.11.2024-31.12.2024	Șef SMIP		Realizat - 2 acte de predare-primire semnate	63,02
Direcția prioritară 2.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SUPORT ÎN AFACERI							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	2 Contracte de finanțare semnate	01.03.2022-17.11.2023	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 3 contracte de finanțare	11,25
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	01.04.2022-01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	9,00
		2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor				Realizat - 2 anunțuri de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către	

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						AAP, spre publicare în BAP	
		2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md				Realizat - 2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md	
		2 proceduri de achiziții publice desfășurate				Realizat - 2 proceduri de achiziții publice desfășurate	
		2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				Realizat 2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP	
		2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				Realizat - 2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP	
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	6 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	15.08.2022-01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 6 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	7,50
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	4 vizite de monitorizare desfășurate 4 ședințe desfășurate	12.09.2022-05.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Realizat - 9 vizite de monitorizare desfășurate;	66,67

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		2,4 km de rețele electrice de tensiune înaltă 1,41 km rețele de apeduct 1,58 km rețele de canalizare 0,87 km rețele de gaze naturale construcția halei de producere cu suprafața totală de 1191 m2 0,39 ha amenajarea terenului adiacent				- 10 ședințe de lucru organizate; - 2,4 km de rețele electrice de tensiune înaltă; - 1,41 km rețele de apeduct; - 1,58 km rețele de canalizare; - 0,87 km rețele de gaze naturale; - 591 mp (50,04 %, raportat la costul lucrărilor executate de tipul respectiv); - 1520 m2 teren amenajat (44,38 %, raportat la costul lucrărilor executate de tipul respectiv). - conectarea halei de producere la utilități: 60 ml - apeduct de racord; 10 ml - linie de canalizare de racord; 33 ml - gazoduct de racord.	
5.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	05.12.2023-01.04.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor	Realizat - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	63,02

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
6.	Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării	1 act de predare-primire semnat 1 raport elaborat și transmis în termen	01.04.2024-01.06.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor	Realizat - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen.	63,02
Obiectiv 3: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV-FINANCIAR ȘI DE COMUNICARE AL INSTITUȚIEI							
Indicatori de impact - Executarea devizului anual de venituri și cheltuieli; - Majorarea gradului de asigurare cu personal a instituției; - Reducerea ratei fluctuației personalului din cadrul instituției; - Majorarea ponderii concursurilor finalizate cu succes în totalul concursurilor organizate; - Creșterea fondului de cheltuieli alocate pentru formarea profesională per salariat în ADR; - 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat; - 1 registru al riscurilor elaborat; - Majorarea gradului de transparență a activității Agenției.							
1.	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului operațional pentru anul de gestiune și rectificare la necesitate.	1 deviz anual de venituri și cheltuieli executat Nr. de rectificări la devizul anual de venituri și cheltuieli operate Nr. solicitărilor de plată executate Nr. ordinelor de plată executate	02.01.2024-30.12.2024	SA	Șef SA/Contabil-șef Contabil	Realizat - 1 deviz anual de venituri și cheltuieli executat; - 3 rectificare devizului anual de venituri și cheltuieli; - 113 solicitări de plată pentru cheltuieli operaționale și proiecte investiționale; - 497 ordine de plată executate.	166,92
2.	Raportarea gradului de executare a bugetului operațional și prezentarea rapoartelor aferente	Nr. rapoartelor (lunare, trimestriale, semestriale, anuale)	25.01.2024-25.12.2024	SA	Șef SA/Contabil-șef	Realizat 50 rapoarte (lunare, trimestriale, semestriale, anuale).	166,92

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	instituțiilor abilitate și partenerilor de dezvoltare				Contabil		
3.	Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR Sud pentru anul 2025	1 deviz de venituri și cheltuieli elaborat 1 schemă de încadrare 1 calcul al fondului de retribuire a muncii 1 notă explicativă	01.12.2024-31.12.2024	SA	Șef SA/Contabil Șef	În curs de realizare - În proces de aprobare schema de încadrare pentru anul 2025; - Definitivarea cheltuielilor pentru activitatea operațională agenției pentru 2025 inițiată (90% calcule efectuate din deviz de venituri și cheltuieli, pentru bunuri și servicii, inclusiv nota explicativă).	23,87
4.	Asigurarea integrității patrimoniului instituției	1 inventariere anuală organizată	01.11.2024-30.11.2024	SA	SA/Contabil șef Contabil	Realizat - 1 inventariere anuală organizată.	21,84
5.	Actualizată politicilor contabile	1 politică de contabilitate elaborată	01.12.2024-31.12.2024	SA	Șef SA/ Contabil șef	Realizat - 1 politică de contabilitate elaborată.	26,52
6.	Elaborarea Planului anual de instruire al ADR pentru anul 2024	1 plan anual de instruire elaborat	02.01.2024-31.01.2024	SA/SPCR/ SMIP/SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizat - 1 plan anual de instruire elaborat.	8,74
7.	Recrutarea personalului și administrarea documentației aferente	Nr. anunțuri plasate Nr. concursuri desfășurate Nr. persoane angajate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizat - 1 anunț plasat; - 1 concurs de angajare desfășurat;	39,32

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		Nr. documentație de personal elaborate și completate				- 1 persoană angajată în funcție de specialist monitorizare și evaluare; - 1 dosar personal completat.	
8.	Elaborarea nomenclatorului și arhivarea dosarelor	Nomenclatorul dosarelor pentru anul 2024 elaborat și aprobat	02.01.2024-31.01.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizat Nomenclatorul dosarelor pentru anul 2024.	8,74
9.	Elaborarea actelor administrative referitoare la personal și activitatea de bază	Nr. ordine semnate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizat - 187 ordine cu privire la personal; - 63 ordine cu privire la activitatea de bază.	58,97
10.	Gestionarea și menținerea sistemului general de evidență a corespondenței	Nr. scrisori de intrare Nr. scrisori de ieșire	01.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizat - 1321 scrisori de intrare; - 863 scrisori de ieșire.	58,97
11.	Implementarea sistemului de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat 1 registru al riscurilor elaborat	02.01.2024-15.02.2024	SA	Jurist	Realizat - 1 declarație anuală privind CIM completată și publicată; - 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat; - 1 registru al riscurilor elaborat.	24,48

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
12.	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept Nr. scrisori elaborate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Jurist	Realizat - 10 reprezentări a instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept; - 43 scrisori elaborate (CNA, MIDR, Achiziții Publice, ANI, KFW, Cancelaria de Stat, etc).	97,92
13.	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile contractante în măsura delegării lor de către ADR Sud	Nr. acte examinate Nr. notelor informative elaborate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Jurist	Realizat -72 acte examinate (contracte, acorduri adiționale, memorandum de colaborare, puncte de vedere etc.) - 22 note informative elaborate (APL 1, operator economic);	97,92
14.	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud	Nr. materiale, comunicate de presă, anunțuri publicate Nr. vizualizări	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME/SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat - 125 publicații pe site www.adrsud.md ; - 131 publicații plasate pe rețele, 51 redistribuite; - 128407 vizualizări site; - 103638 impactul postărilor; - o pagină web cu conținut actualizat.	68,36
15.	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la	Nr. broșuri editate	02.05.2024-31.12.2024	SPCR SA	Șef SPCR	Realizat	75,35

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	potențialul de dezvoltare al RDS				Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	- 3 materiale promoționale machetate și tipărite; - 1 material elaborat și prezentat în format electronic; - 2 RollUp-uri executate; - materiale promoționale personalizate machetate și executate.	
16.	Promovarea politicii de dezvoltare regională și activității ADR Sud în mijloacele mass-media la nivel regional și local	5 intervenții media	01.01.2024-31.12.2024	Director ADR Sud	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat - 10 intervenții media.	11,78
Obiectiv 4: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE							
Indicatori de impact - Majorarea numărului de proiecte monitorizate post-implementare.							
1.	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor implementate	4 planuri de durabilitate elaborate/aprobate 2 note informative cu privire la evaluarea proiectelor de dezvoltare regională 2 vizite post implementare a proiectele finisate	01.03.2024-31.12.2024	SME/SMIP	Șef SME Specialist monitorizare și evaluare	În curs de realizare - 3 plan de durabilitate; - 1 notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse în cadrul proiectelor de dezvoltare regională; - 1 vizită post implementare în cadrul proiectul finisat.	20,00
2.	Activități de evaluare a proiectelor	2 rapoarte post implementare elaborate	01.03.2024-15.12.2024	SME/SMIP	Șef SME	În curs de realizare	59,90

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		4 vizite de monitorizare a proiectelor implementate			Specialist monitorizare și evaluare	- 2 rapoarte post implementare (1 raport elaborat 85 %) - 5 vizite post implementare în cadrul proiectului.	
3.	Activități de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare	20 vizite de monitorizare în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	01.03.2024-31.12.2024	SME/SMIP	Șef SME Specialist monitorizare și evaluare	Realizat - 25 vizite de monitorizare în teritoriu efectuate; - 25 fișe de observație elaborate.	23,04
4.	Elaborarea raportului cu privire la implementarea POR Sud 2022-2024	1 raport semestrial elaborat 1 raport anual elaborat	20.05.2024-15.01.2025	SME/SMIP/SPCR/SA	Șef SME Specialist monitorizare și evaluare	În curs de realizare - 1 raport semestrial elaborat ; - 1 raport anual privind implementarea POR Sud 2022-2024 inițiat.	43,78
5.	Elaborarea raportului trimestrial și anual privind activitatea ADR Sud în anul 2024	5 rapoarte elaborate	01.03.2024-15.01.2025	SME/SMIP/SPCR/SA	Șef SME Șef SPCR Șes SMIP Șef SA	Realizat 5 rapoarte elaborate.	23,04
6.	Elaborarea raportului semestrial și anual aferent implementării PNDOPC 2021-2027	2 rapoarte	02.01.2024-20.01.2025	SME/SMIP/SPCR/SA	Șef SME	Realizat 2 rapoarte elaborate semestrial și anual privind implementării PNDOPC 2021-2027.	23,04
Obiectiv 5: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - 4 angajați instruiți.							

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
1.	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud	Nr. participanți la instruiți Nr. instruiți organizate	02.01.2024-31.12.2024	SA SPCR/SMIP/ SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizat - 14 participanți la instruiți; - 23 instruiți organizate.	7,38
2.	Facilitarea/organizarea instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională	Nr. instruiți facilitate/organizate	02.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat 2 instruiți facilitate/organizate	23,74
3.	Organizarea instruirilor aferente apelurilor competitive de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL	Nr. sesiuni de instruire organizate Nr. consultări oferite Nr. cereri de finanțare recepționate	01.03.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD Specialist monitorizare proiecte Manager de oficiu	Realizat - 4 sesiuni de instruire desfășurate; - 103 consultări oferite APL I și II; -37 note conceptuale recepționate; - 128 participanți.	31,32
4.	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate Nr. beneficiari	01.03.2024-31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat - 2 vizite de studiu efectuate; - 1 vizită de studiu pentru membrii CRD Sud organizată; - 18 beneficiari.	5,37
Activități complementare							

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
1.	Elaborarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul de referință 2024 și prezentarea spre aprobare de către MIDR	1 plan de activitate elaborat și aprobat	13.11.2023-06.02.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	Realizat - 1 Plan de activitate al ADR Sud pentru anul 2024 elaborat și aprobat de către MIDR.	în limita bugetului aprobat
2.	Elaborarea și aprobarea Planurilor de activitate ale secțiilor din cadrul ADR Sud	4 planuri de acțiuni elaborate și aprobate	13.11.2023-20.03.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	Realizat - 4 Planuri de acțiuni ale SPCR, SMIP, SME și SA elaborate și aprobate.	în limita bugetului aprobat
3.	Elaborarea rapoartelor trimestriale de activitate al secțiilor din cadrul agenției pentru anul 2024	Nr. rapoarte elaborate	20.03.2024-25.01.2025	SPCR	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	Realizat - 16 rapoarte trimestriale elaborate.	în limita bugetului aprobat
4.	Colectarea, sistematizarea și prezentarea MIDR a datelor statistice privind înzestrarea APL I cu dotări și facilități	1 tabel sistematizat cu date statistice elaborat și remis către MIDR	17.01.2024-23.01.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist în monitorizare proiecte Specialist resurse umane Specialist în comunicare	Realizat: La solicitarea MIDR, au fost colectate, sistematizate și remise către MIDR date statistice cu privire la înzestrarea APL I cu dotări și facilități.	în limita bugetului aprobat
5.	Participare în cadrul evenimentului „Ziua profesională a autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”	1 participare la eveniment	28.01.2024	SPCR SMIP SME	Director ADR Sud Șef SPCR	Realizat: ADR Sud a participat și a promovat rolul și atribuțiile Agenției, CRD Sud, inclusiv rezultatele obținute pe parcursul activității în cadrul	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						evenimentului „Ziua profesională a autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”.	
6.	Elaborarea notei informative și raportului cu privire la implementarea PNDOPC în mun. Cahul și prezentarea către MIDR	1 notă informativă elaborată și prezentată MIDR 1 raport de progres elaborat și prezentat MIDR	30.01.2024-06.02.2024	SPCR SMIP SME	Șef SPCR	Realizat La solicitarea MIDR, au fost colectate și sistematizate datele aferente implementării PNDOPC în mun. Cahul, inclusiv au fost elaborate și remise în adresa MIDR Nota informativă și Raportul de progres cu privire la implementarea Programului.	în limita bugetului aprobat
7.	Participarea în cadrul sesiunilor de informare cu privire la noile Programe de cooperare	Nr. participări la sesiuni	14.02.2024 27.03.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat - Participare în cadrul sesiunii de informare Interreg Europe - Ziua de Informare/ Introducere în Program”; - Participare în cadrul sesiunii de informare „Introducerea Programului EU LIFE și a celor 4 subprograme”; - 2 participări la sesiunile ce instruite aferente Programelor de cooperare	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						Interreg NEXT 2021-2027;	
8.	Participare în cadrul Conferinței finale de încheiere a Programului România-RM 2014-2020	1 participare la eveniment	14.03.2024	SPCR SME	Șef SPCR Șef SME	Realizat ADR Sud a participat și promovat rezultatele obținute în cadrul proiectului „Renașterea meșteșugurilor populare autentice - moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă” la Conferința finală de încheiere a Programului România-RM 2014-2020.	în limita bugetului aprobat
9.	Organizarea și desfășurarea ședințelor comune de lucru cu APL I Cimișlia, Tvardița și Valea Perjei cu privire la dezvoltarea Cererilor complete de finanțare aferente Concursului de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, Programul de dezvoltare regională, Apel pe listă	Nr. ședințe organizate și desfășurate	19.02.2024- 31.05.2024	SPCR SMIP SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist în monitorizarea proiectelor Contabil Jurist	Realizat 8 ședințe organizate și desfășurate în teritoriu cu reprezentanții Primăriilor Cimișlia, Tvardița și Valea Perjei cu privire la dezvoltarea Cererilor complete de finanțare aferente Concursului de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, Programul de dezvoltare regională, Apel pe listă.	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
10.	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională	Nr. ședințe desfășurate	26.03.2024	SPCR SMIP SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	Realizat ADR Sud a participat la ședința de lansare a Programului deschis pentru dezvoltare urbană în Moldova, organizată de Banca germană de dezvoltare KfW în parteneriat cu MIDR.	în limita bugetului aprobat
11.	Participare în cadrul Grupului sectorial de lucru 22 Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale	Nr. participări ședințe Nr. documente examinate	29.03.2024 13.04.2024- 31.05.2024	Director ADR Sud	Director ADR Sud Șef SPCR	Realizat Urmare a reincluderii ADR Sud în calitate de membru al GL 22 în baza HG 180/2024, Anexa 2, Agenția a realizat următoarele: - 2 participări la ședințele GL; - 9 documente examinate; - 1 participare la atelierul de lucru dedicat pregătirilor pentru Reuniunile de Screening Bilateral; - 1 solicitare de prezentare a contribuțiilor Republicii Moldova la Pachetul de Extindere al Comisiei Europene pentru anul 2024, Partea a II-a	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						examinată împreună cu anexele; - contactarea și clarificarea aspectelor aferente cu MIDR; - elaborarea și remiterea în adresa MIDR a documentului completat: - 1 demers al Cancelariei de Stat examinat; - 1 document elaborat în l. engleză cu privire la pregătirea prezentărilor de țară pe capitolul 22 și remis în adresa MIDR; - 1 solicitare de validare a părții narative aferente PNA 2025-2029 examinată; - Comentarii de ajustare conținut expuse și remise în adresa MIDR.	
12.	Examinare și elaborarea avizelor Agenției în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale (pct. 28,	Nr. de cereri de finanțare Nr. de avize	20.03.202- 05.04.2024	SMIP SPCR	Șef SMIP Șef SPCR Specialist în monitorizarea proiectelor	Realizat -168 de cereri de finanțare examinate; -168 de avize elaborate și remise în adresa ONDRL.	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	alin. 3), lit. d) din Anexa nr. 3 la HG nr. 152/2022)						
13.	Implementarea proiectului „Aprovizionare cu apă și sanitație în r-l Cahul” finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei prin intermediul băncii KfW	Nr. raport elaborat și remis în adresa KfW Nr. de ședințe Nr. de vizite Nr. publicații	15.01.2024-31.12.2024	SMIP SPCR SME SA	Șef SMIP Șef SPCR Șef SME Șef SA Specialist în monitorizarea proiectelor Specialist în achiziții Jurist Specialist în comunicare și relații APL/CRD	Realizat - 1 raport de progres elaborat și remis în adresa KfW cu privire la activitățile realizate de către AEP II (ADR Sud) în semestrul II, 2023; - 11 vizite de monitorizare desfășurate; - 21 ședințe desfășurate; - 33,0 km rețea de canalizare construit - 1071 de conectări la gospodărie inclusiv în 468 în anul 2024; - 72,3 % de construcție a noii stații de epurare a apelor uzate. - actualizată informația de pe site www.adrsud.md privind proiectul AAC în raionul Cahul cu 10 publicații „Noutățile proiectului”, 27 publicații la rubrica „Publicații și resurse” pentru perioada anilor 2022-2024, redistribuite 15 publicații Facebook, 4 consultări	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						oferite comunicatorului; prezentat progresul proiectului în cadrul a 2 ședințe CRD Sud. - 1 eveniment de lansare proiectului; - 1,3 km apeduct magistral (priza de captare a apei-stația de tratare Cahul);	
14.	Ședința comună a Comitetului de Monitorizare al proiectului MSPL și a Comitetului Director al Acțiunii finanțate de UE pentru implementarea măsurilor de infrastructură în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și eficienței energetice în clădirile publice		23.02.2024	Director ADR Sud Șef SMIP Șefa SME	Director ADR Sud Șef SMIP Șef SME	Realizat 1 Proces Verbal al rezultatelor implementării proiectului MSPL și a Acțiunii finanțate de UE pentru implementarea măsurilor de infrastructură în domeniul AAC și EF.	în limita bugetului aprobat
15.	Colectare informației și completarea chestionarelor în cadrul campaniei „Guvernul Construieste”	Nr. chestionare Nr. cartonașe examinate	27.02.2024- 29.02.2024	SPCR	Specialist comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat - 14 chestionare completate la solicitarea MIDR privind proiectele implementate, în proces de implementare de către ADR Sud în perioada 2022-2024 pentru campania de informare „Guvernul construiește”;	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 5 cartonașe ale raioanelor din RDS examinate.	
16.	Audieri publice în cadrul comisiei administrație publică și dezvoltarea regională cu privire la activitatea Agențiilor de Dezvoltare Regională		21 mai 2024	ADR Sud	Director ADR Sud Șef SPCR Șef SMIP	Realizat - 2 prezentări cu privire la activitatea SPCR și SMIP în perioada 2022-2024 elaborate; - 1 participare la ședința de audieri publice cu privire la activitatea ADR.	în limita bugetului aprobat
17.	Conceptul de Training pentru autoritățile publice locale (APL) în domeniul dezvoltării și managementului integrat al proiectelor	Nr. participări Nr documente examinate		ADR Sud	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	Realizat -1 participare la atelierul de consultări privind conceptul de training pentru APL în domeniul dezvoltării și managementului integrat al proiectelor; -1 participare la ședința de lucru cu privire la agrearea foii de parcurs aferente; - 3 documente examinate cu remiterea propunerilor de ajustare.	În limita bugetului aprobat
18.	Coordonarea stagiului de practică		29.04.2024-19.05.2024	SPCR	Șef SPCR	Realizat -Examinarea actelor recepționate de la Universitatea de Stat din RM, facultatea Relații Internaționale;	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- Elaborarea Planului tematic și a conținuturilor activităților practicii de producție a studentului în anul II; - Coordonarea realizării activităților stabilite cu oferirea explicațiilor de rigoare.	
19.	Desfășurarea Misiunea de evaluare finală cu experți contractați de Delegația UE în Republica Moldova în cadrul proiectelor „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare , precum și de eficiență energetică în clădirile publice” implementate in Regiunea de Dezvoltare Sud.	Nr. de ședințe Nr. de vizite post implementare	04-06.06.2024	SMIP SME	SMIP SME	Realizat - 4 ședințe desfășurate; - 4 obiecte vizitate post implementare.	în limita bugetului aprobat
20.	Instruire cu Compania responsabilă de dezvoltarea sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională și locală.	Nr de instruiți Baza de date completată	11.04.2024-31.12.2024	SMIP SME	SMIP SME	Realizat - 2 instruiți; - 1 bază de date completat cu datele din RD Sud pentru elaborarea și dezvoltarea Sistemului informațional.	în limita bugetului aprobat
21.	Realizarea activităților în contextul celebrării Zilei Europei	Nr participări la evenimente	09.05.2024-31.05.2024	SPCR	Director ADR Sud Șef SPCR	Realizat - participarea la celebrarea Zilei Europei în PMAN;	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		Nr comunicate/ infografice Nr de spoturi video realizate			Specialist în comunicare și relații APL/CRD	- 1 infografic despre realizările ADR Sud din surse UE machetat; - 5 articole tematice diseminate; - oferirea suportului MIDR la realizarea unui spot video cu beneficiarii unui proiect AAC finanțat din surse UE; - 2 spoturi video despre proiectele de EE finanțate din surse UE elaborate și diseminate.	
22.	Executarea materialelor promoționale/panouri informative	Nr oferte de preț examinate Nr articole machetate	15.06.2024-30.06.2024	SPCR	Specialist în comunicare și relații APL/CRD	Realizat - necesarul de materiale promoționale, ofertelor de preț pentru 2 companii examinate; - 1 plăcuță exterior machetată; - elaborarea panourilor informative pentru 4 proiecte.	în limita bugetului aprobat
23.	Oferirea asistenței consultative pentru APL și alți actori regionali și locali pe domeniile de interes ale politicii de dezvoltare regională	- Nr. consultări oferite	18.07.2024	SPCR	Șef SPCR	Realizat - 2 participări în cadrul atelierelor grupului de lucru aferent elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Ștefan Vodă 2025-2030;	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 11 documente aferente recepționate și examinate; - 1 tabel cu finanțări/finanțatorii disponibili pentru entitățile din RM remis către experți; - Proiectul final al Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Ștefan Vodă 2025-2030 examinat împreună cu anexele aferente; - Propuneri de ajustare/îmbunătățire expuse și remise în adresa CR Ștefan Vodă.	
24.	Raportarea progresului de implementare a Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană 2024-2027	-Nr. documente examinate; - Nr. răspunsuri oferite.	15.07.2024 07.08.2024	SPCR	Șef SPCR	Realizat: - 1 solicitare de prezentare a progresului de implementare a Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană 2024-2027 examinată; - contactarea și clarificarea aspectelor aferente cu MIDR; - elaborarea și remiterea în adresa MIDR a	În limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						progresului înregistrat aferent solicitării.	
25.	Participarea în cadrul noilor Programe de cooperare	- Nr. documente examinate; - Nr. răspunsuri oferite.	13.09.2024-23.09.2024	SPCR	Șef SPCR	Realizat - 1 solicitare MIDR cu privire la oportunitatea de accesare a fondurilor europene pentru digitalizarea și tehnologizarea instituției prin aplicarea la Programul Europa Digitală (2021-2027) examinată; - apelurile de proiecte aferente examinate; - portalul Agenției de guvernare electronică examinat; - 1 solicitare a Cancelariei de Stat cu privire la formarea bazei de date aferentă Programului URBACT IV examinată; - 1 chestionar completat și remis.	În limita bugetului aprobat
26.	Participarea în cadrul evenimentului Moldova Tourism Forum 2024	- Nr. participări evenimente	27.09.2024	SPCR	Director ADR Sud Șef SPCR	Realizat - 1 participare în cadrul Moldova Tourism Forum 2024 (27.09.2024).	în limita bugetului aprobat
27.	Evaluarea intermediară a PNDOPC 2021-2027	- 1 raport examinat; - Nr. comentarii oferite		SPCR	Șef SPCR	Realizat - 1 Raport examinat;	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 3 comentarii de ajustare oferite.	
28.	Evaluarea finală a proiectului „Construirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, precum și eficiența energetică în clădirile publice”	- 1 raport examinat	27.09.2024-30.09.2024	SPCR	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	Realizat -1 Raport de evaluare finală a proiectului „Construirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, precum și eficiența energetică în clădirile publice” examinat, cu expunerea comentariilor/sugestiilor etc.	în limita bugetului aprobat
29.	Completarea chestionarului cu privire la rolul și performanța Băncii Mondiale în RM	Nr. chestionare completate și remise	26.09.2024	SPCR SMIP	Șef SPCR Șef SMIP	Realizat 1 chestionar recepționat, examinat, completat și remis.	În limita bugetului aprobat
30.	Actualizarea raportului privind asistența externă în curs de implantare și în curs de negociere	Nr. rapoarte completate		SMIP	Șef SMIP	Realizat 3 rapoarte completate	În limita bugetului aprobat
31.	Prezentarea informației cu privire la performanța activității instituției prin prisma indicatorilor KPI (indicatori de monitorizare a performanței instituționale) pentru perioada ianuarie - noiembrie 2024			SA SPCR SMIP SME	Șef SA Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist comunicare și relații APL/CRD	Realizat - 4 rapoarte de activitate privind implementarea planul de acțiuni al instituției pentru lunile octombrie-noiembrie completat; - 1 Notă Informativă elaborată;	În limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- Gradul de conformare a paginii web și a profilurilor de socializare la cerințele HG 728/2003 cu privire la paginile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora argumentat; - Indicatori sistematizați cu privire la nivelul de transparență a activității autorității pentru 11 luni de activitate; - Indicatori colectați cu privire la audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al autorității pentru 11 luni de activitate.	
32.	Raport de Evaluare a Programului Operațional Regional Sud 2022-2024	Nr. rapoarte	15.10.2024-30.04.2025	SMIP SPCR SME	Specialist monitorizare și evaluare	În curs de realizare Inițierea raportului de Evaluare a Programului Operațional Regional Sud 2022-2024.	În limita bugetului aprobat

TOTAL – 59 acțiuni, dintre care:	Neinițiate	În curs de realizare	Realizate
Trimestru I	5	30	6
Trimestru II	5	36	3
Trimestru III	3	38	6
Trimestru IV	3	8	33

ELABORAT:

Șefa SPCR Irina COROIAN_____

Șef SMIP Andrei POPUȘOI_____

Șefa SA Oxana GRAUR _____

Șefa SME Olga DIACONU_____

COORDONAT:

Șef direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală

Denis LUNGUL _____
