



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Aprobat: _____

Nicolae HRISTOV
Director ADR Sud


„_____” _____ 2024

Coordonat: _____

Ana MARDARE
Secretar de Stat MIDR

„_____” _____ 2024

RAPORT de activitate
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru Trimestrul III anul 2024

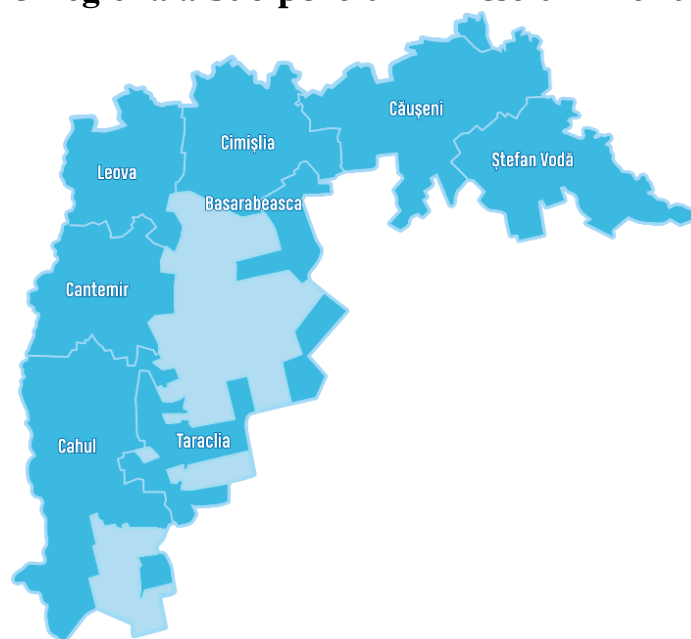

Cimișlia 2024

Indicatori de performanță					
Domeniu	Denumire indicator	Valoare de referință 2023	Valoare țintă	Grad de realizare	
Performanță eficientă și	Numărul proiectelor de dezvoltare regională implementate (nr./ %)	6	13	1	
	Populația cu acces la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare construite/reabilitate (nr./ %)	18492	28036	20 202/ 72,06	
	Numărul de proiecte atrase	-	2	-	
	Numărul de noi documente elaborate (studii, ghiduri etc.)	-	1	-	
	Numărul de parteneriate stabilite	-	1	-	
Politici publice	Gradul de implementare a proiectelor incluse în Documentul Unic de Program, (%)	40,0	100,0	54,80	
	Rata de implementare a Programului Operațional Regional (POR) , (%)	42,4	66,9	49,84	
	Rata de participare a membrilor CRD la ședințele organizate, (%)	50,0	55,0	76,92	
	Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției, (%)	66,7	89,0	74,8	
Management instituțional	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte, (%)	155,49	100,0	117,74	
	Gradul de asigurare cu personal, (%)	62,5	82,5	81,58	
	Rata fluctuației personalului din cadrul instituției publice, (%)	38,46	16,67	-	
	Ponderea angajaților instruiți, (%)	0	50,0	66,67	
	Nivelul de transparență a activității, inclusiv financiară	90	100		
	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al autorității (nr. vizualizărilor, aprecierilor, urmăritorilor, beneficiarilor de programe/activități etc. / %)	150108	160000	82 489	
	- Număr de vizitatorilor unici ai paginii web / %	10800	12800	315 292	
	- impactul postărilor (nr. vizualizărilor spoturilor video și nr. aprecierilor postărilor / %)	74400	84400	20 687	

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
Obiectiv 1: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - 1 studiu de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud elaborat; - 4 ședințe ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud desfășurate.							
1.	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)	Nr. consultări oferite APL aferente elaborării/actualizării Programelor de Revitalizare Urbană; Nr. consultări oferite mun. Cahul în implementarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM 2021-2027	01.01.2024-31.12.2024	Secția planificare și cooperare regională Secția management ul integrat al proiectelor Secția monitorizare și evaluare	Șef SPCR	În curs de realizare - 3 consultări oferite UIP Cahul cu privire la accesarea fondurilor disponibile.	17,26
2.	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese-verbale întocmite Nr. decizii aprobate	01.02.2024-31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare - 1 ședință ordinară organizată și desfășurată la data de 26.07.2024; - 1 proces-verbal întocmit; - 3 decizii aprobate.	10,06
3.	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR	Șef SPCR	În curs de realizare În perioada de referință, Agenția nu a recepționat nici o solicitare de implicare în activitatea Grupului	0,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						național de lucru pe domeniu.	
4.	Participare în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente domeniilor de intervenție ale politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte depuse Nr. proiecte câștigate	01.01.2024- 31.12.2024	SPCR/SMIP	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD Șef SMIP	În curs de realizare Pe parcursul trimestrului III, nu au fost realizate acțiuni relevante în legătura cu activitatea data.	12,90
5.	Participarea la consultările publice privind elaborarea, modificarea unor hotărâri ale Guvernului aferente implementării politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte de hotărâri de guvern consultate Nr. propuneri înaintate	01.01.2024- 31.12.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare În perioada de referință, Agenția nu a recepționat nici o solicitare de participare la consultările publice privind elaborarea, modificarea unor hotărâri ale Guvernului aferente implementării politicii de dezvoltare regională.	0,00
6.	Elaborarea studiului de specializare inteligentă a RDS	1studiu elaborat	01.07.2023- 31.03.2024	SPCR SME	Șef SPCR	În curs de realizare - 1 notă informativă și 4 anexe aferente procesului de elaborare a Studiului S3 examinate;	30,70

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 1 fișier Excel pentru eficientizarea colectării datelor solicitate de expert elaborat; - cartografierea informației solicitate de expert și completarea fișierului Excel; - 3 participări la ședințe aferente procesului de elaborare a Studiului S3; - 1 scrisoare-tip/invitație la activitatea grupurilor de lucru tematică elaborată; -1 comunicat redactat.	
7.	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	Nr. consultări oferite actorilor regionali 1 parteneriat stabilit/facilitat	02.01.2024-31.12.2024	Director ADR Sud SPCR/SME	Șef SPCR	În curs de realizare: - discuții cu partenerii de dezvoltare SFPL în Moldova cu privire la apelul de proiecte lansat în vederea atragerii mijloacelor financiare în RDS; - 7 consultări oferite APL I Cimișlia, Leova și Ștefan Vodă cu privire la posibilitatea de aplicare în cadrul	3,60

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						apelului de propuneri „Revitalizarea urbană pentru sporirea rezilienței comunităților locale” lansat de SFPL în Moldova. - 1 scrisoare elaborată ca răspuns la propunerea de colaborare cu Euroregiunea Nistru; - 1 propunere de Memorandum de colaborare cu ADR Odessa examinată împreună cu informația aferentă recepționată; - comentarii cu privire la ajustarea conținutului proiectului de Memorandum de colaborare cu ADR Odessa expuse; - 1 solicitare de acceptare a semnării Memorandumului remisă în adresa MIDR.	
8.	Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RDS cu suportul partenerilor de dezvoltare	Nr. proiecte cartografiate 1 bază de date regională și actualizată	01.05.2024- 28.06.2024	SME/SPCR	Șef SME Șef SPCR	În curs de realizare - 1 bază de date preliminară creată.	2,45

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
					Specialist monitorizare și evaluare		
9.	Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	Nr. evenimente organizate/facilitate 60 participanți la evenimente	01.05.2024-31.10.2024	SPCR/SMIP/SME/SA	Șef SPCR	În curs de realizare - 1 concept al evenimentului de celebrare a 15 ani de activitate a ADR Sud elaborat și expus directorului Agenției; discuții cu partenerii de dezvoltare/invitați inițiate.	7,86
10.	Actualizarea Planului de implementarea a POR Sud 2022-2024 și prezentarea spre aprobate CRD Sud	1 plan de implementare a POR Sud 2022-2024 actualizat și aprobat	03.06.2024-30.08.2024	SPCR	Șef SPCR	În curs de realizare Urmare a discuțiilor cu MIDR, s-a decis ca Planul de implementare a POR Sud 2022-2024 să nu fie actualizat în perioada curentă în contextul în care cererile de finanțare aplicate în cadrul apelului pe listă 2023 sunt la etapa de evaluare.	0,00
11.	Elaborarea Programului Operațional Regional Sud 2025-2027	Elaborarea Programului Operațional Regional inițiat	01.09.2024-31.12.2024	SPCR SMIP/SME	Șef SPCR	În curs de realizare - disponibilitatea indicatorilor oficiali pe BNS examinată;	25,53

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- discuții cu responsabili de la Min Fin cu privire la elaborarea analizei indicilor de depravare a ariilor mici. Totodată, urmare a discuțiilor cu MIDR, dar și în conformitate cu foaia de parcurs cu privire la activitățile prioritare privind dezvoltarea regională și locală pentru 2024-2025, expusă de către MIDR în cadrul Consiliului sectorial pentru asistență externă, ADR-urile urmează să dispună de suport tehnic cu privire la analiza datelor. Subsidiar, va fi evaluată și ajustată SNDR 2022-2028 cu integrarea angajamentelor UE.	
12.	Actualizarea Programului Regional Sectorial privind sporirea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Sud	1 raport de evaluare a PRS elaborat 3 ședințe ale grupului de lucru organizate	01.05.2024-31.12.2024	SME SPCR	Șef SME Specialist în monitorizare și evaluare Șef SPCR	Neinițiat: Această activitate nu a fost inițiată din cauza lipsei de cadre în agenție.	0,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		Actualizarea PRS privind sporirea atractivității turistice a RDS inițiată			Specialist în planificare		
13.	Elaborarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul de referință 2025 și prezentarea spre aprobare de către MIDR	1 plan de activitate elaborat și aprobat	15.07.2024-20.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	În curs de realizare: - 1 Circulară de la Min Fin cu privire la elaborarea propunerilor de buget pentru anul 2025 și estimări 2026-2027 examinată; - procesul de identificare, planificare și bugetare a activităților aferente SPCR pentru 2025 inițiat.	30,71
Obiectiv 2: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - cca 10 000 de locuitori ai zonelor neiluminate; - 3 obiective turistice amenajate; - 2 obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice; - 33 localități ce au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare; - 28036 persoane cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare.							
Direcția prioritară 1.1. CONSOLIDAREA ROLULUI ȘI FUNCȚIILOR ORAȘELOR ÎN SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII							
1.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	4 anunțuri de intenții incluse în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada trimestrul I	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		4 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor	15.12.2023-01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada trimestrul I și II	0,00
		4 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md	28.12.2023-01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada trimestrul I	0,00
		1 procedură de achiziții publice desfășurată pentru servicii de responsabil tehnic LP, 3 prin COP				Realizat: În perioada trimestrul I	0,00
		8 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP	15.12.2023-01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 3 decizii GLAP de atribuire a contractelor de antrepriză și responsabil tehnic.	0,24
		8 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				Realizat În perioada trimestrului II	0,00
2.	Semnarea contractelor de antrepriză servicii	8 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	01.03.2024-01.08.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	În curs realizare - 2 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate; - 1 contract au fost semnate în tem. Legii 131/2015, Autoritatea Contractantă are dreptul să încheie contracte	0,71

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						directe cu operatorul economic dacă valoarea viitorului contract pentru servicii nu depășește suma de 150 000 fără TVA.	
3.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	11 vizite de monitorizare desfășurate 11 ședințe desfășurate 1 zonă de recreere 2 atracții turistice amenajate 15 ha de teritoriu amenajat 10 ecosfere create 4 poduri construite cu specific de arhitectură medievală 610 m de albia râului curățită și pavată 1 parcare pentru automobile 3 instituții publice renovare 9 terenuri de joacă aferente grădiniței de copii amenajate și asigurate cu echipament pentru organizarea activităților în aer liber 88,8 km de rețele de cablu iluminare stradală modernizate 765 piloni montați	01.04.2024-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare - 8 vizite de monitorizare; - 7 ședințe de lucru organizată; - 53 % clopotniță germană reconstruită; - 80 % de pavaj pietonal. - 1 parcare pentru automobile; - 15 ha de teritoriu amenajat în proporție de 50 %; - 1.634 m2 de acoperiș renovat (49 %)	28,72

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		2397 de corpuri de iluminat LED instalate					
4.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	2 acte de recepție la terminarea lucrărilor semnate	01.09.2024-01.10.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Neinițiat: Motivul: contestații depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice și lipsa finanțării.	
Direcția prioritară 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE DE BAZĂ DIN REGIUNE							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	7 Contracte de finanțare semnate	01.03.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada trimestrului I.	0,00
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	01.03.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada trimestrului I.	0,00
		2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor				În curs de realizare 1 anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor a fost publicat la data de 23.02.2024. 1 anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor nu a fost inițiat din lipsa finanțării (<i>proiectul SV-CS-CN</i>)	0,00
		2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic elaborate				În curs de realizare 1 anunț de participare privind serviciile de	0,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		și publicate pe platforma www.achizitii.md				responsabil tehnic a fost publicat la data de 23.02.2024. 1 anunț de participare privind serviciile de responsabil tehnic nu a fost inițiat din lipsa finanțării (<i>proiectul SV-CS-CN</i>)	
		2 proceduri de achiziții publice desfășurate				Realizat În perioada trimestrului I	0,00
		2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				În curs de realizare: - Decizia de atribuire SRT nr.16/24 din 15.05.2024. - Decizia de atribuire lucrări nr.17/24 din 27.05.2024 (<i>1 contestație la ANSC a deciziei GLAP de atribuire (lucrări)</i>). - Decizia de reevaluare nr. 28/24 din 02.08.2024 (<i>1 contestație la ANSC a deciziei GLAP de reevaluare (lucrări)</i>) - Decizia de anulare a procedurii (<i>1 contestație la ANSC a</i>	0,01

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						<i>deciziei GLAP de anulare (lucrări))</i>	
		2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				În curs de realizare: - Decizia de atribuire lucrări nr.17/24 din 27.05.2024 - 03.06.2024 Contestație depusă pe Decizia de atribuire lucrări nr.17/24 - 05.07.2024 ședința ANSC privind contestația depusă la data de 03.06.2024; - Decizia de reevaluare nr. 28/24 din 02.08.2024 - 08.08.2024 Contestație depusă pe Decizia de reevaluare nr. 28/24 din 02.08.2024 - 05.09.2024 Decizia ANSC privitor la Contestație depusă la data de 08.08.2024 asupra Deciziei de reevaluare nr. 28/24 din 02.08.2024	0,01

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 24.09.2024 Decizia nr.35/24 privitor la anularea procedurii - 25.09.2024 Contestație la Decizia nr.35/24 privitor la anularea procedurii	
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	14 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	01.07.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	În curs de realizare - Decizia de atribuire lucrări nr.17/24 din 27.05.2024 - 03.06.2024 Contestație depusă pe Decizia de atribuire lucrări nr.17/24 - 05.07.2024 ședința ANSC privind contestația depusă la data de 03.06.2024; - Decizia de reevaluare nr. 28/24 din 02.08.2024 - 08.08.2024 Contestație depusă pe Decizia de reevaluare nr. 28/24 din 02.08.2024 - 05.09.2024 Decizia ANSC privitor la Contestație depusă la data de 08.08.2024	0,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						asupra Deciziei de reevaluare nr. 28/24 din 02.08.2024 - 24.09.2024 Decizia nr.35/24 privitor la anularea procedurii - 25.09.2024 Contestație la Decizia nr.35/24 privitor la anularea procedurii	
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	15 vizite de monitorizare desfășurate 12 ședințe desfășurate 71,1 km rețele de apeduct magistral construit 89,2 km rețele de apeduct interne 11 Rezervoare de apă construite 6 stații de pompare a apei construite 16 stații de clorinare cu hipoclorit de sodiu construite 1 stație de epurare modernizată 49,8 km rețele de canalizare construite 8 stații de pompare a apelor uzate construite 1 documentație de proiect	01.09.2022-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare - 8 vizite de monitorizare organizate; - 9 ședințe de lucru organizate; - 13,35 km de rețea de apeduct magistral construit; - 22 de cămine de vizitare a magistralei - 0,14 km de rețea de apeduct interior; - 7 SPAU realizat la 99,9 %; - 63,3 % de modernizarea a stației de epurare; - 3,8 km rețele de canalizare construite.	0,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
5.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	2 acte de recepție la terminarea lucrărilor semnate	01.09.2024-01.10.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Neinițiat Motivul: contestații depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice și lipsa finanțării	
Direcția prioritară 2.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SUPORT PENTRU AFACERI							
1.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	01.04.2022-01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat În perioada trimestrului I	0,00
		2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor				Realizat În perioada trimestrului I	
		2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md				Realizat: În perioada trimestrului II	
		2 proceduri de achiziții publice desfășurate				Realizat În perioada trimestrului I	
		2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				Realizat În perioada trimestrului I	
		2 dări de seamă lucru privind rezultatele				Realizat	0,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				- 1 Dare de seamă nr.12/24 din 08.05.2024 (Lucrări) - Conform HG.870/2022 privind achizițiile de valoare mică, nu se elaborează darea de seamă (SRT)	
2.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	6 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	15.08.2022-01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat - 1 Contract de antrepriză nr.01/L/24 din 07.05.2024 - 1 Contract SRT nr.02/S/24 din 10.05.2024	0,00
3.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	4 vizite de monitorizare desfășurate 4 ședințe desfășurate 2,4 km de rețele electrice de tensiune înaltă 1,41 km rețele de apeduct 1,58 km rețele de canalizare 0,87 km rețele de gaze naturale construcția halei de producere cu suprafața totală de 1191 m2 0,39 ha amenajarea terenului adiacent	12.09.2022-05.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare - 3 vizite de monitorizare; - 3 ședințe de lucru organizate; - 37 % din hala multifuncțională de producere: - 239,0 m2 din hală;- 18,9 % din conectare la utilități;- 1520 m2 teren amenajat.	0,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
4.	Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării	1 act de predare-primire semnat 1 raport elaborat și transmis în termen	01.04.2024-01.06.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor	Realizat - la data de 26.07.2024 a fost remis Actul de predare primire a costurilor către beneficiar; - la data de 02.08.2024 a fost remis raportul final către MIDR	1,89
Obiectiv 3: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV-FINANCIAR ȘI DE COMUNICARE AL INSTITUȚIEI							
Indicatori de impact - Executarea devizului anual de venituri și cheltuieli; - Majorarea gradului de asigurare cu personal a instituției; - Reducerea ratei fluctuației personalului din cadrul instituției; - Majorarea ponderii concursurilor finalizate cu succes în totalul concursurilor organizate; - Creșterea fondului de cheltuieli alocate pentru formarea profesională per salariat în ADR; - 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat; - 1 registru al riscurilor elaborat; - Majorarea gradului de transparență a activității Agenției.							
1.	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului operațional pentru anul de gestiune și rectificare la necesitate.	1 deviz anual de venituri și cheltuieli executat Nr. de rectificări la devizul anual de venituri și cheltuieli operate Nr. solicitărilor de plată executate Nr. ordinelor de plată executate	02.01.2024-30.12.2024	SA	Șef SA/Contabil-șef Contabil	În curs de realizare Pentru perioada de raportare au fost desfășurate următoarele acțiuni: - monitorizarea lunară a devizul anual de venituri și cheltuieli; - 1 rectificare devizului anual de venituri și cheltuieli efectuată, conform deciziei	41,73

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						CNCDRL nr. 23/24 din 13.09.2024; - 39 solicitări de plată pentru cheltuieli operaționale și proiecte investiționale; - 149 ordine de plată executate.	
2.	Raportarea gradului de executare a bugetului operațional și prezentarea rapoartelor aferente instituțiilor abilitate și partenerilor de dezvoltare	Nr. rapoartelor (lunare, trimestriale, semestriale, anuale)	25.01.2024-25.12.2024	SA	Șef SA/Contabil-șef Contabil	În curs de realizare Pentru perioada de referință au fost prezentate următoarele rapoarte: Lunare: - 3 rapoarte privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (IPC 21); - 3 rapoarte cu privire la evidența utilizării de către ADR Sud a autovehiculelor; Trimestriale: - 1 raport cu privire la investiții (2-INV);	41,73

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 1 raport cu privire la câștigurile salariale (Munca 1); - 1 raport cu privire la costurile și cheltuielile entității (5-CI-23); - 1 raport cu privire la Import/Export de servicii (EI-7/8).	
3.	Recrutarea personalului și administrarea documentației aferente	Nr. anunțuri plasate Nr. concursuri desfășurate Nr. persoane angajate Nr. documentație de personal elaborate și completate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare - 1 concurs de angajare desfășurat; - 1 persoană angajată în funcție de specialist monitorizare și evaluare; - 1 dosar personal completat.	19,67
4.	Elaborarea actelor administrative referitoare la personal și activitatea de bază	Nr. ordine semnate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare Pentru perioada de referință au fost elaborate și semnate: - 33 ordine cu privire la personal; - 14 ordine cu privire la activitatea de bază.	14,75
5.	Gestionarea și menținerea sistemului general de evidență a corespondenței	Nr. scrisori de intrare Nr. scrisori de ieșire	01.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare Pentru perioada de referință au fost înregistrate: - 311 scrisori de intrare;	14,75

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 199 scrisori de ieșire.	
6.	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept Nr. scrisori elaborate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Jurist	În curs de realizare - 1 cerere către ASP Cimișlia privind perfectarea Extrasului ADR Sud; - 3 solicitări către ANSC; - 3 solicitări către Agenția Achiziții Publice; - 2 reprezentări în cadrul ședințelor ANSC; - 1 demers către S.A. MICB privind starea conturilor de depozit garanție de bună execuție.	24,48
7.	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile contractante în măsura delegării lor de către ADR Sud	Nr. acte examinate Nr. notelor informative elaborate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Jurist	În curs de realizare - 4 contracte de antrepriză examinate și coordonate; - 4 contracte de bună execuție garanție examinate și coordonate; - 1 contract de prestări servicii în domeniul Securitate și Sănătate în Muncă;	24,48

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 1 contract de prestări servicii deservire; - 1 contract de prestări servicii de locațiune; - 5 puncte de vedere examinate și elaborate în cadrul ședințelor ANSC. - 1 memorandum de colaborare; - 1 acord adițional de modificarea clauzelor contractuale; - 15 notificări elaborate; - 3 proiecte de decizii examinate și ajustate; - 2 regulamente de activitate examinate; - 1 regulament de activitate elaborat; - 1 ordin de activitate elaborat.	
8.	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud	Nr. materiale, comunicate de presă, anunțuri publicate Nr. vizualizări	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME/SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare - 25 publicații „Noutăți” pe www.adrsud.md – 58898 vizualizări; - 28 publicații Facebook – 19409 impact ale postărilor, 2769 interacțiuni cu postările;	17,09

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 9 articole redistribuite Facebook – 1278 impact ale postărilor, 135 interacțiuni cu postările; - 4 proiecte cu link-uri către publicații externe actualizate; - actualizate: meniu bara de sus, bara de jos parteneri; - rubricile Noutăți, Achiziții Publice, Oportunități de finanțare divizate; - rubricile contacte, achiziții actualizate pe site; - conținutul și meniul etc. în proces de reorganizare; - 1 prezentare PPT privind RDS, ADR, CRD Sud tradusă în limba engleză; - 1 propunere înaintată către MIDR de a modifica modelul panoului informativ instalat pe clădirea instituțiilor, cu includerea QR-Code.	

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
9.	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS	Nr. broșuri editate	02.05.2024-31.12.2024	SPCR SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare - necesitatea și cantitățile de materiale promoționale determinată; - 13 oferte companii de machetare solicitată; - 6 oferte examinate și informația totalizată; - compania cu cea mai avantajoasă ofertă determinată; - se colaborează cu compania referitor la realizarea produselor.	23,64
10.	Promovarea politicii de dezvoltare regională și activității ADR Sud în mijloacele mass-media la nivel regional și local	5 intervenții media	01.01.2024-31.12.2024	Director ADR Sud	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare - 1 publicație în revista economică „Moldova Invest” – ediția de vară 2024, p. 41 - suport informațional acordat pentru 2 publicații externe: Studio-L Căușeni Jurnal TV	3,54

Obiectiv 4: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE

Indicatori de impact

- Majorarea numărului de proiecte monitorizate post-implementare.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
1.	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor implementate	4 planuri de durabilitate elaborate/aprobate 2 note informative cu privire la evaluarea proiectelor de dezvoltare regională 2 vizite post implementare a proiectele finisate	01.03.2024-31.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME Specialist monitorizare și evaluare	În curs de realizare - solicitare repetată privind planul de durabilitate, aflată în așteptarea aprobării către Consiliul Local, în cadrul proiectului „Dezvoltarea durabilă ca structură de sprijin pentru afaceri de importanță regională”. - solicitare către beneficiarul final pentru prezentarea actelor confirmative referitoare la planul de durabilitate în cadrul proiectului „Racordarea utilităților a subzonei nr. 18 (Cahul) din Zona Economică Liberă „Bălți”.	4,32
2.	Activități de evaluare a proiectelor	2 rapoarte post implementare elaborate 4 vizite de monitorizare a proiectelor implementate	01.03.2024-15.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME Specialist monitorizare și evaluare	În curs de realizare Pe parcursul trimestrului III s-a inițiat, din birou, elaborarea raportului de evaluare post-implementare pentru proiectul „Îmbunătățirea	14,97

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						<i>serviciilor de alimentarea cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”.</i>	
3.	Activități de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare	20 vizite de monitorizare în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	01.03.2024-31.12.2024	SME/SMIP	Șef SME Specialist monitorizare și evaluare	În curs de realizare Pe parcursul trimestrului III au fost efectuate 5 vizite de monitorizare și elaborate 5 fișe de observație.	5,76
4.	Elaborarea raportului cu privire la implementarea POR Sud 2022-2024	1 raport semestrial elaborat 1 raport anual elaborat	20.05.2024-15.01.2025	SME/SMIP/SPCR/SA	Șef SME Specialist monitorizare și evaluare	În curs de realizare - aprobarea raportului semestrial privind implementarea POR Sud 2022-2024; - inițierea raportului de evaluarea privind implementarea POR Sud 2022-2024 pentru perioada 2022-2024.	10,95
5.	Elaborarea raportului trimestrial și anual privind activitatea ADR Sud în anul 2024	5 rapoarte elaborate	01.03.2024-15.01.2025	SME/SMIP/SPCR/SA	Șef SME	În curs de realizare A fost inițiat raportul privind realizarea planului de activitate pentru trimestrul III anul 2024.	2,32
6.	Elaborarea raportului semestrial și anual aferent	2 rapoarte	02.01.2024-20.01.2025	SME/SMIP/SPCR/SA	Șef SME	În curs de realizare	5,76

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	implementării PNDOPC 2021-2027					A fost elaborat raportul pentru primul semestru privind implementării PNDOPC 2021-2027.	
Obiectiv 5:CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - 4 angajați instruiți.							
1.	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud	Nr. participanți la instruiți Nr. instruiți organizate	02.01.2024- 31.12.2024	SA SPCR/SMIP/ SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare - 12 angajați instruiți; - 4 instruiți organizate: - sesiune de instruire privind modul de utilizare a sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională și locală cu participarea dezvoltatorului (09.07.2024 – 3 angajați instruiți); - atelier practic „Crearea procedurilor pe platforma achizițiilor publice” (12.07.2024 – 2 angajați instruiți); - atelier de Lucru cu tematica coordonarea politicii de coeziune a Uniunii Europene	4,55

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						(30.07.2024 – 2 angajați instruiți); - sesiune de instruire privind utilizarea sistemului „e-management” (09.09.2024 – 12 angajați instruiți).	
2.	Facilitarea/organizarea instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională	Nr. instruiți facilitate/organizate	02.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare - suport logistic acordat Oficiul Național al Turismului pentru organizarea unei sesiuni de instruire pe 28 noiembrie 2024	6,87
3.	Organizarea instruirilor aferente apelurilor competitive de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL	Nr. sesiuni de instruire organizate Nr. consultări oferite Nr. cereri de finanțare recepționate	01.03.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD Specialist monitorizare proiecte Manager de oficiu	Realizat - 4 sesiuni de instruire desfășurate în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL; - 128 participanți; - 103 consultări oferite APL I și II; - 37 note conceptuale recepționate.	31,32

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
4.	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate Nr. beneficiari	01.03.2024-31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare - Forum Economic Regional Moldova, ediția 2024, Vatra Dornei, România	
Activități complementare							
1.	Oferirea asistenței consultative pentru APL și alți actori regionali și locali pe domeniile de interes ale politicii de dezvoltare regională	- Nr. consultări oferite	18.07.2024	SPCR	Șef SPCR	În curs de realizare - 2 participări în cadrul atelierelor grupului de lucru aferent elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Ștefan Vodă 2025-2030; - 11 documente aferente recepționate și examinate; - 1 tabel cu finanțări/finanțatorii disponibili pentru entitățile din RM remis către experți.	în limita bugetului aprobat
2.	Elaborarea rapoartelor trimestriale de activitate al secțiilor din cadrul agenției pentru anul 2024	Nr. rapoarte elaborate	10.03.2024-31.12.2024	SPCR	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	În curs de realizare - 4 rapoarte trimestriale elaborate.	În limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
3.	Participare în cadrul Grupului sectorial de lucru 22 Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale	- Nr. documente examinate; - Nr. răspunsuri oferite.	04.07.2024-31.12.2024	SPCR	Director ADR Sud Șef SPCR	În curs de realizare - 1 solicitare de prezentare a contribuțiilor Republicii Moldova la Pachetul de Extindere al Comisiei Europene pentru anul 2024, Partea a II-a examinată împreună cu anexele; - contactarea și clarificarea aspectelor aferente cu MIDR; - elaborarea și remiterea în adresa MIDR a documentului completat; - 1 demers al Cancelariei de Stat examinat; - 1 document elaborat în l. engleză cu privire la pregătirea prezentărilor de țară pe capitolul 22 și remis în adresa MIDR.	În limita bugetului aprobat
4.	Raportarea progresului de implementare a Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii	- Nr. documente examinate; - Nr. răspunsuri oferite.	15.07.2024 07.08.2024	SPCR	Șef SPCR	Realizat: - 1 solicitare de prezentare a progresului de implementare a Planului național de	În limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	Moldova la Uniunea Europeană 2024-2027					acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană 2024-2027 examinată; - contactarea și clarificarea aspectelor aferente cu MIDR; - elaborarea și remiterea în adresa MIDR a progresului înregistrat aferent solicitării.	
5.	Participarea în cadrul noilor Programe de cooperare	- Nr. documente examinate; - Nr. răspunsuri oferite.	13.09.2024-23.09.2024	SPCR	Șef SPCR	În curs de realizare - 1 solicitare MIDR cu privire la oportunitatea de accesare a fondurilor europene pentru digitalizarea și tehnologizarea instituției prin aplicarea la Programul Europa Digitală (2021-2027) examinată; - apelurile de proiecte aferente examinate; - portalul Agenției de guvernare electronică examinat; - 1 solicitare a Cancelariei de Stat cu privire la formarea bazei de date aferentă	În limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						Programului URBACT IV examinată; - 1 chestionar completat și remis.	
6.	Participarea în cadrul evenimentului Moldova Tourism Forum 2024	- Nr. participări evenimente	27.09.2024	SPCR	Șef SPCR	Realizat - 1 participare în cadrul Moldova Tourism Forum 2024 (27.09.2024).	în limita bugetului aprobat
7.	Evaluarea intermediară a PNDOPC 2021-2027	- 1 raport examinat; - Nr. comentarii oferite		SPCR	Șef SPCR	Realizat - 1 Raport examinat; - 3 comentarii de ajustare oferite.	în limita bugetului aprobat
8.	Evaluarea finală a proiectului „Construirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, precum și eficiența energetică în clădirile publice”	- 1 raport examinat;	27.09.2024-30.09.2024	SPCR	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	Realizat -1 Raport de evaluare finală a proiectului „Construirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, precum și eficiența energetică în clădirile publice” examinat, cu expunerea comentariilor/sugestiilor etc.	în limita bugetului aprobat
9.	Implementarea proiectului „Aprovizionarea cu apă și sanitație în r-l Cahul” finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul	Nr. raport elaborat și remis în adresa KFW Nr. de ședințe Nr. de vizite Nr. publicații	15.01.2024-31.12.2024	SMIP SME SA	Șef SMIP Șef SME Șef SA Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare - 4 vizite de monitorizare desfășurate; - 6 ședințe desfășurate;	În limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	Germaniei prin intermediul băncii KfW				Specialist în achiziții Jurist Specialist în comunicare și relații APL/CRD	- 33,0 km rețea de canalizare construit - 72,3 % de construcție a noii stații de epurare a apelor uzate; - 1,3 km apeduct magistral (priza de captare a apei-stația de tratare Cahul); - cooperarea în vederea actualizării paginii proiectului pe site, 4 publicații FB.	
10.	Completarea chestionarului cu privire la rolul și performanța Băncii Mondiale în RM	Nr. chestionare completate și remise	26.09.2024	SPCR SMIP	Șef SPCR Șef SMIP	Realizat 1 chestionar recepționat, examinat, completat și remis.	În limita bugetului aprobat
11.	Conceptul de Training pentru autoritățile publice locale (APL) în domeniul dezvoltării și managementului integrat al proiectelor	Nr. participări Nr. documente examinate		ADR Sud	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare Pe parcursul trimestrului III, nu au fost solicitări relevante în legătură cu activitatea dată.	În limita bugetului aprobat
12.	Examinarea și elaborarea avizelor Agenției în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprob	Nr. cereri de finanțare examinate Nr. avize elaborate	05.04.2024- 31.12.2024	SMIP SPCR	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare Pe parcursul trimestrului III, nu au fost solicitări relevante în legătură cu activitatea dată.	În limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	area proiectelor în domeniul dezvoltării locale (pct. 28, alin. 3), lit. d) din Anexa nr. 3 la HG nr. 152/2022)						
13.	Instruirea cu Compania responsabilă de sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională și locală.	Nr. de instruiți Baza de date completată	11.04.2024- 31.12.2024	SMIP SME	SMIP SME	În curs de realizare Pe parcursul trimestrului III, nu au fost solicitări relevante în legătură cu activitatea dată.	În limita bugetului aprobat

TOTAL – 59 acțiuni, dintre care:	Neinițiate	În curs de realizare	Realizate
Trimestru I			
Trimestru II			
Trimestru III	3	38	6
Trimestru IV			

ELABORAT:

Șefa SPCR Irina COROIAN_____

Șef SMIP Andrei POPUȘOI_____

Șefa SA Oxana GRAUR _____

Șefa SME Olga DIACONU_____

COORDONAT:

Șef direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală

Denis LUNGUL _____
