

RAPORT DE PROGRES*
privind implementarea POR Sud 2026-2028
pentru perioada de raportare
ianuarie – iunie 2026,

Notă*: Raportul de Progres urmează a fi propus spre examinare și aprobare la următoarea ședință a Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

Coordonat: _____
Denis LUNGUL,
Secretar de Stat
„_____” _____ 2026

Aprobat
prin Decizia Consiliului
Regional de Dezvoltare Sud
nr. ____ din _____ 2026

RAPORT DE PROGRES

privind implementarea POR Sud 2026-2028

Perioada de raportare
ianuarie – iunie 2026

Cimișlia, 2026

Cuprins	2
Abrevieri și Acronime	3
 I. PARTEA DESCRIPTIVĂ	 4
1.1. Cadrul instituțional	4
1.2 Cadrul normativ și metodologic	4
1.3 Realizarea planului de activitate/ Gradul de realizare a Planului de implementare	5
1.4 Rezultate-cheie atinse la nivel de obiective generale și direcții prioritare	6
 II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI	 8
Obiectiv General 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud	
1.1 Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii	9
1.2 Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiune	12
1.3 Promovarea specializării inteligente în regiune	13
1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră	14
Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii	
2.1 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud	17
2.2 Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri	20
2.3 Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbări climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor:	20
Obiectiv General 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională	
3.1 Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională	21
3.2 Suport în consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională	23
3.3 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională	23
 III. CONCLUZII	 24
Provocări și riscuri	25
Lecții învățate și bune practici	25
 IV. PARTEA OPERAȚIONALĂ. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE AL POR SUD 2026-2028, PENTRU ANUL 2026	 26

Abrevieri și acronime

AAC	Aprovizionare cu apă și canalizare
AAS	Aprovizionare cu apă și sanitație
ADR	Agenție de Dezvoltare Regională
APL	Administrație Publică Locală
BNS	Biroul Național de Statistică
CRD	Consiliul Regional pentru Dezvoltare
CNCDRL	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale
DUP	Document Unic de Program
FNDRL	Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
HG	Hotărâre de Guvern
ÎM	Întreprindere Municipală
MIDR	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
PIB	Produs Intern Brut
PIBR	Produs Intern Brut Regional
POR	Program Operațional Regional
RD	Regiune de Dezvoltare
SNDR	Strategia Națională de Dezvoltare Regională
UAT	Unitate Administrativ Teritorială
ZEL	Zonă Economică Liberă
ZAL	Zonă Antreprenorială Liberă

I. Partea descriptivă

1.1. Cadrul instituțional

Programul Operațional Regional Sud 2026–2028 (POR Sud) constituie principalul instrument de implementare la nivel regional a obiectivelor stabilite prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională. Acesta asigură corelarea priorităților strategice naționale cu necesitățile și prioritățile de dezvoltare ale Regiunii de Dezvoltare Sud, prin intermediul proiectelor investiționale și al acțiunilor instituționale planificate pentru perioada de implementare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Programul Operațional Regional (POR) reprezintă principalul document de planificare operațională la nivel regional, care include programele, proiectele și acțiunile prioritare necesare pentru realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională

Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) este o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), autoritatea responsabilă de elaborarea și promovarea politicii de dezvoltare regională. Agenția este constituită în scopul implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud și are misiunea de a contribui la dezvoltarea durabilă, echilibrată și competitivă a regiunii, prin diminuarea disparităților socioeconomice și teritoriale și îmbunătățirea calității vieții populației.

Implementarea POR Sud se realizează prin Planul de implementare anual, care stabilește proiectele și acțiunile ce urmează a fi realizate, indicatorii de monitorizare, sursele de finanțare, termenele de implementare și instituțiile responsabile.

Prezentul raport reflectă progresul înregistrat în implementarea Planului de implementare a Programului Operațional Regional Sud în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 și are drept scop evaluarea gradului de realizare a activităților planificate, a indicatorilor de monitorizare și a execuției financiare, precum și identificarea principalelor provocări și formularea recomandărilor pentru eficientizarea implementării Programului în perioada următoare.

1.2 Cadrul normativ și metodologic

Implementarea POR Sud 2026–2028 și monitorizarea realizării Planului de implementare pentru anul 2026 se desfășoară în conformitate cu cadrul normativ și strategic național în domeniul dezvoltării regionale, care stabilește principiile, mecanismele instituționale și instrumentele de planificare, monitorizare și evaluare a politicii de dezvoltare regională.

POR Sud 2026–2028 reprezintă ciclul doi de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2022–2028 și constituie principalul instrument de planificare operațională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud. Implementarea Programului se realizează prin Planul de implementare pentru anul 2026, care include proiectele investiționale și acțiunile instituționale necesare atingerii obiectivelor stabilite.

Proiectele finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală au fost selectate în cadrul apelurilor organizate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și incluse în Documentul

Unic de Program 2025–2027, fiind ulterior reflectate în Planul de implementare al Programului Operațional Regional Sud pentru anul 2026.

Structura și conținutul prezentului raport sunt elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea strategică, precum și ale Metodologiei de elaborare, aprobare, implementare, monitorizare, evaluare și raportare a Programelor Operaționale Regionale, aprobată prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 66 din 23 aprilie 2026. Raportul reflectă progresul înregistrat în implementarea POR Sud 2026–2028 în perioada ianuarie – iunie 2026, prin prezentarea gradului de realizare a acțiunilor și proiectelor planificate, a indicatorilor de monitorizare și a rezultatelor înregistrate în perioada de raportare. Totodată, raportul evidențiază principalele progrese, dificultăți și măsuri întreprinse în procesul de implementare a Programului.

1.3 Realizarea planului de activitate/ Gradul de realizare a Planului de implementare

În semestrul I al anului 2026, Planul de implementare a POR Sud 2026–2028 s-a axat pe continuarea proiectelor investiționale incluse în Documentul Unic de Program 2025–2027, precum și pe realizarea acțiunilor instituționale orientate spre consolidarea dezvoltării regionale. Acestea au vizat promovarea investițiilor, dezvoltarea competitivității regionale, consolidarea cooperării interregionale și întărirea capacităților actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională.

Planul de implementare pentru anul 2026 cuprinde atât proiecte investiționale finanțate din FNDRL, cât și acțiuni instituționale implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în exercitarea atribuțiilor sale privind planificarea, coordonarea, monitorizarea și promovarea politicii de dezvoltare regională.

În perioada de raportare, activitățile au fost realizate în conformitate cu obiectivele și direcțiile prioritare stabilite în POR Sud 2026–2028, precum și cu prevederile Planului de implementare al POR Sud pentru anul 2026 și ale Planului de acțiuni al ADR Sud pentru anul 2026. Implementarea a urmărit atât realizarea proiectelor de investiții, cât și desfășurarea activităților de planificare, monitorizare, coordonare și sprijin acordat beneficiarilor în procesul de implementare.

În ansamblu, implementarea Planului de implementare în semestrul I 2026 a evidențiat un progres în realizarea activităților planificate, fiind continuate investițiile în domeniile prioritare ale dezvoltării regionale și desfășurate acțiuni orientate spre consolidarea capacităților instituționale și îmbunătățirea procesului de implementare a Programului.

În acest context, menționăm că până la finalul perioadei de implementare a POR Sud 2026–2028 urmează a fi finalizate 34 de proiecte investiționale inițiate în cadrul POR Sud 2022–2025, care asigură continuitatea investițiilor strategice în Regiunea de Dezvoltare Sud. Aceste proiecte se află în diferite etape de implementare, inclusiv realizarea lucrărilor, proceduri de achiziții și activități pregătitoare, iar finalizarea acestora reprezintă una dintre prioritățile perioadei de programare.

1.4 Rezultate-cheie atinse la nivel de obiective generale și direcții prioritare

În semestrul I al anului 2026, implementarea POR Sud 2026–2028 a înregistrat progrese în realizarea celor trei obiective generale, prin continuarea proiectelor investiționale, consolidarea capacităților actorilor regionali și îmbunătățirea mecanismelor de planificare, monitorizare și coordonare a dezvoltării regionale.

În cadrul Obiectivului general 1 – Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în Regiunea de Dezvoltare Sud, principalele rezultate au vizat consolidarea rolului municipiului Cahul ca pol regional de creștere, prin implementarea proiectelor investiționale și acordarea suportului metodologic autorității publice locale. Totodată, au fost consolidate intervențiile de revitalizare urbană, inclusiv prin sprijinirea a 6 APL urbane și inițierea procesului de identificare a localităților interesate de suport pentru elaborarea sau actualizarea programelor de revitalizare urbană. În domeniul antreprenoriatului și turismului au continuat proiectele orientate spre dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri, valorificarea potențialului turistic și crearea unor premise pentru creșterea atractivității economice a regiunii. Au fost, de asemenea, consolidate cooperarea dintre actorii regionali și promovarea specializării inteligente, inclusiv prin facilitarea dialogului dintre mediul de afaceri, autoritățile publice și mediul academic.

În cadrul Obiectivului general 2 – Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii, rezultatele au fost orientate în principal spre îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și a accesului populației la servicii publice de bază. În acest context, au fost aprobate 21 de proiecte în domeniul alimentării cu apă și sanitației, iar intervențiile în infrastructura de suport pentru afaceri și eficiență energetică au contribuit la dezvoltarea echilibrată a comunităților și la îmbunătățirea condițiilor de trai. Totodată, trei proiecte au contribuit la promovarea eficienței energetice și reducerea consumului de energie în instituții educaționale, unul dintre acestea fiind finalizat în perioada de raportare.

În cadrul Obiectivului general 3 – Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională, principalele rezultate au constat în aprobarea POR Sud 2026–2028 și a Planului de implementare pentru anul 2026, consolidarea participării la procesul de aliniere la acquis-ul UE, precum și dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare. Au fost elaborate și aprobate documente de evaluare și monitorizare, realizate vizite post-implementare și actualizate informațiile privind proiectele regionale. În același timp, consolidarea capacităților actorilor regionali a fost susținută prin sesiuni de instruire, ateliere și alte activități de dezvoltare profesională, cu participarea reprezentanților APL și ai altor actori regionali. În ansamblu, rezultatele semestrului I reflectă avansarea implementării POR Sud 2026–2028 atât prin investiții în infrastructura regională și dezvoltarea economică, cât și prin consolidarea capacităților instituționale, a cooperării interinstituționale și a mecanismelor de monitorizare și evaluare. Aceste intervenții au creat premise pentru continuarea implementării proiectelor și pentru atingerea, în etapele următoare, a rezultatelor și impacturilor prevăzute de program.

Componenta de raportare, bazată pe activitățile realizate de ADR Sud pentru perioada de raportare, în vederea implementării obiectivelor strategice din POR Sud 2026-2028, a derivat cu următoarele rezultate:

- Program Operațional Regional Sud 2026-2028 elaborat și aprobat prin Decizia nr.01/02 din 24.04.2026;
- 2 ședințe ordinare a CRD Sud desfășurate cu aprobarea a 6 decizii;

- 1 Plan de implementare a POR Sud pentru anul 2026 elaborat și aprobat;
- 1 Plan de acțiuni al ADR Sud pentru anul 2026 elaborat și aprobat;
- 1 Plan operațional local al mun. Cahul actualizat și aprobat cu suportul ADR Sud;
- 6 APL consultate cu privire la elaborarea/actualizarea Programelor de revitalizare urbană;
- 1 aplicație depusă în cadrul apelului de Granturi Mici lansat de Swiss Cooperation în Moldova;
- 1 aplicație depusă în cadrul apelului de proiecte: fondul Canadian pentru Inițiative Locale;
- 1 acord de colaborare cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, România încheiat;
- 3 instruiți organizate pentru APL I și II din RDS în domeniul „Implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor”;
- 1 instruire pentru consolidarea capacităților administratorilor de bloc și reprezentanților APL;
- 1 instruire organizată în contextul lansării Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională - apel pe listă (ediția martie 2026);
- 1 seminar științific „Situția geodemografică și Indicele Dezvoltării Umane în localitățile din Regiunea de Sud a RM” organizat de Institutul de ecologie și geografie al RM și facilitat de către ADR Sud;
- 25 proceduri de achiziții evaluate;
- 20 decizii ale grupului de lucru pentru achiziții publice;
- 6 contracte semnate privind LCM și SST
- 26 vizite de monitorizare efectuate;
- 27 ședințe de lucru desfășurate;
- 4 acte de recepție la terminarea lucrărilor;
- 1 proiect finalizat din DUP 2025-2027;
- 34 activități de consolidare a capacităților pentru specialiștii ADR Sud;
- 95 comunicate plasate pe pagina adrsud.md;
- 99 postări pe rețelele de socializare;
- 1 raport elaborat privind realizarea Planului de Activitate al ADR Sud pentru trimestrul I, anul 2026;
- 1 raport elaborat și aprobat privind implementarea POR Sud 2022-2025 pentru anul 2025;
- 1 raport de evaluare POR Sud 2022-2025 elaborat și aprobat;
- 1 raport anual privind implementarea PNDOPC 2021-2027, pentru anul 2025, elaborat și prezentat.

II. Obiectivele programului

Întru realizarea viziunii strategice de dezvoltare regională, la nivelul RD Sud au fost identificate trei obiective generale în corespundere cu direcțiile strategice stabilite în SNDR 2022-2028, adaptate la necesitățile și specificul regiunii, inclusiv perioada de implementarea a POR.

Tabelul 2: Prezentarea schematică a viziunii și obiectivelor strategice stabilite la nivelul RD Sud

Viziunea strategică		
Sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor		
Obiectiv General 1	Obiectiv General 2	Obiectiv General 3
Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a Regiunii de Dezvoltare Sud	Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii	Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de implementare a politicii de dezvoltare regională
Direcții prioritare 1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii 1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiune 1.3. Promovarea specializării inteligente în regiune 1.4. Cooperarea regională și transfrontalieră	Direcții prioritare 2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază din regiune 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri 2.3. Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor	Direcții prioritare 3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională 3.2. Suport în consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională 3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională

Obiectiv General 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud

Conform prevederilor Programului Operațional Regional Sud 2026–2028, Obiectivul general 1 urmărește valorificarea potențialului economic al regiunii prin consolidarea rolului orașelor, îmbunătățirea mediului antreprenorial, promovarea specializării inteligente și dezvoltarea cooperării regionale și transfrontaliere.


În vederea realizării acestui obiectiv, Planul de implementare pentru anul 2026 cuprinde acțiuni și proiecte orientate spre dezvoltarea infrastructurii urbane, susținerea mediului de afaceri, promovarea investițiilor și consolidarea cooperării dintre actorii regionali. Implementarea acestora contribuie la creșterea competitivității economice a Regiunii de Dezvoltare Sud și la crearea unui cadru favorabil dezvoltării durabile.

RD Sud continuă să înregistreze un nivel redus al competitivității economice comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova, fiind în continuare afectată de provocări demografice,

economice și sociale. Evoluțiile din ultimii ani au fost influențate de efectele crizei pandemice, ale războiului din Ucraina, precum și de presiunile inflaționiste și energetice, care au afectat ritmul investițiilor și dezvoltarea mediului de afaceri.

Figura 1 contribuției regiunilor la formarea PIB

Conform datelor Biroului Național de Statistică, contribuția Regiunii de Dezvoltare Sud la formarea Produsului Intern Brut regionalizat (PIBR) a constituit 6,5% în anul 2023, în scădere față de 6,8% în anul 2019, ceea ce confirmă menținerea unui nivel redus al contribuției regiunii la economia națională. În același timp, municipiul Chișinău continuă să concentreze peste 61% din PIB-ul național, ceea ce evidențiază persistența disparităților teritoriale dintre regiuni.

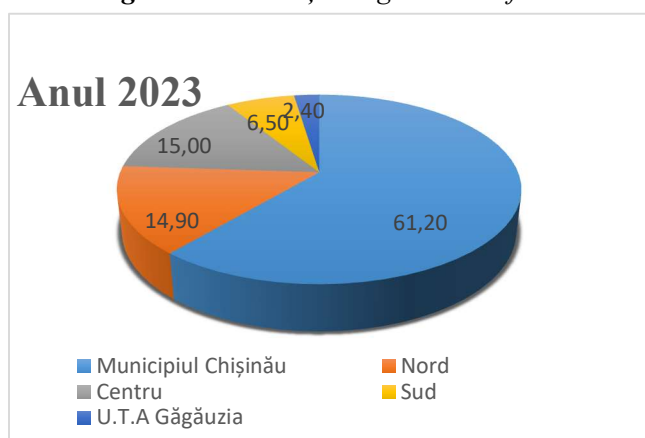

Totodată, dinamica PIB-ului regional pe locuitor indică o evoluție pozitivă a nivelului economic al regiunii. Astfel, PIB-ul regional pe locuitor a crescut de la 37,7 mii lei în anul 2020 la 60,1 mii lei în anul 2023, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 59,4%. Creșterea reflectă intensificarea activităților economice și impactul investițiilor realizate în regiune, însă nivelul înregistrat rămâne insuficient pentru reducerea decalajelor existente față de regiunile cu o dezvoltare economică mai avansată.

Structura economică a RD Sud indică o specializare predominant orientată spre activități cu valoare adăugată relativ redusă. Agricultură deține cea mai importantă contribuție la formarea valorii adăugate brute regionale, reprezentând 22,5%, fiind urmată de activitățile imobiliare (12,4%), învățământ (10,0%), comerț (7,6%) și industria prelucrătoare (7,0%). Ponderea redusă a industriei prelucrătoare evidențiază necesitatea dezvoltării activităților economice cu valoare adăugată mai mare, a diversificării structurii economice și a sprijinirii sectoarelor competitive cu potențial de inovare și creștere.

În acest context, evoluția PIB-ului regional confirmă existența unui potențial economic în creștere, dar și persistența unor vulnerabilități structurale care limitează competitivitatea regiunii. Reducerea disparităților economice și valorificarea avantajelor competitive regionale necesită investiții orientate spre dezvoltarea infrastructurii economice, susținerea mediului antreprenorial, creșterea productivității și dezvoltarea sectoarelor cu potențial de specializare inteligentă, în concordanță cu prioritățile Programului Operațional Regional Sud 2026–2028.

În semestrul I al anului 2026, activitățile aferente Obiectivului general 1 s-au desfășurat în conformitate cu Planul de implementare al Programului Operațional Regional Sud, fiind urmărit progresul proiectelor investiționale și realizarea acțiunilor instituționale prevăzute în cadrul celor patru direcții prioritare.

1.1 Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii

În vederea realizării acestei direcții prioritare, au fost planificate pentru a fi implementate un set de acțiuni care vor fi concentrate pe următoarele măsuri:

Dezvoltarea orașelor-poli de creștere din RD Sud

Măsura respectivă are ca scop sprijinirea dezvoltării municipiului Cahul ca pol de creștere regională, susținând, astfel și dezvoltarea zonelor rurale proxime acestui municipiu.

Dezvoltarea orașelor-poli de creștere reprezintă un instrument al politicii naționale de dezvoltare regională, orientat spre consolidarea rolului centrelor urbane cu potențial de a genera dezvoltare economică și socială în teritoriile adiacente. În Regiunea de Dezvoltare Sud, această direcție prioritară vizează susținerea municipiului Cahul în procesul de dezvoltare ca pol regional de creștere, în conformitate cu Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021–2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2020.

În cadrul Programului orașelor-poli de creștere, ADR Sud implementează două proiecte investiționale în municipiul Cahul. Un proiect este inclus în domeniul de intervenție 2. *Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor*, măsura 2.4., *Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitară și rețelelor de utilități publice (MITERUP)*” (tabelul nr.1), iar cel de-al doilea proiect este implementat conform măsurii 2.2 „*Competitivitate și susținerea activităților economice (CSAE)*” (tabelul nr.5). Aceste proiecte contribuie la consolidarea rolului municipiului Cahul ca pol regional de creștere și la crearea premiselor pentru dezvoltarea economică și socială a localităților din zona sa de influență.

În semestrul I al anului 2026, ADR Sud a acordat suport metodologic autorității publice locale în procesul de implementare a măsurilor prevăzute pentru dezvoltarea municipiului Cahul ca pol regional de creștere. În acest sens, au fost oferite două consultări de specialitate, fiind actualizat și aprobat Planul Operațional Local (POL) al municipiului Cahul prin Decizia Consiliului municipal Cahul nr. 2/26 (22/26) din 25.03.2026. Totodată, a fost acordată consultanță Centrului de management Cahul cu privire la progresul evaluării și elaborării Strategia de dezvoltare socio-economică a municipiului, inclusiv cu privire la participarea în cadrul apelului de rețele pentru acțiune al Programului URBACT, în vederea consolidării cooperării și valorificării oportunităților de dezvoltare urbană.

Tot în perioada de raportare, ADR Sud a elaborat Raportul de progres privind implementarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021–2027, aferent anului 2025, contribuind la monitorizarea implementării măsurilor prevăzute de Program și la evaluarea progresului înregistrat la nivel regional. Raportul a fost aprobat la ședința CRD Sud cu nr 01/01 din 26.03.2026

Tabelul nr.3.

<i>Proiecte în domeniul MITERUP incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026, MDL</i>					
Denumirea proiectului	Costul proiectului				Suma alocată din FNDRL, 2026
	Estimat, conform CF	solicitat din FNDRL	Contribuția beneficiarului	Contractat	
1	2	3	4	5	
Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul	53.539.130,00	46.579.040,00	6.960.090,00	36.794.476,54	2.524.795,03
TOTAL	53.539.130,00	46.579.040,00	6.960.090,00	36.794.476,54	2.524.795,03

Revitalizarea economică și socială a orașelor mici din RD Sud și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice

Intervențiile aferente direcției prioritare de revitalizare urbană sunt orientate spre sprijinirea procesului de dezvoltare integrată a orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud, având la bază Programele de revitalizare urbană (PRU). Acestea stabilesc prioritățile și soluțiile de intervenție adaptate necesităților fiecărui oraș, contribuind la modernizarea infrastructurii urbane, revitalizarea spațiilor publice și îmbunătățirea calității vieții populației.

În perioada de raportare, ADR Sud a întreprins măsuri pentru consolidarea procesului de planificare a revitalizării urbane. În acest context, în perioada 24-25 martie 2026, au fost elaborate și remise 11 solicitări către autoritățile publice locale urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud în scopul cartografierii orașelor interesate să beneficieze de suport tehnic pentru elaborarea sau actualizarea Programelor de revitalizare urbană, în conformitate cu Liniile directoare actualizate privind revitalizarea urbană în Republica Moldova, care au fost aprobate prin Decizia CNCDDL nr. 9 din 11.03.2026. Complementar, au fost acordate 14 consultări către 6 APL urbane din RDS, inclusiv a fost organizată 1 ședință de lucru cu primăria or. Căușeni în procesul de elaborare a PRU.

În cadrul acestei direcții prioritare, Planul de implementare a POR Sud include implementarea a cinci proiecte de revitalizare urbană, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice și la creșterea atractivității orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Tabelul nr.4.

<i>Proiecte în domeniul RUDISP incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026, MDL</i>					
Denumirea proiectului	Costul proiectului				Suma alocată din FNDRL, 2026
	Estimat, conform CF	solicitat din FNDRL	Contribuția beneficiarului	Contractat	
1	2	3	4	5	6
Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni.	20.808.958,00	13.849.790,42	1.976.732,74	15.826.523,16	1.729.503,53
Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr.4 din municipiul Cahul.	19.994.790,00	11.573.444,23	1.774.689,85	13.348.134,08	-
Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Kizil.	9.980.000,00	8.584.497,48	980.000,00	9.564.497,48	1.579.957,08
Crearea complexului turistic „Valul lui Traian”.	18.602.190,00	16.741.971,00	1.860.219,00	15.633.457,25	454.321,86

Revitalizarea Casei de Cultură din orașul Cimișlia	33.159.723,97	24.878.433,78	2.850.538,33	27.728.972,11	11.091.588,84
TOTAL	102.545.661,97	75.628.137,01	9.443.179,92	82.101.584,08	14.401.503,77

Din cele cinci proiecte incluse în această direcție prioritară, proiectul „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din municipiul Cahul” a fost finalizat prin procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr.01 din 25.05.2026. La data raportării, este în curs de elaborare raportul final de implementare a proiectului.

1.2 Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiune

Dezvoltarea economiei regionale reprezintă un factor esențial pentru consolidarea competitivității Regiunii de Dezvoltare Sud și crearea unor surse durabile de venit pentru populație. În acest context, intervențiile sistemice vor fi orientate spre:

Dezvoltarea mediului antreprenorial

În cadrul măsurii de dezvoltare a mediului antreprenorial, ADR Sud implementează proiectul „Construcția și amenajarea pieței agroalimentare regionale din mun. Cahul, etapa II”, prevăzut în Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021–2027. Proiectul contribuie la dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri și la stimularea dezvoltării economice regionale.

Tabelul nr.5

Proiecte în domeniul CSAE incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026, MDL					
Denumirea proiectului	Costul proiectului				Suma alocată din FNDRL, 2026
	Estimat, conform CF	solicitat din FNDRL	Contribuția beneficiarului	Contract at	
1	2	3	4	5	6
Construcția și amenajarea pieței agroalimentare regionale din mun. Cahul, etapa II	35.548.740,00	15.000.000,00	20.548.740,00	-	1,00
TOTAL	35.548.740,00	15.000.000,00	20.548.740,00	-	1,00

Sporirea atractivității turistice

Intervențiile în domeniul sporirii atractivității turistice sunt orientate spre dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice și valorificarea patrimoniului natural și cultural al Regiunii de Dezvoltare Sud. În cadrul acestei măsuri, sunt aprobate spre implementare șase proiecte investiționale, prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr.6.

Proiecte în domeniul SAT incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026, MDL		
	Costul proiectului	

<i>Denumirea proiectului</i>	<i>Estimat, conform CF</i>	<i>solicitat din FNDRL</i>	<i>Contribuția beneficiarului</i>	<i>Contractat</i>	<i>Suma alocată din FNDRL, 2026</i>
1	2	3	4	5	6
Finisarea construcției edificiului Teatrului Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hașdeu” din mun. Cahul	16.215.000,00	14.593.580,00	1.624.520,00	-	3.046.337,55
Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabasca)	29.200.000,00	25.000.000,00	4.200.000,00	-	1,00
Văleni – Hub turistic regional	25.000.000,00	22.500.000,00	2.500.000,00	-	1,00
Dezvoltarea Infrastructurii Turistice în Zona Ramsar Nistrul de Jos	25.484.997,54	23.264.097,54	2.584.899,73	-	1,00
Cantemir Adventure Park - CAP	29.288.002,31	25.000.000,00	4.288.002,31	19.757.201,19	1,00
Conectăm Istoria și Natura prin turism durabil în Raioanele Cimișlia, Căușeni și Ialoveni	20.456.436,56	18.151.792,90	2.304.643,66	-	1,00
TOTAL	145.644.436,41	14.593.580,00	17.502.065,70	19.757.201,19	3.046.342,55

1.3 Promovarea specializării inteligente în regiune

Intervențiile în domeniul promovării specializării inteligente sunt orientate spre valorificarea potențialului economic și inovativ al Regiunii de Dezvoltare Sud, prin susținerea domeniilor prioritare de specializare inteligentă și consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri, instituțiile de cercetare și învățământ superior. Implementarea acestei măsuri urmărește creșterea competitivității regionale și dezvoltarea unei economii bazate pe inovare și cunoaștere.

În perioada de raportare, ADR Sud a sprijinit organizarea evenimentelor dedicate dezvoltării mediului de afaceri și promovării cooperării dintre actorii regionali. În acest sens, Agenția a transmis către Centrul

Inotek din Cahul o bază de date cu stakeholderi regionali cartografiați, în vederea facilitării organizării evenimentului „Cahul Business Summit”, ediția a V-a. Activitatea a avut drept scop consolidarea dialogului dintre mediul de afaceri, autoritățile publice, mediul academic și alți actori relevanți, contribuind la promovarea oportunităților de colaborare și inovare în regiune. Totodată, ADR Sud a dezvoltat și aplicat 1 concept de proiect în cadrul apelului de granturi mici lansat de Swiss Cooperation în Moldova, în scopul facilitării procesului de inovare în domeniul agro-industrie alimentară.

1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră

Cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională reprezintă un instrument important pentru promovarea dezvoltării regionale durabile și consolidarea capacității instituționale a Regiunii de Dezvoltare Sud. În acest context, ADR Sud contribuie la dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor regionale și internaționale, participă la implementarea programelor de cooperare europeană și sprijină identificarea oportunităților de finanțare prin programele Interreg și alte inițiative de cooperare, în vederea valorificării bunelor practici și promovării dezvoltării socio-economice a regiunii.

În perioada de raportare, ADR Sud, în calitate de membru al Grupului Național de Lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană a examinat proiectul dispoziției pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 42-d din 28 februarie 2024 cu privire la instituirea Grupului național de lucru aferent.

De asemenea, ADR Sud a inițiat, propus, coordonat și încheiat la data de 03.06.2026 un Acord de colaborare cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, România.

Totodată, în perioada de referință, pentru promovarea și asigurarea transparenței și vizibilității activităților desfășurate de ADR Sud în realizarea obiectivelor de dezvoltare regională, pe pagina oficială a instituției au fost publicate peste 95 de comunicate informative. Ca rezultat al mediatizării constante, site-ul ADR Sud a înregistrat un număr de 2.188.736 de vizualizări.

Pentru a asigura un impact mai mare și o diseminare cât mai largă a informațiilor către public, precum și pentru promovarea politicii de dezvoltare regională, ADR Sud a utilizat rețelele de socializare, în special Facebook și LinkedIn, ca platforme de comunicare. În total, pe aceste rețele au fost realizate 99 de postări, care au înregistrat un impact de 297.773 de persoane, contribuind astfel la creșterea vizibilității activității instituției și a rezultatelor obținute.

Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii

Potrivit Programului Operațional Regional Sud 2026–2028, sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii constituie un obiectiv prioritar al politicii de dezvoltare regională. Acesta urmărește reducerea disparităților teritoriale prin îmbunătățirea accesului populației la servicii publice de calitate, dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, promovarea eficienței energetice și susținerea unei dezvoltări echilibrate a comunităților urbane și rurale. Implementarea acestor intervenții contribuie la creșterea calității vieții și la consolidarea dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud, fiind totodată corelată cu obiectivele de modernizare a administrației publice și de consolidare a coeziunii teritoriale promovate la nivel național.

În anul 2026, RD Sud a continuat să facă progrese în domeniul infrastructurii edilitare. La moment, nu sunt accesibile date actualizate privind alți indicatori ai infrastructurii edilitare, iar informațiile prezentate se referă exclusiv la rata de acces la rețelele publice de apă și canalizare. Datele disponibile arată următoarele succese:

Tabelul nr. 1. Rata de acces a populației la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare

Anul	Indicator statistic ¹					
	Rata de acces a populației la rețele publice de alimentare cu apă, %			Rata de acces a populației la rețele publice de canalizare, %		
	Total	Urban	Rural	Total	Urban	Rural
2020	65,5	79,9	59,7	10,5	37,3	0,5
2021	80,3	94,0	75,8	12,4	47,3	1,0
2022	82,7	95,2	79,1	12,1	49,8	1,3
2023	83,0	98,1	78,7	11,7	48,3	1,3
2024	85,3	95,6	82,0	14,0	52,8	1,5

Rata de acces la rețelele publice de alimentare cu apă a înregistrat o creștere constantă în perioada 2020–2024, de la 65,5% în 2020 la 85,3% în 2024, ceea ce reprezintă o majorare de 19,8 puncte procentuale. Comparativ cu anul 2023 (83,0%), în 2024 se atestă o nouă creștere, confirmând tendința pozitivă de extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și sporirea accesului populației la servicii publice de bază.

În mediul urban, rata de acces a atins 95,6% în 2024 (față de 98,1% în 2023), iar în mediul rural s-a înregistrat o creștere semnificativă, de la 78,7% în 2023 la 82,0% în 2024. Această evoluție indică o îmbunătățire vizibilă a accesului în localitățile rurale și o reducere treptată a decalajului dintre mediul urban și cel rural, chiar dacă diferențele persistă.

În ceea ce privește accesul la rețelele publice de canalizare, în 2024 se constată o creștere mai pronunțată comparativ cu anii precedenți. Rata totală a ajuns la 14,0%, față de 11,7% în 2023, ceea ce reprezintă un progres de 3,5 puncte procentuale față de 2020. În mediul urban, accesul a crescut la 52,8% în 2024 (comparativ cu 48,3% în 2023), iar în mediul rural s-a înregistrat o creștere ușoară, de la 1,3% la 1,5%.


Cu toate acestea, diferențele între mediul urban și rural rămân semnificative, în special în domeniul canalizării, unde accesul în zonele rurale este extrem de redus.

În concluzie, anul 2024 confirmă continuarea tendinței pozitive privind extinderea accesului la apă potabilă și marchează un progres mai vizibil în domeniul canalizării comparativ cu perioada 2020–2023. Totuși, infrastructura de canalizare, în special în mediul rural, necesită în continuare investiții prioritare pentru reducerea disparităților și asigurarea unor condiții adecvate de trai la nivel regional.

Figura nr. 2. Ponderea localităților deservite de sistemul public de alimentare cu apă, pe regiuni de dezvoltare, anul 2020- 2024, %²

¹ Informația este calculată în baza studiului prin sondaj în gospodării (bazat pe eșantion) „Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC)”. Sursa: Informația oferită de către Biroul Național de Statistică, în baza solicitării cu Nr.64 din 10.02.2026


² Sursa: https://statistica.gov.md/ro/activitatea-sistemelor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-in-anul-202-9780_61786.html

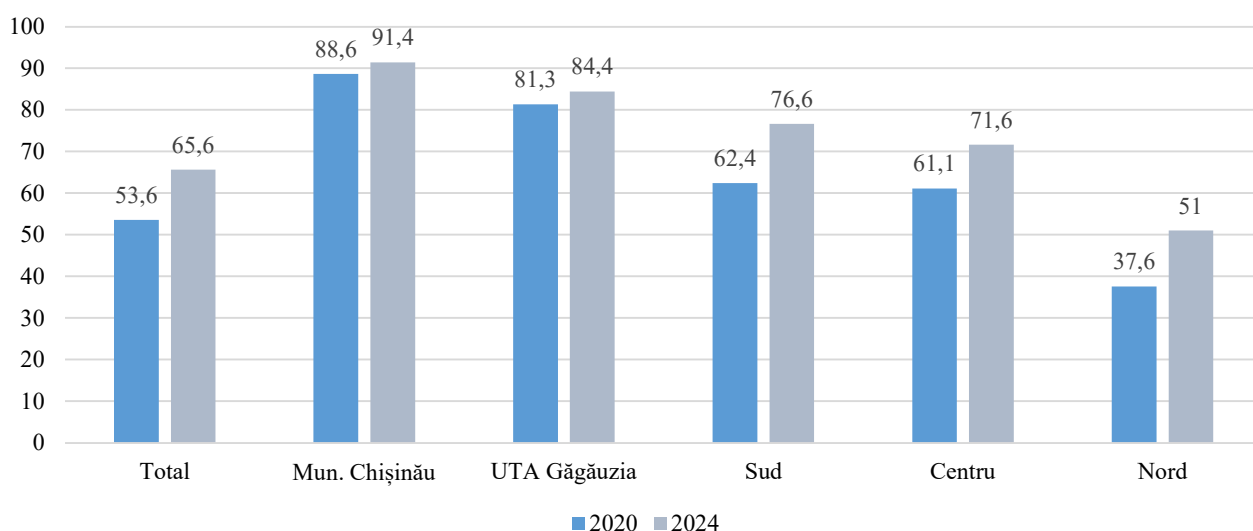

Analizând datele ce se referă la Ponderea localităților deservite de sistemul public de alimentare cu apă, pe regiune anul 2020-2024, de asemenea se atestă o creștere a numărului de localități deservite de sistemul de alimentare cu apă.

În anul 2024 localitățile din mun. Chișinău și UTA Găgăuzia dețin cel mai mare nivel de conectare la sistemele publice de alimentare cu apă fiind urmate de Regiunea Sud, Regiunea Centru și Nord. Regiunea Sud înregistrează o majorare cu 14,2% a ponderii localităților cu acces la sistemele publice de alimentare cu apă, în anul 2024 față de anul 2020, depășind toate regiunile la acest aspect. Ceea ce semnifică accelerarea accesului la sistemele publice de alimentare cu apă datorită proiectelor și programelor de dezvoltare regională și locală.

Figura nr. 3. Ponderea localităților deservite de sistemul public de canalizare, pe regiuni de dezvoltare, anul 2020- 2024, %³

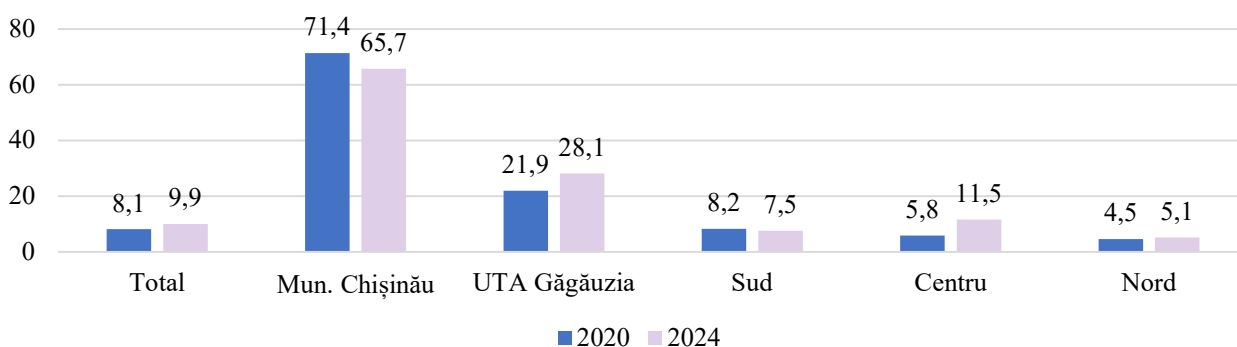

Cea mai mare pondere a localităților cu acces la sistemele publice de canalizare (Figura 4) s-a înregistrat în mun. Chișinău (65,7%), UTA Găgăuzia (28,1%) și regiunea Centru (7,5%), iar localitățile din regiunile Sud și Nord au cele mai mici rate de acces (7,5% și respectiv, 5,1%). Totuși se atestă o majorare cu 3,30% a ponderii localităților din Regiunea Sud cu acces la sistemul de canalizare comparativ cu anul 2020, aceasta fiind rezultatul implementării unui șir de proiecte în regiunea Sud.

³ Sursa: https://statistica.gov.md/ro/activitatea-sistemelor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-9780_61263.html

În ceea ce privește accesul populației la sisteme de colectare a deșeurilor, conform răspunsului oferit de Biroul Național de Statistică la solicitarea ADR Sud, instituția nu deține, la acest moment, date statistice care să permită evaluarea acestui indicator.

Totodată, este important de menționat că acest indicator este monitorizat de către Ministerul Mediului, care colectează și analizează informații relevante în domeniul gestionării deșeurilor la nivel național.

2.1 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud

În vederea realizării direcției privind îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare în domeniul aprovizionare cu apă și sanitație, în RD Sud au fost aprobate spre finanțare 21 proiecte.

Finanțarea acestora fiind asigurată din sursele FNDRL cât și contribuțiile autorităților aplicante. Activitățile planificate întru realizarea direcției respective, se axează pe facilitarea din partea ADR Sud a procesului de implementare a proiectelor din domeniul AAS.

Pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a sectorului AAS în regiune, ADR Sud implementează în perioada anilor 2026 – 2028 următoarele proiecte cu impact regional din sursele FNDRL:

Tabelul nr.7 (detalii anexa 3)

<i>Proiecte în domeniul AAS incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026, MDL</i>					
Denumirea proiectului	Costul proiectului				
	Estimat, conform CF	Solicitat din FNDRL	Contribuția beneficiarului	Contractat	Suma alocată din FNDRL, 2026
1	2	3	4	5	
Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelilor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova.	46.283.370,00	41.654.980,66	4.628.389,34	36.216.977,34	1.509.292,84
Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova.	38.374.910,00	31.554.106,00	6.820.804,00	33.978.985,95	27.916.037,03
Construcția apeductului magistral Sărata Nouă-Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadăr.	58.494.800,00	52.413.539,99	6.081.260,01	57.716.342,25	779.445,81
Apeduct magistral Ștefan Vodă - Căușeni-Căinari	5.555.555,00	-	555.555,55	510.600,00	1,00
Extinderea sistemului de	37.911.290,00	32.509.190,27	4.153.325,69	36.662.515,96	3.257.920,87

Proiecte în domeniul AAS incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026, MDL					
Denumirea proiectului	Costul proiectului				
	Estimat, conform CF	Solicitat din FNDRL	Contribuția beneficiarului	Contractat	Suma alocată din FNDRL, 2026
1	2	3	4	5	
canalizare în orașul Cimișlia					
Finalizarea stației de pompare a apelor reziduale pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare în regiunea de Nord-Vest a orașului Cimișlia	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	4.673.147,33	4.673.147,34
Finalizarea construcției sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea Perjei, r-nul Cimișlia	11.772.450,00	54.000,00	-	10.307.595,89	3.046.337,00
Construcția apeductelor magistrale spre satul Frumușica și Cîzlar și construcția rețelelor de apeduct interioare și canalizare în localitățile Sărăteni, Covurlui și Cîzlar din raionul Leova	62.928.230,00	54.118.270,00	8.809.960,00	62.928.230,00	1,00
Construcția rețelei de canalizare în satul Ursoaia, raionul Căușeni	48.400.000,00	43.560.000,00	4.840.000,00	-	1,00
Regionalizarea serviciului de canalizare în satul Opaci și comuna Baccealia, prin conectarea la rețeaua și stația de pompare a apelor uzate din satul Zaim	65.310.566,00	58.779.509,40	6.531.056,60	-	1,00
Modernizarea stației regionale de epurare a apelor uzate prin mărirea capacității	35.097.636,00	31.587.872,40	3.509.763,00	35.097.636,00	1,00
Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni, etapa finală	71.935.764,00	60.000.000,00	11.935.764,00	-	1,00
Servicii de canalizare calitative pentru	54.157.600,00	48.741.840,00	5.415.760,00	-	1,00

Proiecte în domeniul AAS incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026, MDL					
Denumirea proiectului	Costul proiectului				
	Estimat, conform CF	Solicitat din FNDRL	Contribuția beneficiarului	Contractat	Suma alocată din FNDRL, 2026
1	2	3	4	5	
populația comunei Manta, r. Cahul					
Construcția sistemului de canalizare în satul Crihana Veche, Cahul, și conectarea la operatorul regional SA Apă Canal Cahul (parte a proiectului co-finanțat de KFW)	24.131.674,98	21.718.507,48	2.413.167,50	-	1,00
Extinderea sistemului de apă și sanitație în orașul Leova	33.691.130,00	30.322.017,00	3.369.113,00	-	1,00
Construcția stației de epurare și a sistemelor de canalizare regionale pentru locuitorii din satele Vișniovca, Capaclia și Șamalia, raionul Cantemir	49.954.294,00	44.953.455,00	5.000.839,00		1,00
Construcția sistemului de canalizare în orașul Iargara, raionul Leova (Etapa I).	56.620.000,00	50.958.000,00	5.662.000,00	-	1,00
Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Baimaclia și satul Taraclia r-nul Căușeni	41.956.690,00	37.761.021,00	4.195.669,00	-	1,00
Reabilitarea sistemului de apeduct și construcția sistemului de canalizare în sectoarele „Malina”, „Taiwani/Centru”, „Cogîlnic”, s. Bogdanovca Nouă din orașul Cimișlia	47.804.310,30	43.000.000,00	4.804.310,30	-	1,00
Sisteme de canalizare în localitățile Cîrnățeni, Chircăiești și Plop Știubei din raionul Căușeni	74.377.639,00	60.000.000,00	14.377.639,00	-	1,00

<i>Proiecte în domeniul AAS incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026, MDL</i>					
Denumirea proiectului	Costul proiectului				
	Estimat, conform CF	Solicitat din FNDRL	Contribuția beneficiarului	Contractat	Suma alocată din FNDRL, 2026
1	2	3	4	5	
Construcția magistralei de apeduct pentru satele raionului Cantemir (Cantemir, Lărguța, Cîrpești, Țiganca, Stoianovca) – etapa I	52.484.520,00	47.236.068,00	5.248.452,00	-	1,00
TOTAL	924.424.429,28	797.922.377,70	108.352.827,99	278.092.030,72	41.182.195,89

2.2 Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri

Elementul cheie al acestei măsuri reprezintă crearea de noi structuri regionale și locale de sprijinire a afacerilor, modernizarea și extinderea celor existente având ca scop atragerea investițiilor, revigorarea și dezvoltarea economiilor locale și regionale.

Pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a sectorului VIA în regiune, ADR Sud implementează un proiect cu impact regional din sursele FNDRL:

Tabelul nr.8

<i>Proiecte în domeniul VIA incluse în PAF din FNDRL pentru anul 2026 MDL</i>					
Denumirea proiectului	Costul proiectului				Suma alocată din FNDRL, 2026
	Estimat, conform CF	Actualizat	Contribuția beneficiarului	Contractat	
1	2	3	4	5	6
Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune	17.766.880,00	14.000.000,00	1.561.000,00	15.908.318,91	1.019.561,10
TOTAL	17.766.880,00	14.000.000,00	1.561.000,00	15.908.318,91	1.019.561,10

2.3 Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbări climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor:

În cadrul acestei măsuri, intervențiile sunt orientate spre sprijinirea procesului de adaptare la schimbările climatice prin promovarea eficienței energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie și valorificarea durabilă a resurselor. Implementarea acestor acțiuni contribuie la reducerea impactului asupra mediului, creșterea rezilienței comunităților locale și dezvoltarea durabilă a Regiunii de Dezvoltare Sud.

În perioada de raportare, ADR Sud nu a implementat acțiuni dedicate exclusiv acestei măsuri. Cu toate acestea, obiectivele privind creșterea eficienței energetice sunt promovate prin implementarea a trei proiecte finanțate din mijloacele FNDRL, în cadrul direcției prioritare „Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii”.

Proiectele vizează modernizarea infrastructurii educaționale, dintre care două sunt implementate în instituții de educație timpurie, iar unul într-o instituție de învățământ liceal. Intervențiile includ măsuri de reabilitare energetică a clădirilor, reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor de confort pentru beneficiari, contribuind astfel la atingerea obiectivelor privind adaptarea la schimbările climatice și utilizarea eficientă a resurselor. Din cele trei proiecte aflate în implementare, unul a fost finalizat în perioada de raportare, iar celelalte două continuă conform graficului de implementare.

Obiectivul general 3

Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională

Obiectivul urmărește consolidarea managementului procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională, prin îmbunătățirea mecanismelor de planificare, coordonare, monitorizare și evaluare a investițiilor publice orientate spre dezvoltarea regională, precum și alinierea la cerințele și practicile Uniunii Europene.

Scopul acestui obiectiv este acela de a îmbunătăți managementul procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională. În acest sens, întru realizarea acestui deziderat, acțiunile au fost orientate spre:

- Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională;
- Consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională;
- Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională.

Realizarea acestui obiectiv necesită consolidarea tuturor actorilor instituționali implicați în procesul dezvoltării regionale asigurând o abordare unică și integrată de planificare, coordonare și evaluare a investițiilor publice direcționate spre dezvoltarea regiunilor. Acest fapt, presupune o comunicare între actorii responsabili cât mai eficientă, concentrarea eforturilor comune necesare implementării politicii de dezvoltare regională, dar și experiențele noi aferente politicii de dezvoltare regională.

3.1 Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională

Intervențiile aferente acestei măsuri sunt orientate spre consolidarea cadrului instituțional și eficientizarea proceselor de planificare, coordonare, monitorizare și evaluare a politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud. Acestea contribuie la îmbunătățirea mecanismelor de implementare a Programului Operațional Regional Sud 2026–2028 și la consolidarea cooperării dintre instituțiile implicate în procesul de dezvoltare regională.

În perioada de raportare, activitățile realizate în cadrul acestei direcții au vizat participarea la procesul de aliniere la acquis-ul Uniunii Europene, sprijinirea îmbunătățirii cadrului instituțional al politicii de dezvoltare regională, dezvoltarea capacităților autorităților publice locale și alți actori regionali, precum și îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și evaluare a politicii și programelor de dezvoltare regională.

➤ Participarea la procesul de aliniere la acquis-ul Uniunii Europene în contextul Capitolului 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”

În semestrul I al anului 2026, reprezentanți ai ADR Sud au participat la activitatea Grupului de lucru pentru Capitolul 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, contribuind la examinarea documentelor și la procesul de aliniere a politicii de dezvoltare regională la cerințele Uniunii

Europene. În acest context, a fost elaborată 1 contribuție la rapoartele de extindere, prin completarea chestionarului aferent contribuției la Pachetul de extindere 2026.

➤ **Sprijinirea îmbunătățirii cadrului instituțional al politicii de dezvoltare regională, prin consolidarea capacității administrative a autorităților implicate, precum și prin stimularea cooperării interinstituționale și interregionale**

Una dintre acțiunile prioritare realizate în perioada de raportare a fost elaborarea și aprobarea Programului Operațional Regional Sud 2026–2028. Acțiunea a fost realizată în conformitate cu cadrul normativ și metodologic în vigoare, Programul fiind aprobat prin Decizia CRD Sud nr. 01/02 din 24 aprilie 2026. Ulterior, prin Decizia CRD Sud nr. 02/02 din 24.04.2026 a fost aprobat și Planul de implementare a Programului Operațional Regional Sud 2026–2028 pentru anul 2026, document care stabilește acțiunile și intervențiile planificate pentru anul curent.

În vederea asigurării procesului decizional și a implementării politicii de dezvoltare regională, în prima jumătate a anului 2026 au fost organizate 2 ședințe ale CRD Sud, în cadrul cărora au fost adoptate 6 decizii ce au asigurat funcționarea procesului decizional și implementarea politicii de dezvoltare regională

Subsidiar, ADR Sud a participat la procesul de elaborare /examinare a cadrului normativ și metodologic în domeniul dezvoltării regionale, prin examinarea documentelor de politici/ programare, actelor normative și formularea propunerilor de îmbunătățire înaintate autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională. În acest sens, au fost examinate 11 documente, fiind înaintate 57 propuneri/comentarii:

- 1 proiect de HG cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Turism 2029” pentru anii 2026-2029;
- 1 proiect de HG pentru modificarea HG nr.152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală;
- 1 proiect al dispoziției pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 42-d din 28 februarie 2024 cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană;
- 1 proiect al Programului național de dezvoltare a sectorului alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2026-2030;
- 1 proiect de HG pentru modificarea HG nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în RM;
- 2 proiecte ale Manualului operațional cadru al ADR;
- 1 proiect al Studiului de fezabilitate a Secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a teritoriului Național;
- 1 plan de consultări publice;
- 1 proiect al Programului de interconectare sustenabilă România-Moldova.

În vederea dezvoltării capacităților instituționale ale autorităților administrației publice locale, în perioada de raportare au fost organizate 3 sesiuni de instruire privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, în baza Conceptului pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale, aprobat prin Ordinul MIDR nr. 166 din 21.11.2024. Aceste instruirii au reunit 89 de participanți din cadrul autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Sud.

➤ **Desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare a politicii și programelor de dezvoltare regională.**

Activitățile aferente acestei măsuri sunt orientate spre consolidarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a politicii și programelor de dezvoltare regională, urmărind aprecierea gradului de realizare a obiectivelor stabilite, evaluarea rezultatelor obținute și identificarea oportunităților de îmbunătățire a procesului de planificare și implementare a intervențiilor viitoare.

În perioada de raportare, în vederea asigurării unui proces eficient de monitorizare și evaluare a documentelor de programare regională, a fost elaborat raportul de Evaluare a POR Sud 2022–2025 și aprobat la sedința CRD Sud 03/01 din 26.03.2026. Documentul a avut drept scop analiza gradului de realizare a obiectivelor stabilite, evaluarea rezultatelor obținute în perioada de implementare și formularea concluziilor privind eficiența intervențiilor realizate.

Un accent important în procesul de monitorizare a fost acordat evaluării durabilității proiectelor finalizate, prin aprecierea modului în care rezultatele investițiilor sunt menținute, utilizate și valorificate de către beneficiari în etapa post-implementare.

Astfel, au fost organizate și desfășurate 3 vizite de monitorizare post-implementare pentru următoarele proiecte:

- „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”(17.06.2026);
- „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru”” or. Leova (22.06.2026);
- „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova” (22.06.2026).

Vizitele realizate au permis colectarea informațiilor privind modul de utilizare a investițiilor, menținerea rezultatelor obținute și durabilitatea proiectelor implementate, informații care vor sta la baza elaborării rapoartelor de impact.

3.2 Suport în consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională

Scopul acestei direcții constă în realizarea cartografierii anuale a proiectelor implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, în vederea consolidării unei baze de date actualizate privind intervențiile realizate în regiune. Procesul de cartografiere permite identificarea distribuției teritoriale și sectoriale a proiectelor, evidențierea surselor de finanțare, a domeniilor de intervenție și a beneficiarilor, contribuind la o mai bună coordonare a asistenței externe și la fundamentarea procesului de planificare și monitorizare a dezvoltării regionale.

În perioada de raportare nu au fost desfășurate activități de cartografiere a proiectelor implementate cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Realizarea exercițiului anual de cartografiere este planificată pentru semestrul II al anului 2026, urmând să fie colectate și sistematizate informațiile privind proiectele implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud, în vederea actualizării bazei de date și elaborării analizei privind distribuția intervențiilor la nivel regional.

3.3 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională

Scopul acestei măsuri constă în consolidarea capacităților instituționale și profesionale ale actorilor implicați în implementarea politicii de dezvoltare regională. În acest sens, activitățile desfășurate sunt orientate spre dezvoltarea competențelor autorităților publice locale și ale altor actori regionali, prin

instruire, schimb de experiență și acordarea de asistență tehnică, contribuind astfel la îmbunătățirea capacității de planificare și implementare a proiectelor de dezvoltare regională.

Astfel, în perioada de raportare, ADR Sud a organizat 1 sesiune de instruire pentru reprezentanți ai Asociațiilor de proprietari din condominiu, inclusiv ai primăriei mun. Cahul în contextul concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională (apel pe listă) lansat de MIDR, ediția martie 2026.

De asemenea, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), angajații ADR Sud au organizat prima ediție a atelierului de instruire „Școala Administratorilor de Bloc”, desfășurată la 30 mai 2026 în orașul Cimișlia. La instruire au participat peste 40 de administratori de bloc, reprezentanți ai asociațiilor de proprietari și ai autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Prin urmare, în perioada de referință, au fost organizate următoarele forme de instruire cu participarea actorilor regionali, după cum urmează:

Tabelul nr.9. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali pe forme de instruire (Anexa nr. 1)

Forma de instruire	# sesiuni	Număr de participari			
		ADR Sud	CRD Sud	APL din RD SUD	Total participanți
Sesiuni de instruire /training-uri	13	54	-	135	189
Ședințe, ateliere de lucru, mese rotunde	19	52			52
Vizite de studiu/conferințe/forumuri	3	6	-	-	6

Astfel, au fost organizate și desfășurate activități de instruire și informare orientate spre consolidarea competențelor profesionale ale specialiștilor ADR Sud, membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud și reprezentanților autorităților publice locale. Domeniile abordate au vizat implementarea și managementul proiectelor de dezvoltare regională, monitorizarea și evaluarea proiectelor, oportunitățile de finanțare prin programele naționale și europene, dezvoltarea urbană și regională, utilizarea platformelor informaționale de monitorizare, managementul financiar, achizițiile publice, prevenirea și combaterea corupției, precum și dezvoltarea competențelor administrative necesare implementării eficiente a politicii de dezvoltare regional.

III. CONCLUZII

În semestrul I al anului 2026, activitățile desfășurate în cadrul POR Sud 2026–2028 au fost orientate, spre asigurarea cadrului necesar implementării noului ciclu de programare regională. Prioritate a constituit elaborarea, consultarea și aprobarea POR Sud 2026–2028 și a Planului de implementare pentru anul 2026, precum și organizarea mecanismelor instituționale necesare coordonării, monitorizării și evaluării implementării Programului.

Totodată, în perioada de raportare au fost elaborate și aprobate rapoartele de evaluare și monitorizare aferente perioadei precedente, inclusiv Raportul de evaluare a POR Sud 2022–2025 și Raportul de progres privind implementarea PNDOPC pentru anul 2025, asigurând astfel continuitatea procesului de monitorizare și fundamentarea noului ciclu de programare

În paralel, au continuat activitățile de implementare a proiectelor finanțate din FNDRL. Eforturile au fost concentrate atât asupra executării lucrărilor în cadrul proiectelor aflate în implementare, cât și asupra

pregătirii documentației tehnice și desfășurării procedurilor de achiziții publice pentru proiectele nou lansate. În perioada de raportare a fost finalizat un proiect de dezvoltare regională, iar celelalte proiecte au avansat conform etapelor de implementare stabilite.

Rezultatele obținute se reflectă și în indicatorii de monitorizarea programului. Astfel, rata proiectelor finalizate din totalul proiectelor incluse în DUP 2025–2027 constituie 10,81%, iar gradul de valorificare a bugetului alocat conform PAF 2026 a atins 9,95%. Totodată, rata de implementare a POR Sud este de 27,7%, ceea ce indică un progres corespunzător etapei de început a noului ciclu de programare.

Provocări și riscuri

Pe parcursul semestrului I al anului 2026, implementarea POR Sud 2026–2028 a fost influențată de o serie de factori care pot afecta ritmul de realizare a proiectelor și atingerea indicatorilor planificați cum ar fi:

- durata procedurilor de achiziții publice și a proceselor de avizare, care generează întârzieri în lansarea și implementarea proiectelor;
- insuficiența mijloacelor financiare alocate în raport cu necesitățile investiționale ale regiunii;
- capacitatea administrativă diferită a beneficiarilor în gestionarea și implementarea proiectelor de investiții;
- necesitatea menținerii unui ritm constant de implementare a proiectelor.

Lecții învățate și bune practici

Implementarea Programului în prima jumătate a anului 2026 a confirmat importanța unei planificări riguroase și a cooperării permanente dintre ADR Sud, MIDR, autoritățile publice locale și ceilalți parteneri implicați în procesul de dezvoltare regională.

În procesul de implementare au fost identificate o serie de provocări, inclusiv necesitatea consolidării capacităților beneficiarilor, clarificării aspectelor procedurale și asigurării unei coordonări eficiente între instituțiile implicate. În acest context, activitățile de instruire, ședințele de lucru și asistența metodologică oferită beneficiarilor au contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale, schimbul de experiență și identificarea soluțiilor pentru depășirea dificultăților întâmpinate în implementarea proiectelor.

Partea operațională. Implementarea Planului de acțiuni al POR Sud 2026-2028 pentru semestrul I, 2026

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Obiectiv general 1. Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud									
	Direcția prioritară 1.1 Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității RD Sud									
	Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL									
1.1.1	Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni	Obiecte publice renovate (nr.) – 0/2 (2); Complexe sportive multifuncționale (nr.) – 1/1 (1); Terenuri de joacă amenajate pe teritoriul Grădiniței de copii nr. 6 „Lia-Ciocârlia” (nr.) – 6/6 (6); Terenuri de joacă și agrement	Spații publice modernizate și amenajate funcțional în zona de revitalizare (nr.) – 10/10; Localități beneficiare de revitalizare urbană (nr.) – 0/1.	20.808.958,00	18.209.357,32	2.599.600,68	2.229.503,53	12 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Căușeni <i>Parteneri:</i> CR Căușeni	În proces de realizare: - 1 IP – Grădinița nr.6. Lia Ciocârlia; - 3,84 % din IP- gimnaziul „D. Cantemir”; - Scrisoare nr. 01-31/23 din 31.03.2026 privind finalizarea lucrărilor Provocări constatate la etapa de

¹ Indicatorii obținuți și prezentați în rapoarte de progres anuale vor constitui valori de referință.

² Indicatorii planificați a fi atinși conform mijloacelor financiare solicitate pentru anul 2026.

³ Indicatorii planificați a fi atinși conform Cererii de finanțare.

⁴ Indicatorii de rezultat sunt planificați a fi atinși în faza finală de implementare a proiectelor.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		amenajate în curtea blocurilor (nr.) – 3/3 (3).								obținere a certificatului de inspectare a bunului imobil
1.1.2	Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul	Rețele de cablu pentru iluminare stradală modernizate/realitate (km) – 95,2/95,4 (95,4); Corpuri LED de iluminat instalate pe întreg teritoriu al mun. Cahul (nr.) - 2882/2885 (2885); Piloni montați (nr.) – 758/ 760 (760); Dulap de distribuție – 41/44 (44).	Beneficiari a zonelor neiluminate stradal (nr.) –0 / cca 10000; Beneficiari direcți ai serviciului de iluminat stradal (nr.) – 15000/cca 40000;	53.539.130,00	46.579.040,00	6.960.090,00	3.172.206,84	24 luni	Aplicant: Primăria mun. Cahul	În proces de realizare: -1 ,50 km rețele de cablu pentru iluminare stradală modernizate/reabilitate; - 115 corpuri LED de iluminat instalate; - 81 piloni montați; -150 buc. de console montate; -66 panouri de comandă instalate

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3	Crearea complexului turistic „Valul lui Traian”	Zone de recreere la scară mare din orașele (nr.) – 0/1 (1); Atracții turistice renovate (nr.) – 1/ 2 (2); Atracții turistice amenajate (nr.) – 1/1 (1); Teritoriu amenajat (ha) – 15/ 15 (15); Ecosfere de cazare create (nr.) – 10/10 (10).	Spații publice modernizate și amenajate funcțional în zona de revitalizare (nr.) - 2/2; Populația deservită (nr. loc.) – 0/1646 (loc. ai zonei de revitalizare); 9 705 (locuitori ai orașului Leova).	18.602.190,00	16.741.971,00	1.860.219,00	454.321,86	15 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Leova	În proces de realizare: Lucrări sistate din lipsa soluției privind amplasarea Stație de pompare a apei pentru umplerea zone de agrement
1.1.4	Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Kizil	Poduri de piatră de Cosăuți (nr.) – 3/3 (3); Pavaj pietonal (m) – 1120/1220 (1220);	Spații publice modernizate și amenajate funcțional în zona de revitalizare (nr.) - 0/1;	9.980.000,00	9.000.000,00	980.000,00	1.579.964,08	24 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Ștefan Vodă	În proces de realizare: - 1220 m de pavaj pietonal executat (16,45%);

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Spațiu înverzit (ha) – 1,5/1,6 (1,6); Albia râului curățată (m) – 556/610 (610); Fântână germană reconstruită (nr.) – 1/1 (1); Clopotniță germană reconstruită (nr.) – 1/1 (1); Pistă pentru bicicliști (nr.) – 1/1 (1); Parcare pentru automobile (nr.) – 1/1 (1).	Traseu turistic cultural-istoric (nr.) – 0/1; Căi de acces peste râul Gealair (nr.) – 3/3;							- 1,6 ha de spațiu înverzit (19,80%); - 610 m de albia râului curățită și pavată (14,80 %) - 1 fântână germană reconstruită (6,80%); Scrisoare nr. 01-31/38 din 27.05.2026 privind finalizarea lucrărilor
1.1.5	Revitalizarea Casei de Cultură din orașul Cimișlia	Zone de recreere la scară mare din orașele (nr.) – 0/1 (1); Alți indicatori pentru proiectele eligibile spre	Centre civice urbane bine amenajate și simbolistici (nr.) – 0/1; Alte rezultate scontate	33.159.723,97	29.750.000,00	3.409.723,97	11.091.588,84	24 luni	Aplicant: Primăria or. Cimișlia	În proces de realizare: - 0,42 % din 1000m2 de zonă de recreere scară

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		finanțare (m2) – 0/1000 (1000).	conform proiectelor din domeniile eligibile de finanțare – 0/1.							mare din orașele
1.1.6	Construcția și amenajarea pieței agroalimentare regionale din municipiul Cahul. Etapa II	Structuri de sprijinire a afacerilor nou-create (nr.) – 0/0 (1); Platforme investiționale pregătite (nr.) – 0/0 (1); Centre de business regionale – clădiri de birouri pentru atragerea de investitori (nr.) – 0/0 (1); Acces asigurat la apeduct și servicii de	Rata de acoperire cu locuri de muncă (cu excepția celor cu finanțare din buget) în orașele-poli de creștere (%) – 8700/8760; Salariul mediu în orașele-poli de creștere (lei) – 8750/8790; Capacitatea fiscală a orașelor-poli de creștere regională (lei) – 4909/5050.	35.548.740,00	15.000.000,00	20.548.740,00	1,00	12 luni	<i>Aplicant:</i> Agenția de Dezvoltare Regională Sud <i>Parteneri:</i> Primăria mun. Cahul	Neinițiat procesul de semnare a contractului de finanțare a fost tergiversat din cauza lipsei unui mecanism clar de cofinanțare

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sanitație (m) – 0/0 (2513); Acces asigurat la gazoduct (m) – 0/0 (221); Acces asigurat la rețeaua de energie electrică (m) – 0/0 (545).								
1.1.7	Oferirea suportului necesar municipiului Cahul în vederea implementării Programului Național de Dezvoltare a orașelor-poli de creștere	Nr. de consultări oferite Nr. de acțiuni comune desfășurate Nr. de proiecte finanțate	-	-	-	-	-	2026-2027	Agenția de Dezvoltare Regională Sud Primăria mun. Cahul	În proces de realizare: - 3 consultări oferite; - 1 Plan operațional local al mun. Cahul actualizat și aprobat cu suportul ADR Sud (decizia nr.2/26(22/26) din 25.03.2026);

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.8	Oferirea suportului necesar APL-urilor în vederea elaborării/ actualizării Programelor de Revitalizare Urbană a orașelor din RD Sud	Nr. de consultări oferite Nr. de PRU avizate	-	-	-	-	-	2026-2028	Agencia de Dezvoltare Regională Sud APL urbane	În proces de realizare: - 14 consultări către 6 APL urbane din RDS cu privire la elaborarea/actualizarea/evaluarea PRU, inclusiv 1 ședință de lucru organizată cu primăria or. Căușeni în procesul de elaborare a PRU.
Direcția prioritară (obiectivul specific) 1.2 Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RD Sud										
Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL										
1.2.1	Finisarea construcției edificiului Teatrului	Atracții cultural turistice	Obiective cultural – turistice renovate de	16.215.100,00	14.593.580,00	1.621.520,00	3.046.337,55	12 luni	<i>Aplicant:</i> ADR Sud <i>Parteneri:</i>	În proces de realizare: - 4 % din 1 atracție

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Republican Muzical-Dramatic „B. P. Hașdeu” din mun. Cahul	renovate (nr.) – 0/1 (1); Săli de spectacole cu o capacitate de 250 de locuri finalizate (nr.) – 0/1 (1).	importanță regională și națională (nr.) – 0/1.						Ministerul Culturii al RM; Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B. P. Hașdeu” din mun. Cahul Primăria mun. Cahul	cultural – turistică renovată Lucrări sistate din lipsa soluției din partea autorului de proiect privind unele volume de lucrări suplimentare care nu au putu fi constatate la etapa procedurii achiziții
1.2.2	Cantemir Adventure Park – CAP	Atracții turistice renovate (nr.) – 0/1 (1); Atracții turistice amenajate (nr.) – 0/0 (1); Suprafața teritoriului	Obiective turistice amenajate (nr.) – 0/1; Obiective turistice incluse în circuite turistice în urma implementării	29.288.002,31	25.000.000,00	4.288.002,31	3.046.337,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Cantemir <i>Parteneri:</i> CR Cantemir	În proces de realizare: Semnarea contractului de finanțare nr. 16/CT-31-077-DR; 2 ședințe de lucru;

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		amenajat (ha) – 0/0 (13); Suprafața de drum construit/reabilitat (km) – 0/0 (2,5); Locuri de cazare create (nr.) – 0/0 (30)	proiectelor de dezvoltare regională (nr.) – 0/1; Trasee tematice comune conectate la rețeaua regională (nr.) – 0/1							1 contract de antrepriză semnat; 1 contract de prestarea SST semnat
1.2.3	Conectăm Istoria și Natura prin turism durabil în Raioanele Cimișlia, Căușeni și Ialoveni	Atracții turistice renovate (nr.) – 0/0 (1); Atracții turistice amenajate (nr.) – 0/0 (5); Suprafața de drum construit/reabilitat (km) – 0/0 (4,15); Suprafața teritoriului	Obiective turistice amenajate (nr.) – 0/6; Obiective turistice incluse în circuite turistice în urma implementării proiectelor de dezvoltare regională (nr.) – 0/26;	20.456.436,56	18.151.792,90	2.304.643,66	1,00	18 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Selemet, r-nul Cimișlia <i>Parteneri:</i> Primăria s. Satul Nou, r-nul Cimișlia; Primăria Ciuflești, r-nul Căușeni;	Neinițiat procesul de semnare a contractului de finanțare este tergiversat din cauza lipsei unui mecanism clar de cofinanțare

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		amenajat (ha) – 0/0 (0,8); Locuri de cazare create (nr.) – 0/0 (34).	Trasee tematice comune conectate la rețeaua regională (nr.) – 0/1.						Primăria Cărbuna, r-nul Ialoveni; Primăria s. Sagaidac, r-nul Cimișlia; Primăria com. Codreni, r-nul Cimișlia	
1.2.4	Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca	Suprafața teritoriului amenajat (ha) – 0/0,37 (0,37); Atracții turistice renovate (nr.) – 0/5 (5); Atracții turistice amenajate (nr.) – 0/4 (4).	Obiective turistice incluse în circuite turistice în urma implementării proiectelor de dezvoltare regională (nr.) – 0/4; Trasee tematice comune conectate la rețeaua regională (nr.) – 0/1;	29.200.000,00	25.000.000,00	4.200.000,00	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> CR Cimișlia <i>Parteneri:</i> CR Leova; Primăria or. Cimișlia; Primăria com. Cazangic, r-nul Leova; Primăria com. Hănăsenii Noi, r-nul	În proces de realizare: Procedurile de achiziție au fost lansate, iar la moment se află în etapa de evaluare și finalizare a atribuirii contractelor, cu termenul de valabilitate a ofertei până la 12.08.2026.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Obiective turistice amenajate (nr.) – 0/9.						Leova; Primăria s. Sadacليا, r-nul Basarabeasca	
1.2.5	Dezvoltarea Infrastructurii Turistice în Zona Ramsar Nistrul de Jos	Atracții turistice renovate (nr.) – 0/0 (2); Atracții turistice amenajate (nr.) – 0/1 (1); Suprafața teritoriului amenajat (ha) – 0/0 (1,7); Suprafața de drum construit/renovată/reabilitat (km) – 0/0 (9,032); Locuri de cazare create (nr.) – 0/0 (16).	Obiective turistice amenajate (nr.) – 0/3; Obiective turistice incluse în circuite turistice în urma implementării proiectelor de dezvoltare regională (nr.) – 0/13; Trasee tematice comune conectate la rețeaua regională (nr.)) – 0/1.	25.848.997,54	23.264.097,54	2.584.900,00	1.000,00	24 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă <i>Parteneri:</i> Primăria com. Talmaza; Primăria s. Cioburciu; Primăria com. Răscăieți; Primăria com. Olănești;	În proces de realizare: pregătirea actelor aferente privind contractarea lucrărilor de construcție

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Primăria com. Crocmaz; Primăria s. Tudora; Primăria s. Palanca; Primăria s. Căplani; Primăria com. Purcari	
1.2.6	Văleni - Hub turistic regional	Atracții turistice renovate (nr.) – 0/0 (3); Atracții turistice amenajate (nr.) – 0/1 (3); Suprafața teritoriului amenajat (ha) – 0/0 (3); Suprafața de drum construit/renova	Obiective turistice amenajate (nr.) – 0/3; Obiective turistice incluse în circuite turistice în urma implementării proiectelor de dezvoltare regională (nr.) – 0/3;	25.000.000,00	22.500.000,00	2.500.000,00	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Văleni, r-nul Cahul <i>Parteneri:</i> CR Cahul; AO „Uniunea Meșterilor Populari din Moldova”; Asociația Națională	Neinițiat: pregatirea documentatiei pentru publicarea anunțului de achiziții.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		t/reabilitat (km) – 0/ (2,2); Locuri de cazare create (nr.) – 0/0 (40).	Trasee tematice comune conectate la rețeaua regională (nr.) – 0/2.						pentru Turism Receptor și Intern din Moldova	
1.2.7	Promovarea potențialului economic și investițional al RD Sud	Nr. de evenimente de promovare a potențialului RD Sud organizate	Nr. participanți la evenimente	132.000,00	132.000,00	-	132.000,00	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare - 1 concept de eveniment în curs de dezvoltare în cadrul Zilele RDS. Activitatea va fi realizată în dependență de mijloacele financiare disponibile.
Direcția prioritară (obiectivul specific) 1.3 Promovarea specializării inteligente în RD Sud										
Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL										

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor centrale de specializare inteligentă	Nr. de evenimente organizate/ facilitate Nr. de parteneriate facilitate Nr. de concepte aplicate	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: - 1 bază de date cu stakeholderi regionali remisă către Centrul Inotek din Cahul în scopul facilitării evenimentului „Cahul Business Summit, Ediția V”; - 1 concept de proiect elaborat și aplicat în contextul apelului lansat de Swiss Cooperation in Moldova.
Direcția prioritară (obiectivul specific) 1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră										
Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL										

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.1	Participare în cadrul Grupului Național de Lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de UE	Nr. de ședințe Nr. de documente examinate Nr. de propuneri	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: - 1 propunere remisă MIDR aferentă proiectului dispoziției pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 42-d din 28 februarie 2024 cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Uniunea Europeană
1.4.2	Participare în cadrul Apelurilor de propuneri de proiecte aferente Programelor de cooperare transfrontalieră transnațională și interregională finanțate de UE	Nr. de proiecte aplicate 1 proiect finanțat	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	Neinițiată: În perioada de referință nu au fost lansate apeluri de proiecte aferente programelor de cooperare teritorială.
1.4.3	Stabilirea parteneriatelor cu entități similare pentru eficientizarea atragerii de proiecte aferente	Nr. de parteneriate	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: - 1 Acord de colaborare încheiat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	programelor de cooperare									județului Brașov, România pe 03.06.2026.
Obiectiv general 2. Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii										
Direcția prioritară (obiectivul specific) 2.1 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud										
Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL										
2.1.1	Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova	Rețele de apeduct magistral construite (km)– 16,5/16,5 (16,5); Rețele de apeduct interioare construite (km) 46,62/ 46,62 (46,62); Rezervoare de apă potabilă construite (V=150m3) (nr.) – 2/2 (2); Rezervoare de apă potabilă	Localități cu acces la sistemul de AAS construit (nr.) – 2/6; Locuitori cu acces la sistemul de AAS construit (nr.) – 2464/8215.	46.383.370,00	41.754.980,66	4.628.389,34	1.509.292,84	24 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria com. Tigheci, r-nul Leova <i>Parteneri:</i> Primăria com. Baiuș; Primăria com. Borogani; CR Leova; Primăria or. Iargara	În proces de realizare: 8 ședințe de lucru organizate: - 2 notificări de finalizare lucrărilor; - 1 proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat fără expunerea concluziei INST – com. Baiuș.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		construite (V=50m3) (nr.) – 2/2 (2); Turn de apă construit (V=25 m3) (nr.) – 1/1 (2); Stații de pompare a apei construite (nr.) – 2/2 (2).								
2.1.2	Construcția apeductelor interioare în satul Tomai și satul Sărata Răzeși, raionul Leova	Rețele de apeduct construite (km) - 0/44,8 (44,8); Rezervoare de apă potabilă construite (V=150m3) (nr.) – 0/2 (2); Rezervoare de apă potabilă construite	Populația conectată la rețeaua de alimentare cu apă (nr.) – 0/4112 Localități ce au acces la sistemul de alimentare cu apă construite (nr.) – 0/2.	38.374.910,00	31.554.106,00	6.820.804,00	27.916.037,59	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Tomai, r-nul Leova <i>Parteneri:</i> Primăria s. Sărata Răzeși CR Leova	În proces de realizare: AAC s. Tomai: - apeduct de distribuție - 11.274 m (din - 32.683 m); - bransamente consumatori - 86 unit. (din - 920);

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(V=50m3) (nr.) – 0/2 (2); Stații de dezinfectare a apei (nr.) - 0/2								- rezervoare 2 x 150 m3 - 20 % (valoric); AAC s. Sărata Răzeși: rezervoare 2 x 50 m3 - 20 % (valoric); AEE s. Sărata Răzeși: lucrări de construcție AEE - 93 %
2.1.3	Construcția Apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni,	Rețele de apeduct magistral construite (km) – 54,6/54,6 (54,6); Rezervoare de apă potabilă construite (V=25m3) (nr.) - 1/1 (1);	Localități cu acces la sistemul de AAS construit (nr.) – 0/14; Locuitori cu acces la sistemul de AAS construit (nr.) – 0/10341.	58.494.800,00	52.413.539,99	6.081.260,01	1.432.094,96	24 luni	<i>Aplicant:</i> ADR Sud <i>Parteneri:</i> CR Leova Primăria com. Cazangic; Primăria com. Beștemac;	În proces de realizare: -2 vizite de monitorizare; - 2 ședințe de lucru organizate; - 100 % proces de testare, punere în funcțiune; -1 scrisoare de informare

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadâr, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova	Rezervoare de apă potabilă construite (V=50m3) (nr.) – 2/2 (2); Stații de pompare a apei construite (nr.) – 4/4 (4); Stații de dezinfectare a apei construite (nr.) – 13/13 (13) unități.							Primăria com. Vozniseni; Primăria com. Sărăteni; Primăria com. Cneazevca; Primăria s. Ceadâr; Primăria s. Colibabovca; Primăria s. Orac	privind finalizarea lucrărilor
2.1.4	Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari	Studii de fezabilitate elaborate (nr.) – 1/1 (1); Pachete de documentație tehnică elaborate (nr.) – 0/0 (1);	Localități din r-nul Ștefan – Vodă și r-nul Căușeni cu acces la servicii de alimentare cu apă potabilă de calitate asigurat (nr.) – 0/4; Cetățeni cu acces la servicii	5.555.555,55	5.000.000,00	555.555,55	1,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> ADR Sud <i>Parteneri:</i> Primăria s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă; Primăria or. Ștefan Vodă;	Neinițiat Cerere de finanțare inclusă în Growth Plan Discuții cu reprezentanții Băncii Europene pentru

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			de alimentare cu apă potabilă de calitate asigurat (nr.) – 0/34670;						Primăria or. Căușeni; Primăria or. Căinari; CR Ștefan Vodă; CR Căușeni	Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind finanțarea acestuia
2.1.5	Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia	Rețele de canalizare construite/reabilitate (km) – 52,44/52,44 (52,44) Stații de pompare a apelor reziduale funcționale (nr.) – 4/5 (5).	Locuitori deserviți (nr.) – 3436/8436; Întreprinderi deservite (nr.) – 103/277.	36.759.327,26	32.634.451,11	4.124.876,15	4.274.000,52	24 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Cimișlia <i>Parteneri:</i> ÎM „Servicii Publice Cimișlia”; CR Cimișlia	În proces de realizare: - 18.05.2026 reluarea lucrărilor; - SPAU „Cogâlnic”- 60 % realizat.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.6	Finalizarea stației de pompare a apelor reziduale pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare în regiunea de Nord-Vest a orașului Cimișlia	Stații de pompare a apelor uzate cu o capacitate de 5-25 m3/oră finalizate (nr.) - 0/1 (1); Drum de acces până la SPAU – 0/1 (1);	Populație cu acces la sistemul de canalizare construit (nr.) – 0/1450	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4.663.940,73	18 luni	<i>Aplicant:</i> ADR Sud	În proces de realizare: - 1 Contract lucrări semnat nr.02/L/26; - 1 contract SST semnat; 4 ședințe de lucru; - 4 vizite de monitorizare; Lucrări de construcție sistate.
2.1.7	Finalizarea construcției sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea Perjei, raionul Cimișlia	Stații de pompare a apelor uzate (nr.) – 0/3 (3); Drumuri de acces la stațiile de pompare a apelor uzate 0/3 (3); Rețea de canalizare nou	Localități cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) - 0/1; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/759.	11.772.450,00	11.772.450,00	0,00	3.046.337,00	19 luni	<i>Aplicant:</i> ADR Sud	În proces de realizare: 1 Dări de seamă privind atribuirea contractelor de achiziții publice; 1 Contract de achiziții publice privind achiziționarea

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		construită (km) – 9/9,5 (9,5).								lucrărilor de construcție 1 Contract de achiziții publice privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică
2.1.8	Construcția sistemului de canalizare în orașul Iargara, raionul Leova (Etapa I)	km rețele de apeduct construite/reabilitate – 0/1,62 (23,2); Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (2); Stații de epurare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (1).	Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/1720; Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/1.	56.620.000,00	50.958.000,00	5.662.000,00	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Iargara, r-nul Leova <i>Parteneri:</i> -	In proces de realizare procesul de semnare a contractului de finanțare a fost tergiversat din cauza lipsei unui mecanism clar de cofinanțare

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.9	Construcția magistralei de apeduct pentru satele raionului Cantemir (Cantemir, Lărguța, Cîrpești, Țiganca, Stoianovca) - etapa 1	Rețele de apeduct construite/ reabilite (km) – 0/1,45 (29,0); Stații de pompare a apei potabile construite/ reabilite (nr.) – 0/0 (2); Rezervoare de apă potabilă construite/ reabilite (nr.) – 0/0 (2); Castele de apă construite/ reabilite (nr.) – 0/0 (4).	Localități ce au acces la sistemul de AAP construit/ reabilitat (nr.) – 0/7; Populație cu acces la sistemul de AAP construit/ reabilitat (nr.) – 0/10181.	52.484.520,00	47.236.068,00	5.248.452,00	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> CR Cantemir <i>Parteneri:</i> Primăria s. Cîrpești; Primăria or. Cantemir; Primăria s. Lărguța; Primăria s. Porumbestii; Primăria com. Pleșenii; Primăria s. Tartaul; Primăria com. Lingura; ÎM „Apă Canal Cantemir”	În proces de realizare: Notificare de la aplicant privind indisponibilitatea transferării contribuției din luna martie și luna mai 2026
2.1.10	Reabilitarea sistemului de apeduct și	km rețele de apeduct construite/	Localități ce au acces la sistemul de AAP	47.804.310,30	43.000.000,00	4.804.310,30	3.046.337,00	29 luni	<i>Aplicant:</i>	În proces de realizare:

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	construcția sistemului de canalizare în sectoarele „Malina”, „Taiwani/Centrul”, „Cogîlnic”, s. Bogdanovca Veche și s. Bogdanovca Nouă din orașul Cimișlia	reabilitate – 0/2,16 (43,2); km rețele de canalizare construite/ reabilitate – 0/0,8 (15,7); Stații de pompare a apei potabile construite/ reabilitate (nr.) – 0/0 (1); Castele de apă construite/ reabilitate (nr.) – 0/0 (2); Stații de pompare a apelor uzate construite/ reabilitate (nr.) – 0/0 (1).	construit/ reabilitat (nr.) – 0/3; Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/ reabilitat (nr.) – 0/1; Populație cu acces la sistemul de AAP construit/ reabilitat (nr.) – 0/3237; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/ reabilitat (nr.) – 0/1110.						Primăria or. Cimișlia <i>Parteneri:</i> -	- pregătirea cererii de finanțare pentru achiziție

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1 1	Sisteme de canalizare în localitățile Cîrnățeni, Chircăiești și Plop Știubei din raionul Căușeni	km rețele de canalizare construite/reabilitate – 0/1,72 (34,4); Stații de epurare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (4); Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (4).	Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/3; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/7674.	74.377.639,0 0	60.000.000,00	14.377.639,0 0	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Cîrnățeni, r-nul Căușeni <i>Parteneri:</i> Primăria s. Chircăiești; Primăria s. Plop Știubei; ÎM Apă-Canal Căușeni	În proces de realizare - Pregătirea procedurii de achiziției
2.1.1 2	Extinderea sistemului de apă și sanitație în orașul Leova	km rețele de apeduct construite/reabilitate – 0/0,2 (3,86); km rețele de canalizare construite/	Localități ce au acces la sistemul de AAP construit/reabilitat (nr.) – 0/1; Localități ce au acces la sistemul de canalizare	33.691.130,0 0	30.322.017,00	3.369.113,00	1.000,00	28 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Leova <i>Parteneri:</i> SA „Apă-Canal Leova”	În proces de realizare: Se afla în procedura de achiziție. A fost plasat anunțul în martie 2026 și

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		reabilitate – 0/0,2 (4,82); Stații de pompare a apei potabile construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (1); Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (3).	construit/reabilitat (nr.) – 0/1; Populație cu acces la sistemul de AAP construit/reabilitat (nr.) – 0/282; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/700.							termenul 15 august 2026
2.1.1 3	Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Baimaclia și satul Taraclia r-nul Căușeni	Stații de epurare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (1); km rețele de canalizare construite/	Localități ce au acces la sistemul de AAP construit/reabilitat (nr.) – 0/2; Localități ce au acces la sistemul de canalizare	41.956.690,00	37.761.021,00	4.195.669,00	3.046.337,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Taraclia, r-nul Căușeni <i>Parteneri:</i> Primăria com. Baimaclia	În proces de realizare: Proces de evaluare achizițiilor publice. Oferte valabilă până la data de 12.10.2026

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		reabilitate – 0/0,6 (11,8); Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (6).	construit/reabilitat (nr.) – 0/2; Populație cu acces la sistemul de AAP construit/reabilitat (nr.) – 0/6246; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/6246.							
2.1.1 4	Construcția stației de epurare și a sistemelor de canalizare regionale pentru locuitorii din satele Vișniovca, Capaclia și Șamalia,	Stații de epurare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/1; Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (3);	Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/2; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/3665.	49.954.294,00	44.953.455,00	5.000.839,00	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Vișniovca, r-nul Cantemir <i>Parteneri:</i> Primăria s. Capaclia	Neinițiat: Se află în așteptarea contribuției din partea APL

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	raionul Cantemir	km rețele de canalizare construite/ reabilitate – 0/0,8 (16,0).								
2.1.1 5	Servicii de canalizare calitative pentru populația comunei Manta, r. Cahul	km rețele de canalizare construite/ reabilitate – 0/0,4 (8,921); Stații de pompare a apelor uzate construite/ reabilitate (nr.) – 0/0 (1).	Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/3; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/7674.	54.157.600,00	48.741.900,00	5.415.760,00	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Cîrnățeni, r-nul Căușeni <i>Parteneri:</i> Primăria s. Chircăiești; Primăria s. Plop Știubei; ÎM Apă-Canal Căușeni	În proces de realizare 1 decizie de atribuire a contractului privind SST
2.1.1 6	Construcția sistemului de canalizare în satul Crihana Veche, Cahul, și conectarea la operatorul	km rețele de canalizare construite/ reabilitate – 0/1,75 (35,0); Stații de pompare a	Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/ reabilitat (nr.) – 0/1;	24.131.674,98	21.718.507,48	2.413.167,50	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Crihana Veche, r-nul Cahul <i>Parteneri:</i>	În proces de realizare: Proces de evaluare achizițiilor publice. Oferta valabilă până

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	regional SA Apă Canal Cahul (parte a proiectului co-finanțat de KfW)	apelor uzate construite/ reabilite (nr.) – 0/0 (3); Stații de captare a apei construite/ reabilite (nr.) – 0/1.	Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/ reabilitat (nr.) – 0/4550.						CR Cahul	la data de 12.10.2026
2.1.1 7	Modernizare a stației regionale de epurare a apelor uzate prin mărirea capacității	Stații de epurare a apelor uzate construite/ reabilite (nr.) – 1/10% (1); Stații de pompare a apelor uzate construite/ reabilite (nr.) – 0/10 % (1).	Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 1/26; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 3650/62072.	35.097.636,00	31.587.872,40	3.509.763,60	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Ștefan Vodă <i>Parteneri:</i> Primăria s. Slobozia; Primăria s. Ștefănești; Întovărașirea Pomicolă ”Căpșuna”; Societatea Ecologică BIOTICA.	Neinițiat: Se află în așteptarea contribuției din partea APL

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1 8	Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni, etapa finală	km rețele de canalizare construite/reabilitate – 0/1,9 (38); Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (4).	Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/4000; Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/1.	71.935.764,0 0	60.000.000,00	11.935.764,0 0	3.046.337,0 0	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria or. Căușeni <i>Parteneri:</i> -	În proces de realizare: Procedura de achiziții desfășurată; 1 Decizie GLAP privind atribuirea contractului de SST.
2.1.1 9	Regionalizarea serviciului de canalizare în satul Opaci și comuna Baccealia, prin conectarea la rețeaua și stația de pompare a apelor uzate	km rețele de canalizare construite/reabilitate – 0/1,55 (31); Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate (nr.) – 0/0 (3).	Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/6899; Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (nr.) – 0/3.	65.310.566,0 0	58.779.509,40	6.531.056,60	1.000,00	18 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria com. Zaim, r-nul Căușeni <i>Parteneri:</i> Primăria s. Opaci; Primăria com. Baccealia; CR Căușeni	În proces de realizare: În procedura de achiziții, evaluarea ofertelor depuse. Oferta desemnată valabilă până la data de 03.10.2026

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	din satul Zaim									
2.1.20	Construcția rețelei de canalizare în satul Ursoaia, raionul Căușeni	km rețele de canalizare construite/ reabilite - 0/0,94 (18,825); Stații de pompare a apelor uzate construite/ reabilite (nr.) – 0/0 (1);	Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/ reabilitat (nr.) – 0/1; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/ reabilitat (nr.) – 0/2378.	48.400.000,00	43.560.000,00	4.840.000,00	1.000,00	24 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria s. Ursoaia, r-nul Căușeni	În proces de realizare: În procedura de achiziții, evaluarea ofertelor depuse. Oferta evaluată valabilă până la data de 03.09.2026
2.1.21	Construcția apeductelor magistrale spre satul Frumușica și Cîzlar și construcția rețelelor de apeduct interioare și canalizare în	km rețele de apeduct construite/ reabilite – 0/1,15 (23,15); km rețele de canalizare construite/ reabilite – 0/1,01 (20,2);	Localități ce au acces la sistemul de AAP construit/ reabilitat (nr.) – 0/3; Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/	62.928.230,00	54.118.270,00	8.809.960,00	1.000,00	36 luni	<i>Aplicant:</i> Primăria com. Sărăteni, r-nul Leova <i>Parteneri:</i> Primăria com. Sărăteni;	În proces de realizare Pregatirea procedurii de achiziției

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	localitățile Sărăteni, Covurlui și Cîzlar din raionul Leova	Stații de dezinfectare a apei potabile construite/ reabilitate (nr.) – 0/0 (3); Castele de apă construite/ reabilitate (nr.) – 0/0 (5); Stații de epurare a apelor uzate construite/ reabilitate (nr.) – 0/0 (2); Stații de pompare a apelor uzate construite/ reabilitate (nr.) – 0/0 (4).	reabilitat (nr.) – 0/2; Populație cu acces la sistemul de AAP construit/ reabilitat (nr.) – 0/1205; Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/ reabilitat (nr.) – 0/2390.						Primăria com. Cneazevca; Primăria com. Cazangic; CR Leova; Primăria s. Covurlui	
Proiecte cu acoperire financiară din surse externe										
2.1.2 3	Extinderea și îmbunătățire	km de conductă magistrală	19500 de beneficiari;	186.277.042,40	186.277.042,40	-	-	24 luni	UIP ONDRL,	În proces de realizare:

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești	regională construită - 0/(97,24); km de rețele interne de distribuție construite (Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca, Alexanderfeld, Vulcănești, Alexandru Ioan Cuza) – 0/(64,8)	8 localități conectate la sistemul regional de apeduct	Valoare estimativă	Valoare estimativă Credit Banca Mondială, contribuția Guvernului Republicii Moldova				coordonare, control procedural ADR Sud, angajator.	-1 Ordin de începere a lucrărilor elaborat și prezentat; - 1958 m.l. Pipe HDPE PE100 RC SDR17 PN10 DN250 - 1958 m.l. Pipe HDPE PE100 RC SDR17 PN10 DN180 - 2 ședințe desfășurate.
2.1.2 4	Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova	Chioșcuri instalate (nr.) – 0/(8)	8 localități beneficiare	45.176.473,6 Valoare estimativă	45.176.473,6 Valoare estimativă Guvernul Regatului Belgiei	-	-	12 luni	Aplicant: Primăria s. Slobozia Mare, rl. Cahul Primăria com. Zaim, rl. Căușeni	În proces de realizare: 8 contracte de finanțare semnate pe parcursul lunii aprilie 2026

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Primăria s. Tănătari, rl. Căușeni Primăria or. Cimișlia Primăria com. Baccealia, rl. Căușeni Primăria s. Taraclia, rl. Căușeni Primăria com. Chircăieștii Noi, rl. Căușeni Primăria com. Cîrnățenii Noi, rl. Căușeni	
	Direcția prioritară (obiectivul specific) 2.2 Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri									
	Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL									

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1	Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune	Hală de producere construită, conectată la toate utilitățile ingineresti: apeduct, canalizare, gaze naturale, energie electrică cu capacitate industrială (m2) – 1191/1191 (1191); Teren amenajat (pe lângă hala industrială multifuncțională) (m2)– 3470/3470 (3470); - apeduct de racord (ml) – 171,0/ 171,0 (171,0);	Rezidenți ai structurilor de suport al afacerilor (ICAM) (nr.) – 16/27; Obiectiv al infrastructurii de susținere a afacerilor conectat la utilități (nr.) – 0/1 (1).	15.561.000,00	14.000.000,00	1.561.000,00	1.013.291,10	16 luni	<i>Aplicant:</i> CR Cimișlia <i>Parteneri:</i> Consiliul orașenesc Cimișlia; CR Basarabeasca ; Consiliul sătesc Taraclia; Școala Profesională Cimișlia; Direcția pentru ocuparea forței de muncă Cimișlia	În proces de realizare: - hală multifuncțională de producere 1181,2 m2 construită: - 129 m linii de energie electrică.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- linie canalizare de racord (ml) – 133,4 /133,4 (133,4); - gazoduct de racord (ml) – 233 / 233 (233,0).								
	Direcția prioritară (obiectivul specific) 2.3 Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor									
	Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL									
2.3.2	Îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice	Nr. de clădiri	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	Neinițiat
	Obiectiv general 3. Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională									
	Direcția prioritară (obiectivul specific) 3.1 Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională									
	Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL									
3.1.1	Elaborarea și aprobarea	1 POR elaborat și aprobat	-	-	-	-	-	Tr. II 2026	ADR Sud	Realizat:

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	POR Sud 2026-2028									- POR Sud 2026-2028 elaborat și aprobat de către CRD Sud prin decizia nr.01/02 din 24.04.2026
3.1.2	Participarea la elaborarea/ajustarea cadrului normativ/metodologic și a documentelor de politici aferente implementării politicii de dezvoltare regională	Nr. de documente îmbunătățite	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: 11 documente examinate: - 1 proiect de HG cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Turism 2029” pentru anii 2026-2029; - 1 proiect de HG pentru modificarea HG nr.152/2022 cu privire la

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală; - 1 proiect al dispoziției pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 42-d din 28 februarie 2024 cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană; - 1 proiect al Programului național de dezvoltare a sectorului alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2026-2030; - 1 proiect de HG printru modificarea HG nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										regională în RM; - 2 proiecte ale Manualului operațional cadru al ADR; - 1 proiect al Studiului de fezabilitate a Secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a teritoriului Național; - 1 plan de consultări publice; - 1 proiect al Programului de interconectare sustenabilă România-Moldova.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- 57 de propuneri/ comentarii
3.1.3	Participarea activă în cadrul GL 22 în vederea realizării prevederilor și cerințelor de aderare a RM la UE	Nr. de participări la ședințe Nr. de documente examinate Nr. de propuneri/ comentarii	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: 6 documente examinate: - Instrucțiunea nr.1/2026 privind metodologia de elaborare a contribuției la Pachetul de extindere 2026; - Contribuția nr.1 la Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale; - Contribuția nr.2 la Capitolul 22:Politica regională și coordonarea

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										instrumentelor structurale; - Contribuția nr.4 la Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale; - Matrice recomandări; - Calendarul de lucru. - 3 comentarii oferite.
3.1.4	Consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor în baza	Nr. de instruiți desfășurate Nr. de participanți - reprezentanți ai APL	-	57.600,00	57.600,00	-	57.600,00	2026-2028	ADR Sud	Realizat - 3 instruiți organizate/facilitate; - 89 de persoane instruite.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Conceptului pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor									
3.1.5	Desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare a politicii și programelor de dezvoltare regională	Nr. de rapoarte de progres; Nr. de proiecte monitorizate; Nr. de proiecte evaluate	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: - 1 raport de evaluare POR Sud 2022-2025 elaborat și aprobat; - 1 raport anual de progres POR Sud 2022-2025, pentru anul 2025;

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- raport de progres privind implementarea PNDOPC RM pentru anii 2021-20227, pentru anul 2025; - 3 proiecte monitorizate in post-implementare.
	Direcția prioritară (obiectivul specific) 3.2 Suport în consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională									
	Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL									
3.2.1	Cartografiere a anuală a proiectelor implementate în RD Sud cu suportul partenerilor de dezvoltare	Nr. de proiecte cartografiate	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	Neinițiat Acțiunea data a fost planifică pentru a fi realizată pe parcursul semestrului II.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2	Facilitarea procesului de mobilizare de finanțări adiționale	Nr. de concepte de proiecte aplicate 1 proiect atras	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare : 2 concepte de proiecte aplicate: - 1 concept de proiect elaborat și aplicat în contextul apelului lansat de Swiss Cooperation in Moldova; - 1 aplicație depusă în cadrul apelului de proiecte: Fondul Canadian pentru Inițiative Locale (CFLI); - 3 formulare aferente Conceptului de proiect „Apeduct

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										magistral Ștefan Vodă Căușeni Căinari” completate și remise MIDR.
3.2.3	Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare pentru mobilizare de fonduri adiționale	1 parteneriat Nr. de activități comune desfășurate	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: - 1 Acord de colaborare încheiat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov, România pe 03.06.2026.
Direcția prioritară (obiectivul specific) 3.3 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională										
Proiecte/acțiuni cu acoperire financiară din FNDRL										
3.3.1	Consolidarea capacităților APL/CRD și alți actori regionali în	Nr. de instruiți organizate/ facilitate	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: - 1 instruire organizată în contextul

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	domenii relevante politicii de dezvoltare regională	Nr. de persoane instruite								lansării Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională - apel pe listă (ediția martie 2026); - 7 persoane instruite; - 1 instruire pentru consolidarea capacităților administratorilor de bloc și reprezentanților APL; - 40 persoane instruite.
3.3.2	Consolidarea capacităților profesionale ale specialiștilor ADR Sud	Nr. de angajați instruiți	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: - 14 angajați instruiți.

Nr.	Proiecte /acțiuni	Indicatori de monitorizare ⁴		Costul total al proiectului /acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL / alte fonduri naționale /fonduri externe, lei	Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2026, lei	Termen de realizare	Instituții responsabile	Grad de realizare: Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
		Indicatori de produs (valoarea de referință ¹ /țintă ² (ținta finală ³))	Indicatori de rezultat ⁴ (valoarea de referință ¹ /țintă ²)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.3	Transfer de bune practici (vizite de studiu)	Nr. de vizite de studiu desfășurate Nr. de beneficiari	-	-	-	-	-	2026-2028	ADR Sud	În proces de realizare: - 3 vizite de studiu desfășurate: - 4 beneficiari.

Prezentat:

Director ADR Sud

_____ Nicolae HRISTOV

ELABORAT:

Șef SME

_____ Olga DIACONU

Șef DMIP

_____ Andrei POPUȘOI

Șef SPCR

_____ Irina COROIAN

COORDONAT:

Șef direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală, MIDR:

_____ Veronica EȘANU
