



AGENȚIA

АГЕНТСТВО

DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЮГ

Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12
Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adrsud@gmail.com

nr. 93 din 11 februarie 2014

Raport final privind implementarea proiectului

„Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, creșterea competitivității în promovarea modului sănătos de viață, pregătirea sportivilor de performanță și prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și Sport în orașul Căușeni”.

I. Date generale:

Aplicant: Consiliul Raional Căușeni

Partener: Consiliul raional Cimișlia, Consiliul raional Ștefan Vodă,

Durata de implementare a proiectului: 36 luni

Bugetul proiectului aprobat: 43652,66 mii lei

Suma solicitată din FNDR: 32305,65 mii lei

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea și intensificarea cooperării regionale în domeniul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și Sport în or. Căușeni și punerea în valoare a obiectivelor turismului sportiv.

Beneficiari:

- 17 membri a loturilor naționale la 7 probe sportive judo(fete), SAMBO (fete) lupta liberă, lupta greco – romană, volei(fete), orientare sportivă, kickboxing;
- 21 campioni naționali și internaționali
- 17 antrenori, inclusiv și tineri.
- 3 echipe raionale pentru orientarea sportivă
- 100 locuitori vor beneficia de servicii de întremare a sănătății prin practicarea sportului curativ;
- 300 tineri, care sînt în căutarea posibilităților de afirmare și de dezvoltare a unei poziții civice active prin organizarea activităților de promovare a modului sănătos de viață.
- 50 mii locuitori ai orașului Căușeni și localitățile învecinate

II Finanțarea proiectului.

Proiectul „Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, creșterea competitivității în promovarea modului sănătos de viață, pregătirea sportivilor de performanță și prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și Sport în orașul Căușeni”. a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în urma apelului de propuneri de proiecte 2010. Prin HG Nr. 772 din 26 august 2010 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2010 - 2012. Prin decizia CNCDR Nr. 3/11 din 26 aprilie 2011 proiectul este aprobat spre finanțare din sursele FNDR. Ulterior, prin Hotărârea de Guvern Nr.933 din 18 decembrie 2012 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program 2013 – 2015.

Proiectul “Centrul pentru tineret și sport din or. Căușeni” a fost elaborat de către SRL „Mecontec” în anul 2009 la solicitarea Consiliului raional Căușeni.

La data de 04.11.2010 Consiliul raional Căușeni a desfășurat licitația publică Nr 1387/10 pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a centrului. La data de 18 decembrie 2010 între CR Căușeni și SRL Consit Pro a fost încheiat **contractul de antrepriză nr 84**. Valoarea contractului inițial 22994798 lei. Contractul a fost înregistrat la AAP la Nr. 1-12884/10 din 23.11.2010.

Conform raportului de verificare nr. 0941-12-09 costul orientativ de deviz la prețurile trim. I a anului 2010 constituie 28 302 600 lei (incl. TVA), din care 25 929 000 lei costul lucrărilor de construcție-montaj.

În procesul de execuție a lucrărilor a apărut necesitatea de revizuire a documentației de proiect din cauza că în șir de lucrări au fost omise din proiectul tehnic inițial. Ca urmare a reexaminării proiectului tehnic, au fost corectate soluțiile tehnice modificându-se totodată și costurile proiectului. Proiectul modificat a fost prezentat către SSVEPC spre verificate. La data de 15 octombrie 2012 a fost eliberat raportul de verificare nr. 0941-08-12 (09) costul orientativ de deviz a obiectului constituind 44935,22 mii lei, inclusiv 42789,1 mii lei, lucrări de construcție-montaj.

Valoarea contractelor:

După modificările operate în proiectul tehnic, a apărut necesitatea contractării lucrărilor suplimentare. Astfel, o parte din lucrări a fost contractată în cadrul contractului de bază (Nr 84 din 18 decembrie 2010) prin acorduri adiționale în limita a 30% admisibile conform legii. Lucrările rămase au fost contractate prin procedura de achiziții din unica sursă. La 23 noiembrie 2013 a fost încheiat contractul nr. 106 prin care sunt contractate lucrări în valoare de 12562,35 mii lei.

Valoarea lucrărilor contractate pe contractul nr. 84 (inclusiv 16 acorduri adiționale) constituie - 26252,8 mii lei, din care 20921,5 sunt achitați din sursele FNDR.

Valoarea lucrărilor contractate pe contractul 106 (inclusiv 9 acorduri adiționale) constituie – 16169,20 mii lei, din care 11186,79 mii lei achitați din sursele FNDR.

În total au fost efectuate cheltuieli în valoare de 32305,65 mii lei din FNDR, și 11347,01 mii lei din sursele Consiliului raional Căușeni. Costul total al proiectului constituie 43652,66 mii lei

III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

- 1. Lansarea proiectului.**
- 2. Activități de achiziții publice.**
- 3. Monitorizarea proiectului**
- 4. Executarea lucrărilor de construcție**
- 5. Dotarea centrului cu echipament**
- 6. Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepție finală**
- 7. Transmiterea obiectului la bilanțul beneficiarului**

IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr	Indicatori planificați conform cererii de finanțare	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
			Indicatori de produs
1	Suprafața construită a Centrului de tineret și sport (M2) (valoarea inițială-0)	4636 m2 de suprafață construită	Indicatorul dat a fost atins pe deplin prin construirea a Centrului de tineret și sport pe o suprafață de 4636 m2. Construcția centrului de tineret și sport contribuie perfect la atingerea obiectivului general al proiectului. Astfel se creează oportunități de găzduire a competițiilor regionale, naționale și internaționale și de promovare a sportului de performanță, a modului sănătos de viață și a turismului sportiv. Clădirea centrului este conectată la rețelele orășenești de prestare a serviciilor comunale, conform standardelor naționale
2	Săli sportive puse în funcțiune (număr săli) (valoarea inițială-0)	5 săli sportive funcționale + 1 sală de conferințe multifuncțională	Cele 5 săli sportive funcționale construite sunt utilizate conform destinației care asigură condiții funcționale pentru cantonamente a sportivilor de performanță, asigură condiții favorabile pentru practicarea sportului curativ. Nu în ultimul rând oferirea spațiilor specializate și bine utilitate în cadrul centrului contribuie la asigurarea federațiilor naționale de sport cu tinerii sportivi pentru sportul de performanță, condițiilor optime pentru desfășurarea competițiilor la nivel regional, internațional și dezvoltarea turismului sportiv. Sala de conferințe de asemenea are un caracter multifuncțional și este folosită ca locație pentru activitatea secțiilor se șah și dame
3	Persoane instruite total, inclusiv (nr. persoane) (valoarea inițială-0)	288 persoane au fost instruite	
	600 persoane instruite	Total: 288 din care - 172 bărbați - 116 femei	Au fost organizate cursuri de instruire pentru tineri care sunt motivați să organizeze activități de voluntariat. De asemenea, au fost instruiți 27 de primari privind strategii de organizarea modului sănătos de viață. Au fost instruiți 40 de persoane dintre conducătorii instituțiilor educaționale cu referire la dezvoltarea sportului pentru tineri. Totodată, au fost instruiți în domeniul perspectivei sportului de performanță la care au participat peste 96 de persoane dintre profesorii și antrenorii de educație fizică din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă.
	Total: 600 din care - 180 bărbați - 420 femei	Angajați ai serviciului – 27 din care - 15 bărbați - 12 femei	
	Angajați ai serviciului – 27 din care - 15 bărbați - 12 femei	Reprezentanți APL - 27, din care - 16 bărbați	
	Reprezentanți APL - 40, din care - 22 bărbați		

	- 18 femei	- 11 femei	
4	Utilaj, mobilier, echipament sportiv (mii lei) (valoarea inițială-0)	1143,8 mii lei valorificați	Conform cererii de finanțare și a bugetului proiectului au fost valorificate sursele financiare în sumă de 1143,8 mii lei pentru procurarea utilajului și echipamentului sportiv necesar pentru funcționarea centrului de tineret și sport. Au fost procurate porți pentru fotbal, stâlpi din metal pentru volei, tenis de câmp echipament pentru tenis de masă, baschet, scaune pentru gimnastică, panouri informative, тренажоре
5	Obiective turistico-sportive (nr. obiective) (valoarea inițială-0)	6 obiective turistico - sportive au fost identificate	Obiectivele turistice sportive identificate în cadrul proiectului au fost înscrise în traseul turistic "Inelul Spiritual Alexei Mateevici" și "Axa Spirituală a ținutului Basarabiei", valori spirituale recunoscute și apreciate de turiști. Prin identificarea obiectivelor turistice, tineretul va avea posibilitate să-și manifeste și să-și dezvolte capacitățile sportive, fără ca să părăsească casa părintească. Va fi promovată imaginea regiunii prin reclamarea obiectivelor turistice și sportive. Va fi posibilă deschiderea afacerilor legate de susținere a turismului și sportului în regiune.
6	Traseuri turistice sportive elaborate (nr. traseuri) (valoarea inițială-0)	1 traseu turistic sportiv elaborat	Prin identificarea obiectivelor turistice a fost elaborat traseul turistic sportiv prin care s-a pus baza realizării unui program de odihnă și fortificare a sănătății cetățenilor, totodată, atragerea turiștilor în regiune prin care va fi realizată dezvoltarea comunitară și regională în plan economic și social. Elaborarea traseului turistic sportiv a contribuit la includerea regiunii sud în circuitul turistic sportiv național și chiar internațional. Traseul turistic cuprinde atât obiective turistice cu specific sportiv cât și istoric cultural, înscris în inelul spiritual al sudului Basarabiei, teritoriu ce corespunde regiunii Sud.
7	Campanie de conștientizare și informare	Conferințe - 2 Buclete - 5000 ghid sportiv turistic - 200	Indicatorul dat a fost atins parțial. Aici este de specificat faptul că în luna mai 2011 a avut loc prima conferință de presă privind lansarea implementării proiectului, cu participarea a peste 250 de persoane. În anul 2013 în luna noiembrie a avut loc cea de a doua conferință de

			presă privind finalizarea construcției Centrului de Tineret și Sport din or. Căușeni, la care au participat peste 1000 de cetățeni. Elaborarea buchetelor informaționale a avut drept scop informarea populației despre activitatea centrului de tineret și sport. Au fost elaborate peste 1000 de bucate informaționale și expediate sau înmânate Federațiilor sportive de profil, cluburilor sportive din raionale vecine. Necesarul de bucate informaționale până la atingerea numărului necesar conform indicatorului au fost distribuit în urma implementării proiectului în cadrul diferitor evenimente organizate de centru sportiv. Consiliul raional Căușeni a elaborat designul și a asigurat editarea și distribuirea buchetelor informaționale. Cu referire la indicatorul elaborarea ghidului turistic sportiv, nu a fost încă elaborat, deoarece acesta este în curs de elaborare.
8	Persoane informate (valoarea inițială - 0)	50000 persoane au fost informate	În procesul implementării proiectului publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile de televiziune „Aici TV”, „Studio L”, Moldova1. Publika TV, TV7, 17 reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate 8 reportaje radio (Radio Moldova, Radio Chișinău, Publica FM, Radio Media), și publicate 30 articole în presa scrisă și electronică (Gazeta de Sud, Adevărul, Jurnal de Chișinău www.civic.md , www.comunicat.md , www.adrsud.md , point.md , stiri.md , news.click.md , sportbusiness.md ș.a.). De asemenea, evenimentul de lansare a proiectului la care au participat peste 250 persoane, a contribuit la asigurarea transparenței în cadrul proiectului. Se estimează că peste 50000 persoane au fost informate privind la activitățile proiectului.
Indicatori de rezultat			
9	Întreprinderi noi create (nr. întreprinderi) (valoarea inițială - 0)	1 întreprindere nouă a fost creată	Prin crearea Centrului de tineret și sport, se aduce un aport semnificativ la la sprijinirea activităților de reabilitare a sănătății populației, diversificarea acțiunilor de ocupare a tinerilor în timpul liber, antrenarea membrilor loturilor naționale și a campionilor olimpici și inițierea activităților de dezvoltare economică netraditională de turism sportiv.
10	Locuri noi de muncă create, inclusiv (nr. locuri) (valoarea inițială - 0)		

	28 de locuri noi de muncă vor fi create	21 de locuri noi de muncă au fost create	În baza concursului pentru suplinirea postului vacant, lansat de către Consiliul raional Căușeni, a fost angajat directorul Centrului de tineret și sport, care activează în baza regulamentului aprobat de către consiliul raional. Statul de personal al Centrului, aprobat de către Consiliul raional Căușeni, este de 20 unități. Totodată, au mai fost angajați încă 20 de persoane care conform statutului de personal asigură întreținerea și funcționarea centrului de tineret și sport.
I II	Beneficiari ai centrului, inclusiv	(nr. persoane) (valoarea inițială-0)	
	300 beneficiari	400 beneficiari	După implementarea proiectului au fost create 12 probe sportive în care sunt antrenați 300 copii. La solicitarea Federațiilor de Tenis au fost deschise secții de tenis de câmp și secții de tenis de masă care sunt frecventate 80 de copii. Au fost puse la dispoziții spații pentru Asociații Obștești, inclusiv Centru pentru relații interne, care realizează activități de instruire inclusiv studierea limbii engleze cu participarea a peste 40 de copii și tineri. De asemenea este oferit spațiu pentru desfășurarea antrenamentelor pentru colaboratorii comisariatului de poliție din raionul Căușeni, biroul vamal Bender și echipelor la jocuri de grup în care sunt antrenați peste 110 copii. Federațiile sportive au organizat 2 turnee regionale cu participarea a peste 100 de sportivi.

V. Finalizarea proiectului.

La data de 26 iulie 2013 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe obiectul dat. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic precum și remedierea observațiilor din anexele 1, 2, 3, din (*Proces verbal nr. 5 din 26 iulie 2013*). La data de 17 decembrie 2013 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 1 din 17 decembrie 2013*).

La data de 17 decembrie 2013 ADR Sud, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 și a acordului de parteneriat, a predat obiectul construit către Consiliul raional Căușeni (*Act de primire-predare a obiectului din 17 decembrie 2013*).

VI. Durabilitatea proiectului

În cadrul ședinței Consiliului raional Căușeni a fost aprobat planul de durabilitatea a proiectului cu nr.9/3 din data de 31 octombrie 2013. Planul de durabilitate prevede cele mai importante activități preconizate pentru funcționarea acestuia, precum și care instituție este responsabilă, executorul responsabil pentru desfășurarea activităților. Totodată sunt prevăzute costurile, sursa de finanțare și termenul de realizare a activităților preconizate pentru susținerea durabilității proiectului.

Centrul de tineret și sport din orașul Căușeni are statut de instituție publică de competență regională. Activitatea centrului este coordonată de către consiliul de administrare, în componența căruia fac parte reprezentanții din raioanele participante.

Consiliile raionale Ștefan Vodă și Cimișlia au confirmat disponibilitatea de a contribui la acoperirea cheltuielilor operaționale. Principala povară financiară va fi pe seama bugetului raionului Căușeni. Disponibilitatea de întreținere a centrului din sursele bugetare reală, dovadă fiind faptul, că în fiecare an din bugetul raionului pentru activitățile sportive se alocă circa 2 mln lei.

În Centrul de tineret și sport Căușeni își dezvoltă măiestria sportivă membrii lotului național la 9 probe sportive și colaborarea cu Comitetul Național Olimpic care facilitează și obținerea finanțărilor din fondurile de pregătire a campionilor olimpici.

În sala competițională a centrului se desfășoară campionate naționale și internaționale, care deveni oportunitate pentru obținerea surselor financiare.

Mai multe activități din cadrul centrului, inclusiv, aerobică, gimnastică curativă, ocupațiile în sala de trenaajoare sunt contra plată. Tarifele pentru serviciile nominalizate sunt aprobate de consiliul raional.

Pe termen lung activitatea centrului va favoriza dezvoltarea turismului sportiv, un nou gen de activitate. Traseul turistic sportiv va fi extins prin includerea de noi obiective și aderarea la traseele naționale și internaționale de acest gen.

/ Director ADR Sud




Maria CULEȘOV

1. Situația până la implementarea proiectului



2. Procesul de implementare

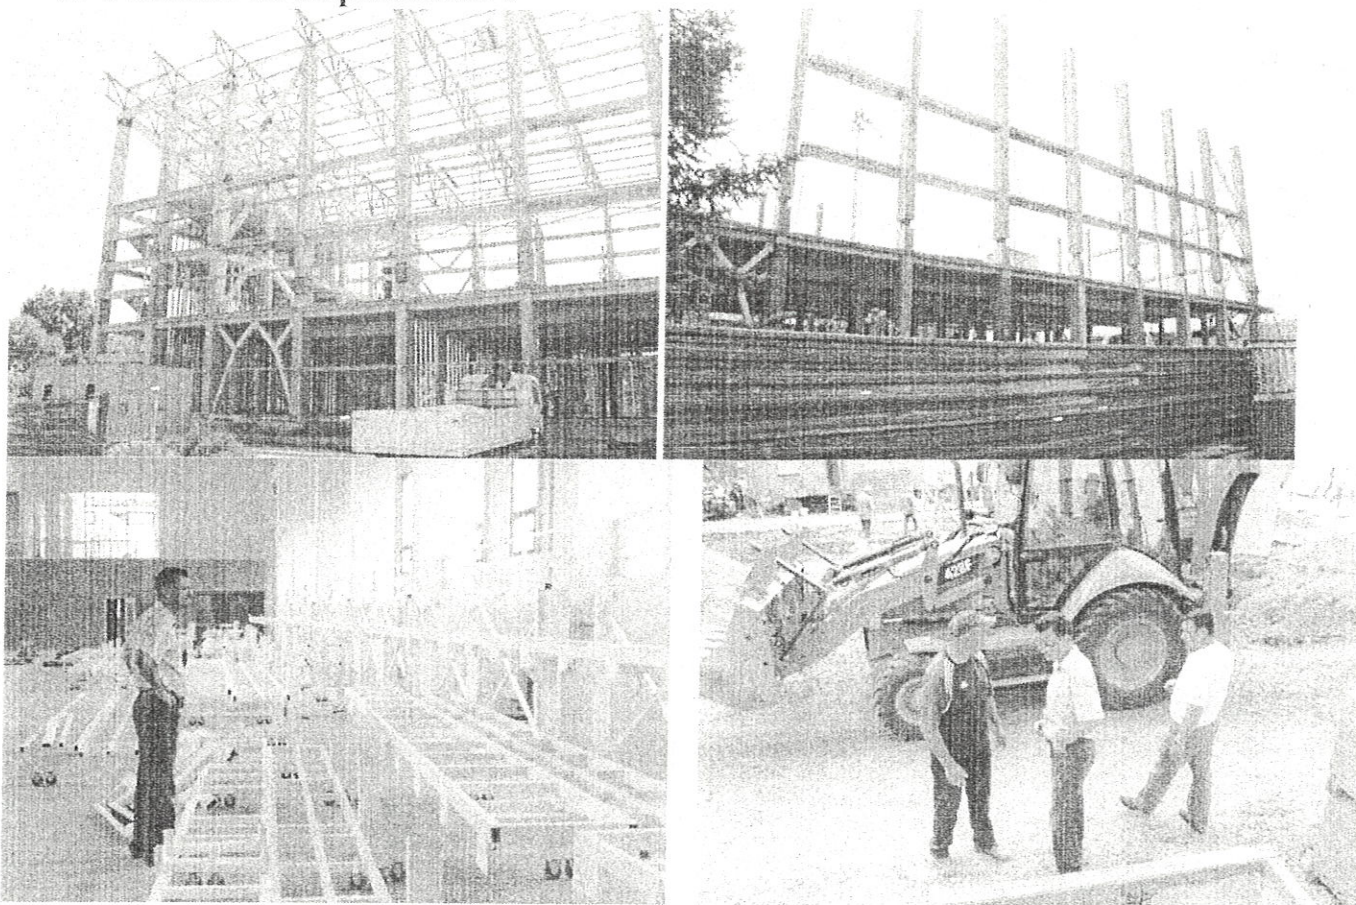

3. Situația după implementarea proiectului.

